


VIA: HONDA – MANIZALES (DEPARTAMENTO DE CALDAS)

TRANSVERSAL HONDA – MANIZALES FASE 2.

LONGITUD DEL CORREDOR 64 KM



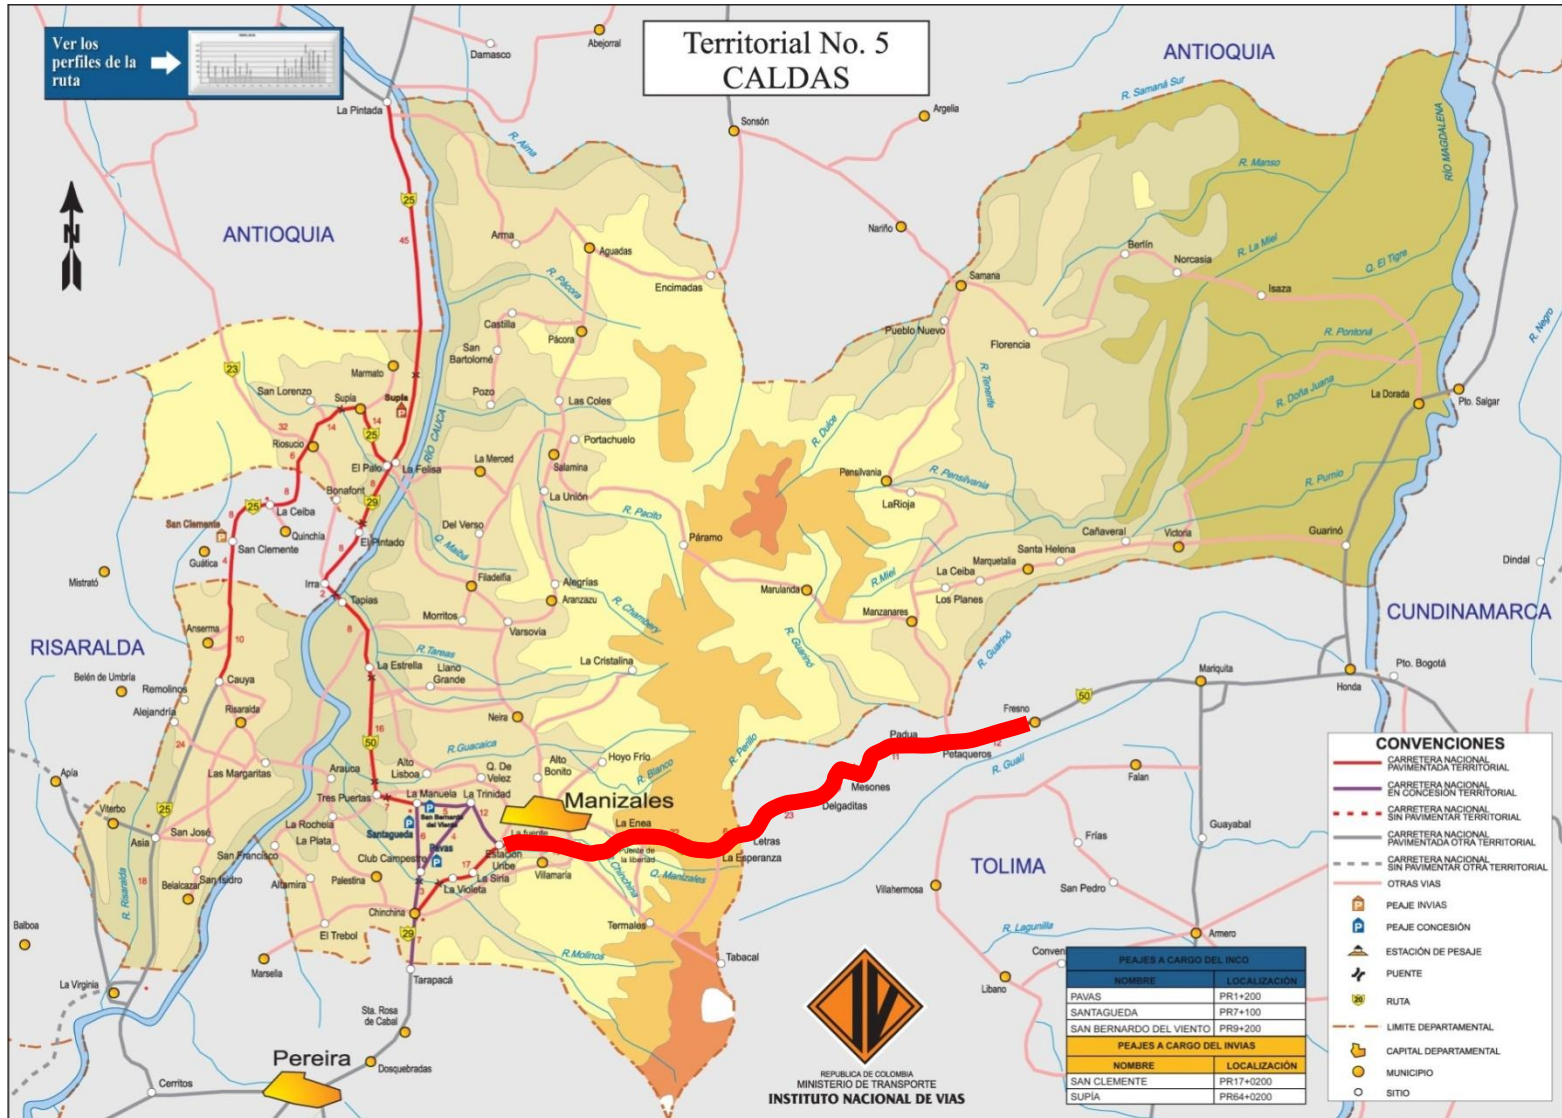

VIA: HONDA – MANIZALES (DEPARTAMENTO DE CALDAS) TRANSVERSAL HONDA – MANIZALES FASE 2



CONTRATO DE OBRA:	No. 570 de 2012
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD
COMPOSICIÓN:	LATINCO S.A.: 20% HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.:20% MINCIVILES S.A.: 20% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL:20% ESTYMA:20%
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	\$ 100.587.650.808
PLAZO EN MESES:	30 MESES
ORDEN DE INICIO:	27 de agosto 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de FEBRERO de 2015
EJECUCION A LA FECHA	\$ 1.750.000000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 622-2012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD
VALOR ADJUDICADO:	\$5.795.210.094
PLAZO EN MESES:	31 MESES

VALOR CONTRATO:	\$100.587.650.808	Metas totales del proyecto:		
		Km pavimentados	puentes	Km doble calzada
VIGENCIA 2012	1.500.000.000	0	0	0
VIGENCIA 2013	30.181.915.962	10	0	1
VIGENCIA 2014	68.905.734.846	11	2	4
VIGENCIA 2015				
TOTAL	100.587.650.808	21	2	5

ANTICIPAR VIGENCIA 2014

5.000.000.000

Km previstos a intervenir

1.7

AVANCE DEL CONTRATO	TOTAL
ITEM	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95
KM PAVIMENTADOS	0
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	19
KM DE EXPLANACION	0

ALCANCE DE INTERVENCIÓN



HONDA MANIZALES LONGITUD DEL CORREDOR 64 KM

