




VIA : CRUCERO - AGUAZUL (DEPARTAMENTO BOYACÁ - CASANARE) TRANSVERSAL DEL CUSIANA - FASE 2. LONGITUD CORREDOR 57 Km.



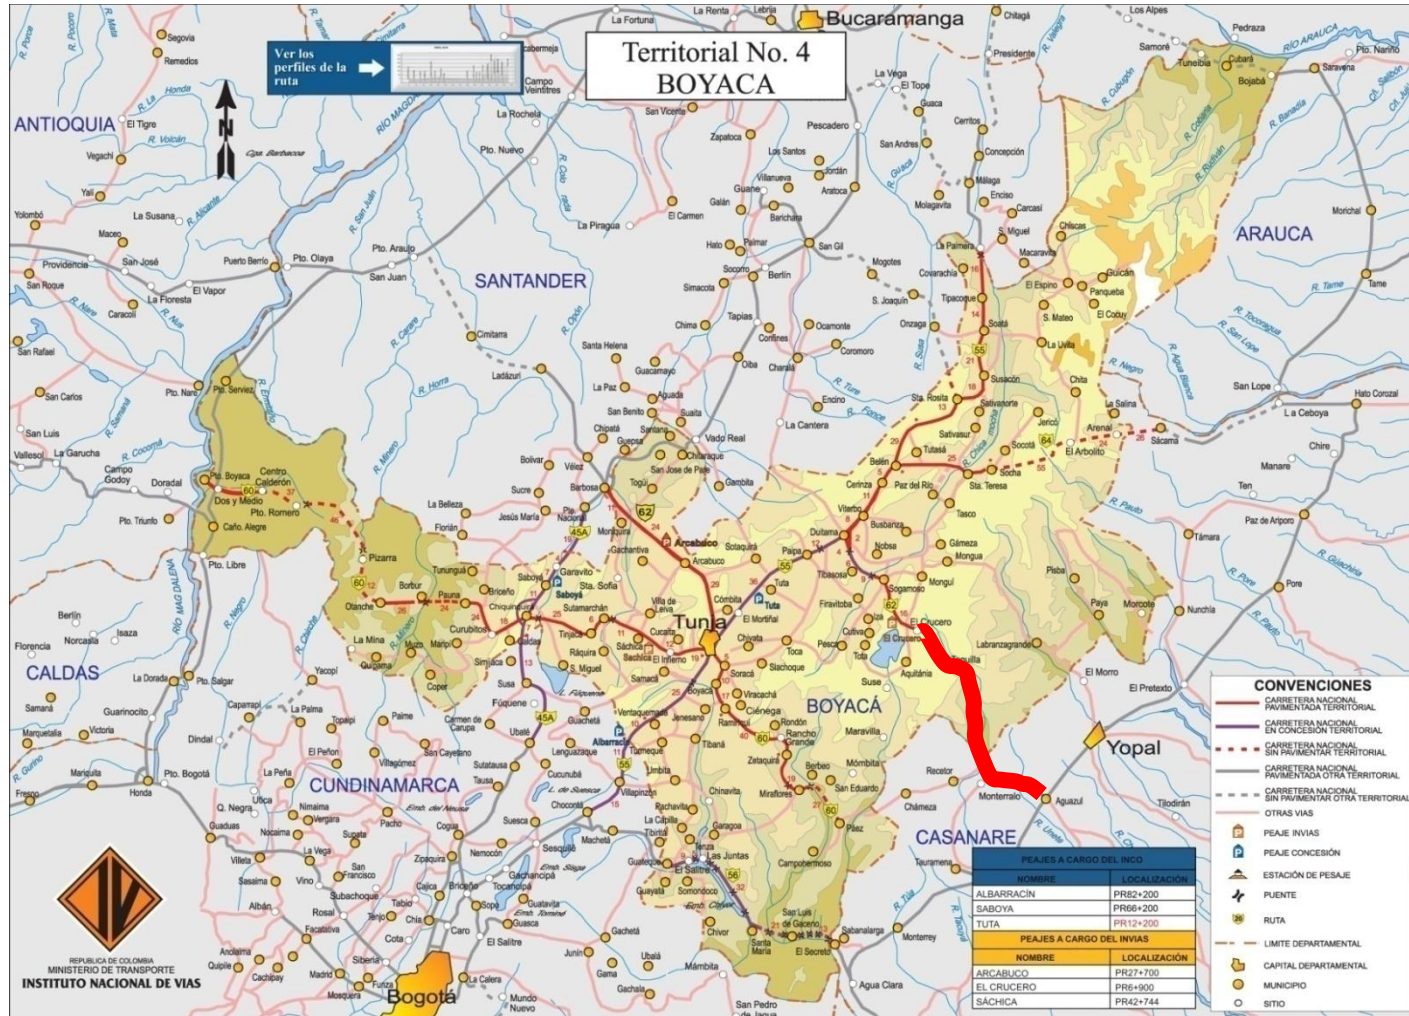

VIA : CRUCERO - AGUAZUL (DEPARTAMENTO BOYACÁ - CASANARE) TRANSVERSAL DEL CUSIANA - FASE 2



CONTRATO DE OBRA:	No. 546 de 2012
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES LAX 048
COMPOSICIÓN:	TRADECO INFRAESTRUCTURA:40% CONINSA RAMON H S.A.: 30% SP INGENIEROS: 30%
VALOR CONTRATO:	\$ 29.059.612.273,00
PLAZO EN MESES:	15 MESES
ORDEN DE INICIO:	17 de Agosto de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de Noviembre de 2013
EJECUCION A LA FECHA	\$ 775.000.000

VALOR CONTRATO:	\$ 29,059,612,273	Metas totales del proyecto:	
		Km pavimentados	puentes
VIGENCIA 2012	11.829,612,273	6	
VIGENCIA 2013	17,230,000,000	9	
TOTAL	29,059,612,273	15	


CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 623-2012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD
VALOR ADJUDICADO:	\$2.900.000.000,00
PLAZO EN MESES:	16 MESES

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	1.5
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	23
KM DE EXPLANACION	4.0



TRANSVERSAL DEL CUSIANA

LONGITUD CORREDOR 57 Km.

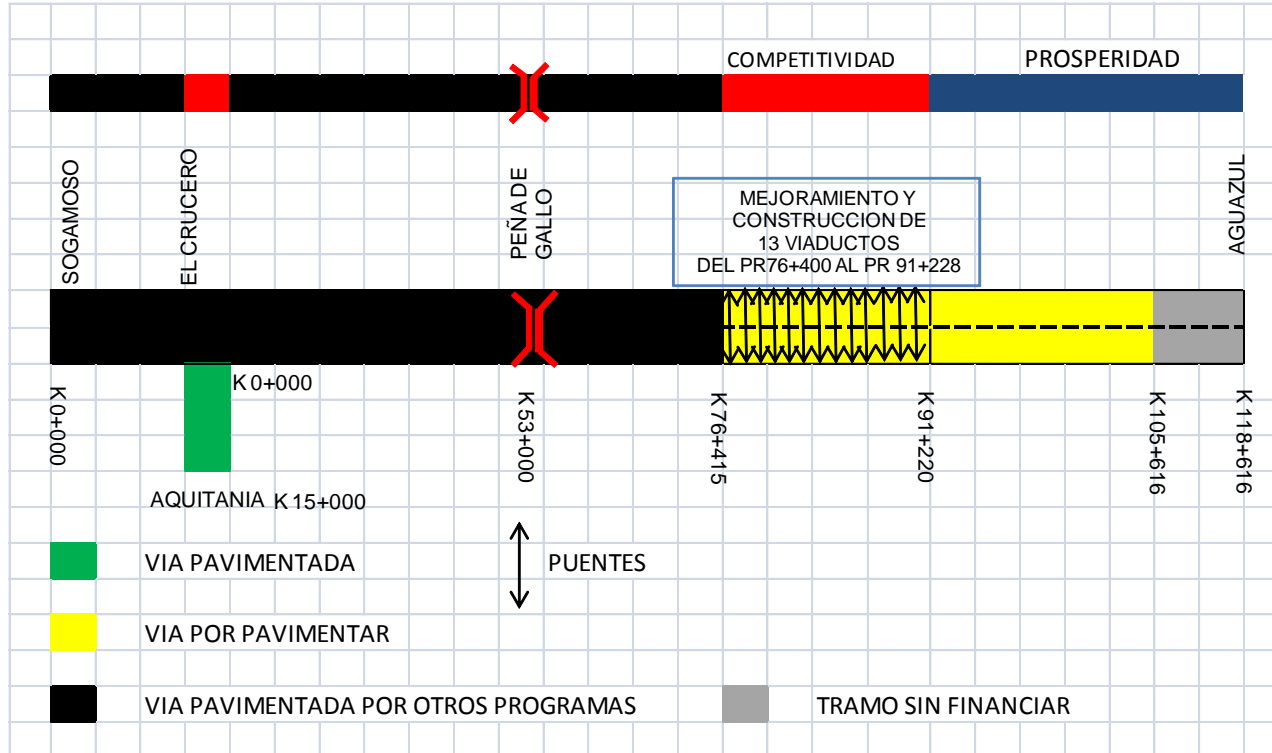

NOMBRE DEL PUENTE	LONG (mt)	PR	ESTADO
PEÑA DE GALLO	360	53+000	EN CONST.
LA CONGUTA	89	76+415	TERMINADO
LA LEONERA	181	80+350	TERMINADO
LOS GRILLOS	262	81+250	TERMINADO
NUEVO 3	103	81+450	TERMINADO
CHORROBLANCO	300	81+600	TERMINADO
EL VERBENO	43	82+560	TERMINADO
LA CHIGUIRERA	110	85+700	TERMINADO
LA ORQUIDEA I	110	86+510	TERMINADO
LA ORQUIDEA II	92	86+740	TERMINADO
LA GRANJA	236	87+640	EN CONST.
LA CASCADA	96	89+300	EN CONST.
CUSIANA	86	90+131	EN CONST.
LA FRONTERA	53	91+228	TERMINADO



REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2

