



**VIA: LAS ANIMAS – PUEBLO RICO; APIA - LA VIRGINIA (DEPARTAMENTO DE CHOCHO - RISARALDA) TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2**

**LONGITUD CORREDOR 154 Km**





**VIA: LAS ANIMAS – PUEBLO RICO; APIA - LA VIRGINIA (DEPARTAMENTO DE CHOCHO - RISARALDA) TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2**



<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	<b>No. 532 de 2012</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD 2011
<b>COMPOSICIÓN:</b>	Ortiz construcciones y proyectos s.A. Sucursal colombia Equipo universal s.A. Edgardo navarro vives Codifa Ltda Puentes y torones
<b>VALOR CONTRATO:</b>	<b>\$ 246.312.380.761.00</b>
<b>PLAZO EN MESES:</b>	<b>51 MESES</b>
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	<b>4de Septiembre de 2012</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>3 de Diciembre de 2016</b>
<b>EJECUCION A LA FECHA</b>	<b>\$ 24.049.000.000</b>

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 677-2012</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO PRIORITARIOS 002
<b>VALOR</b>	<b>\$10.599.699.850.50</b>
<b>PLAZO EN MESES:</b>	<b>52MESES</b>


VALOR CONTRATO:	\$ 246.312.380.761	Metas totales del proyecto:	
		Km pavimentados	puentes
VIGENCIA 2012	\$8.165.321.937	0	
VIGENCIA 2013	\$ 22.005.882.353	7	
VIGENCIA 2014	\$ 47.505.882.353	11	1
VIGENCIA 2015	\$ 90.505.882.353	21	2
VIGENCIA 2016	\$ 78.129.411.765	18	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 246.312.380.761</b>	<b>57</b>	<b>3</b>

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
<b>KM PAVIMENTADOS</b>	<b>1.5</b>
<b>KM MANTENIMIENTO PERIODICO</b>	<b>57</b>
<b>KM DE EXPLANACION</b>	<b>5.35</b>



# ALCANCE DE INTERVENCION

## TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO LAS ANIMAS – PUEBLO RICO; APIA -LA VIRGINIA LONGITUD CORREDOR 154 Km

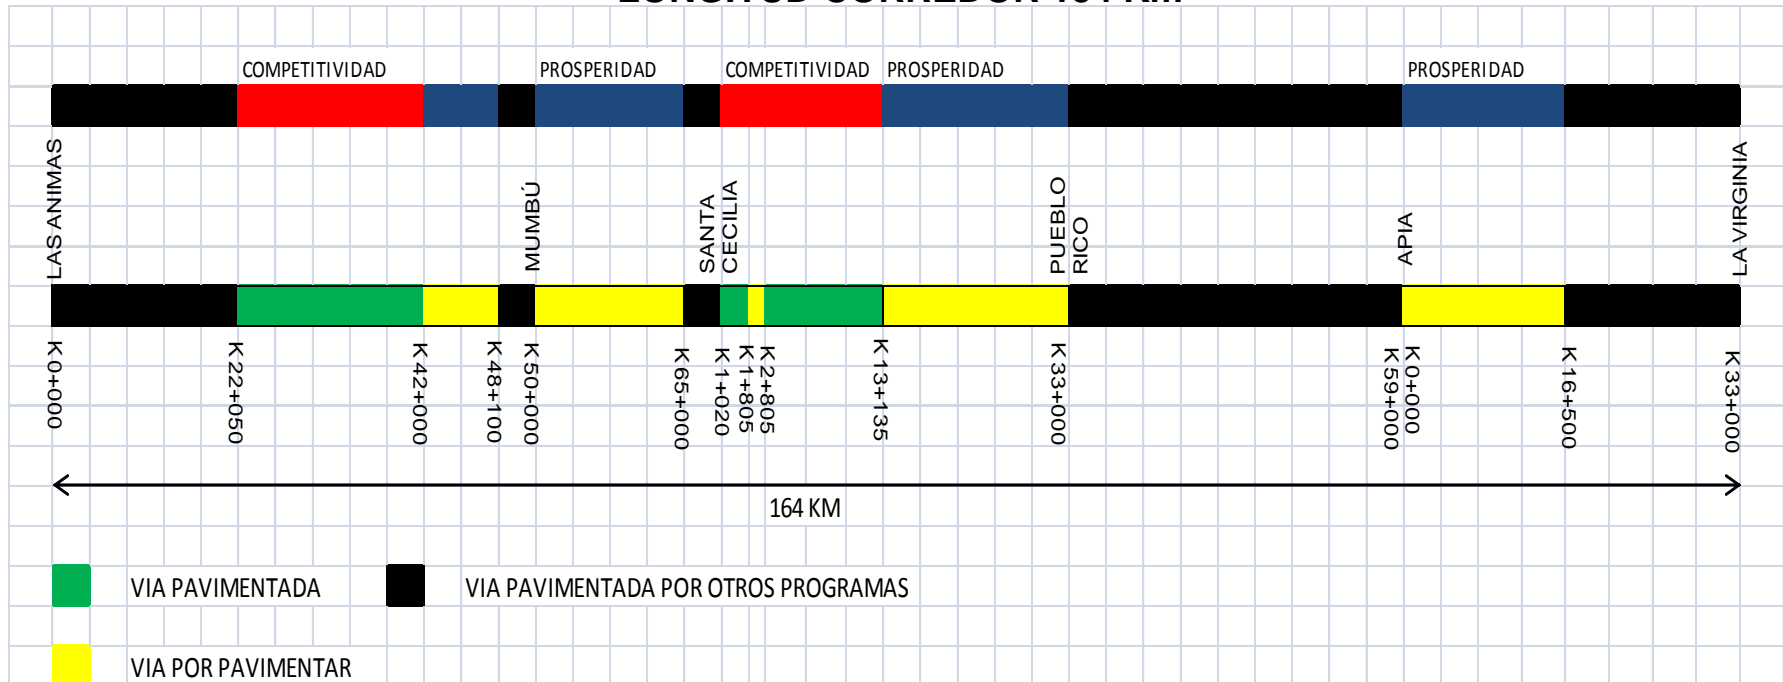

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2

