


# VIA: HONDA – MANIZALES (DEPARTAMENTO DE CALDAS)

## TRANSVERSAL HONDA – MANIZALES FASE 2.

### LONGITUD DEL CORREDOR 64 KM



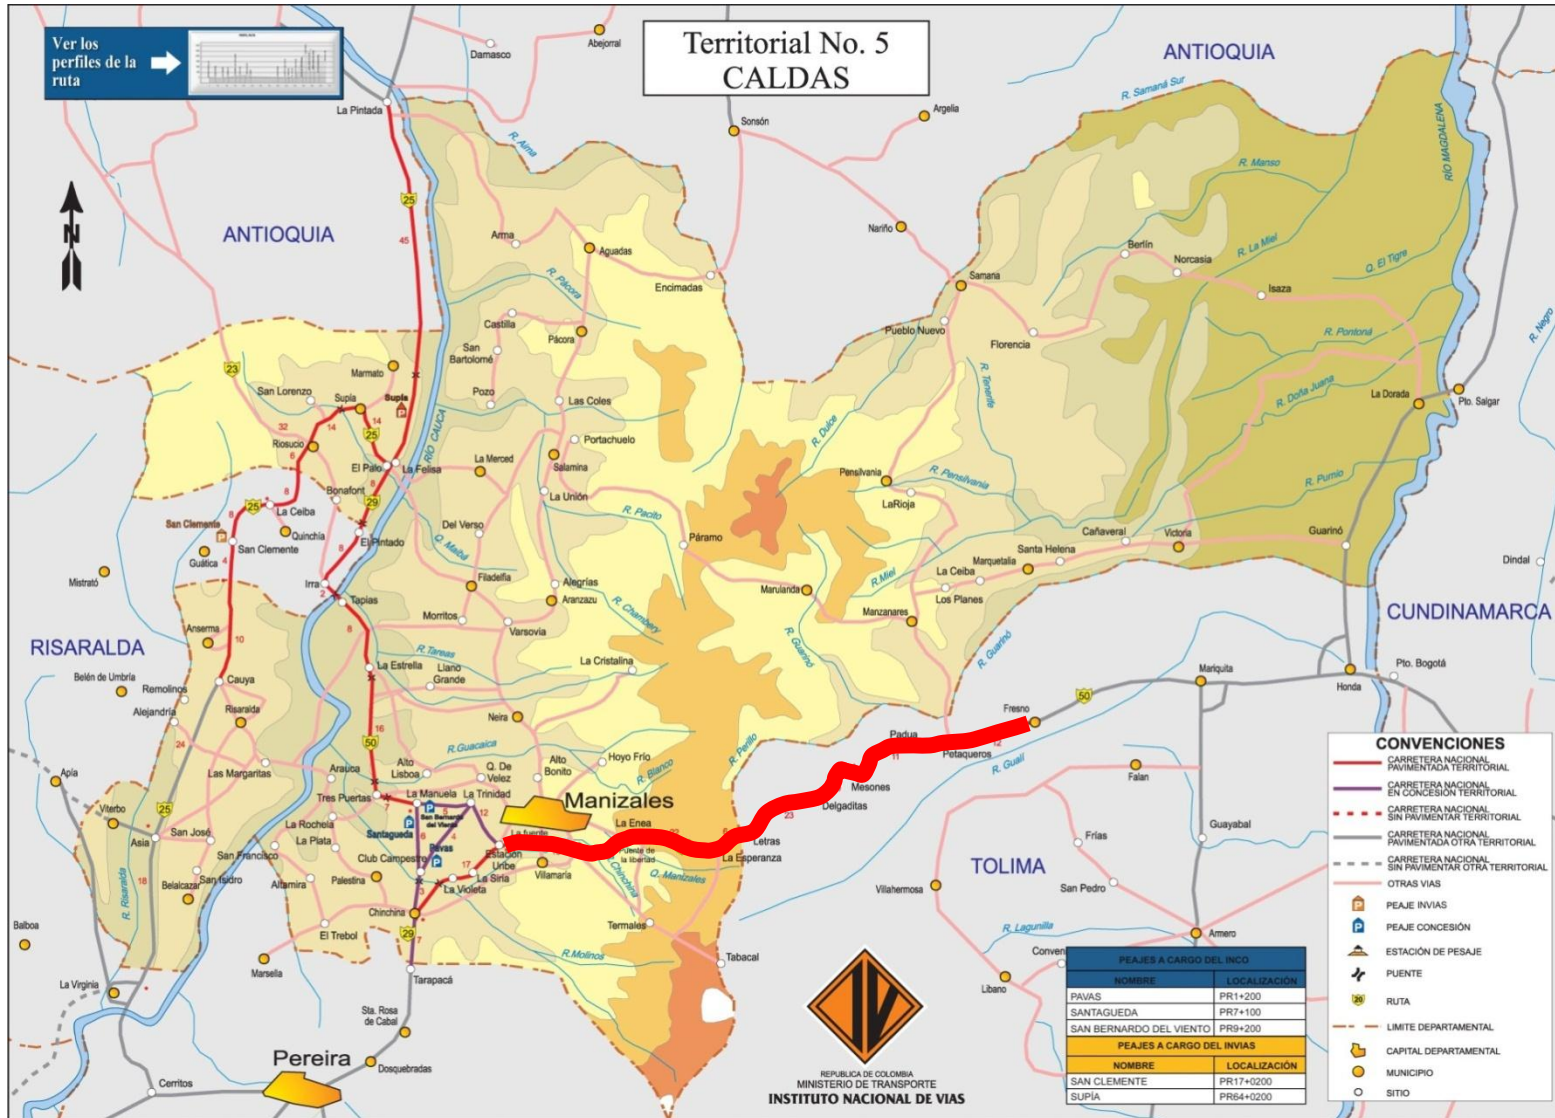

## VIA: HONDA – MANIZALES (DEPARTAMENTO DE CALDAS) TRANSVERSAL HONDA – MANIZALES FASE 2



<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	<b>No. 570 de 2012</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD
<b>COMPOSICIÓN:</b>	LATINCO S.A.: 20% HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.:20% MINCIVILES S.A.: 20% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL:20% ESTYMA:20%
<b>VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:</b>	\$ 100.587.650.808
<b>PLAZO EN MESES:</b>	30 MESES
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	27 de agosto 2012
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	27 de FEBRERO de 2015
<b>EJECUCION A LA FECHA</b>	\$ 8.553.340.000

VALOR CONTRATO:	\$100.587.650.808	Metas totales del proyecto:		
		Km pavimentados	puentes	Km doble calzada
<b>VIGENCIA 2012</b>	1.500.000.000	0	0	0
<b>VIGENCIA 2013</b>	30.181.915.962	10	0	1
<b>VIGENCIA 2014</b>	68.905.734.846	11	2	4
<b>VIGENCIA 2015</b>				
<b>TOTAL</b>	100.587.650.808	21	2	5



<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 622-2012</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD
<b>VALOR ADJUDICADO:</b>	\$5.795.210.094
<b>PLAZO EN MESES:</b>	31 MESES

AVANCE DEL CONTRATO	TOTAL
ITEM	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95
<b>KM PAVIMENTADOS</b>	<b>0</b>
<b>KM MANTENIMIENTO PERIODICO</b>	<b>19</b>
<b>KM DE EXPLANACION</b>	<b>0</b>

# ALCANCE DE INTERVENCIÓN



## HONDA MANIZALES LONGITUD DEL CORREDOR 64 KM

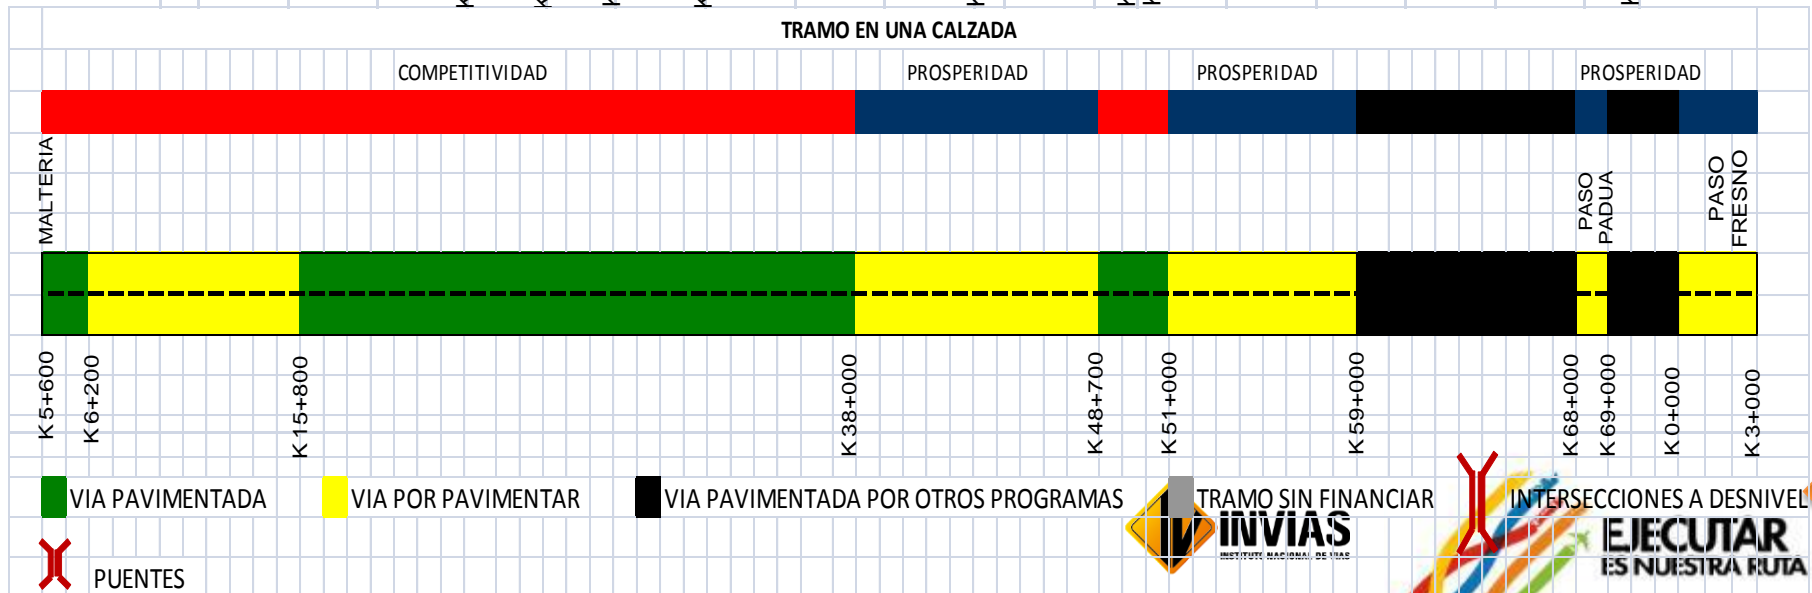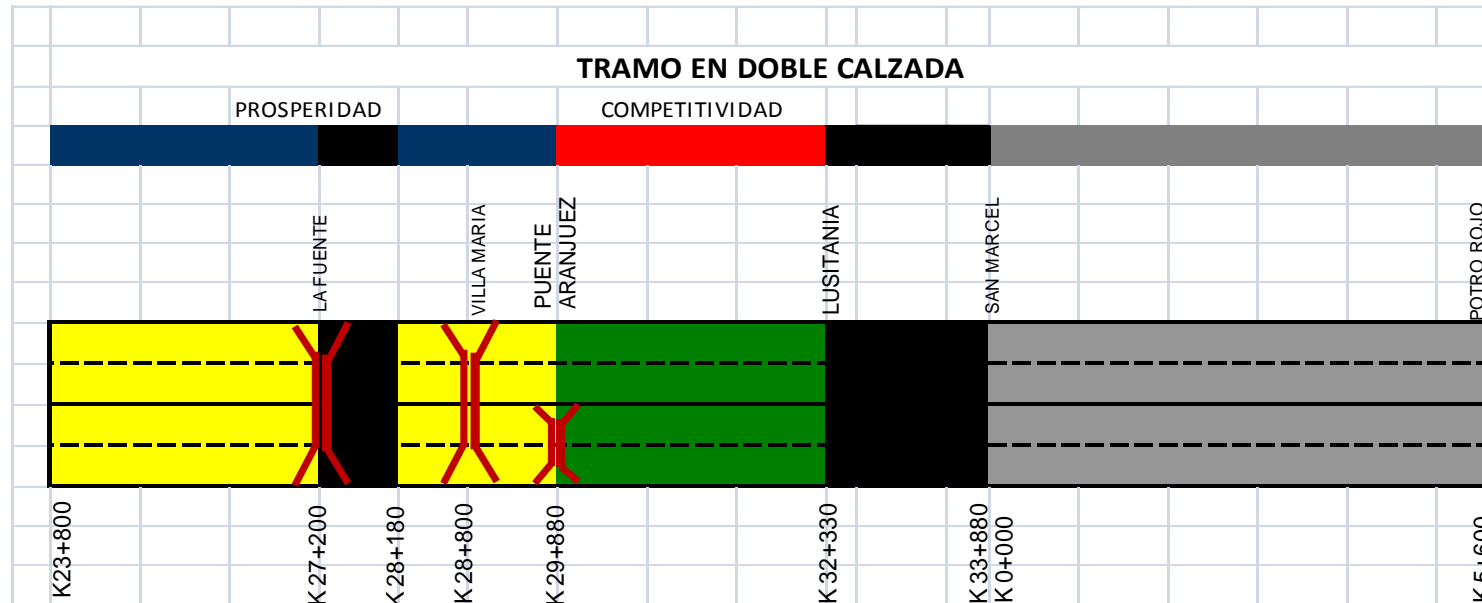



## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE CORREDOR HONDA MANIZALES



ANTES



ACTUALMENTE



ACTUALMENTE



ACTUALMENTE
