


VIA: OTANCHE – PUERTO BOYACÁ (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ) TRANSVERSAL DE BOYACÁ LONGITUD DEL CORREDEOR 170 Km



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



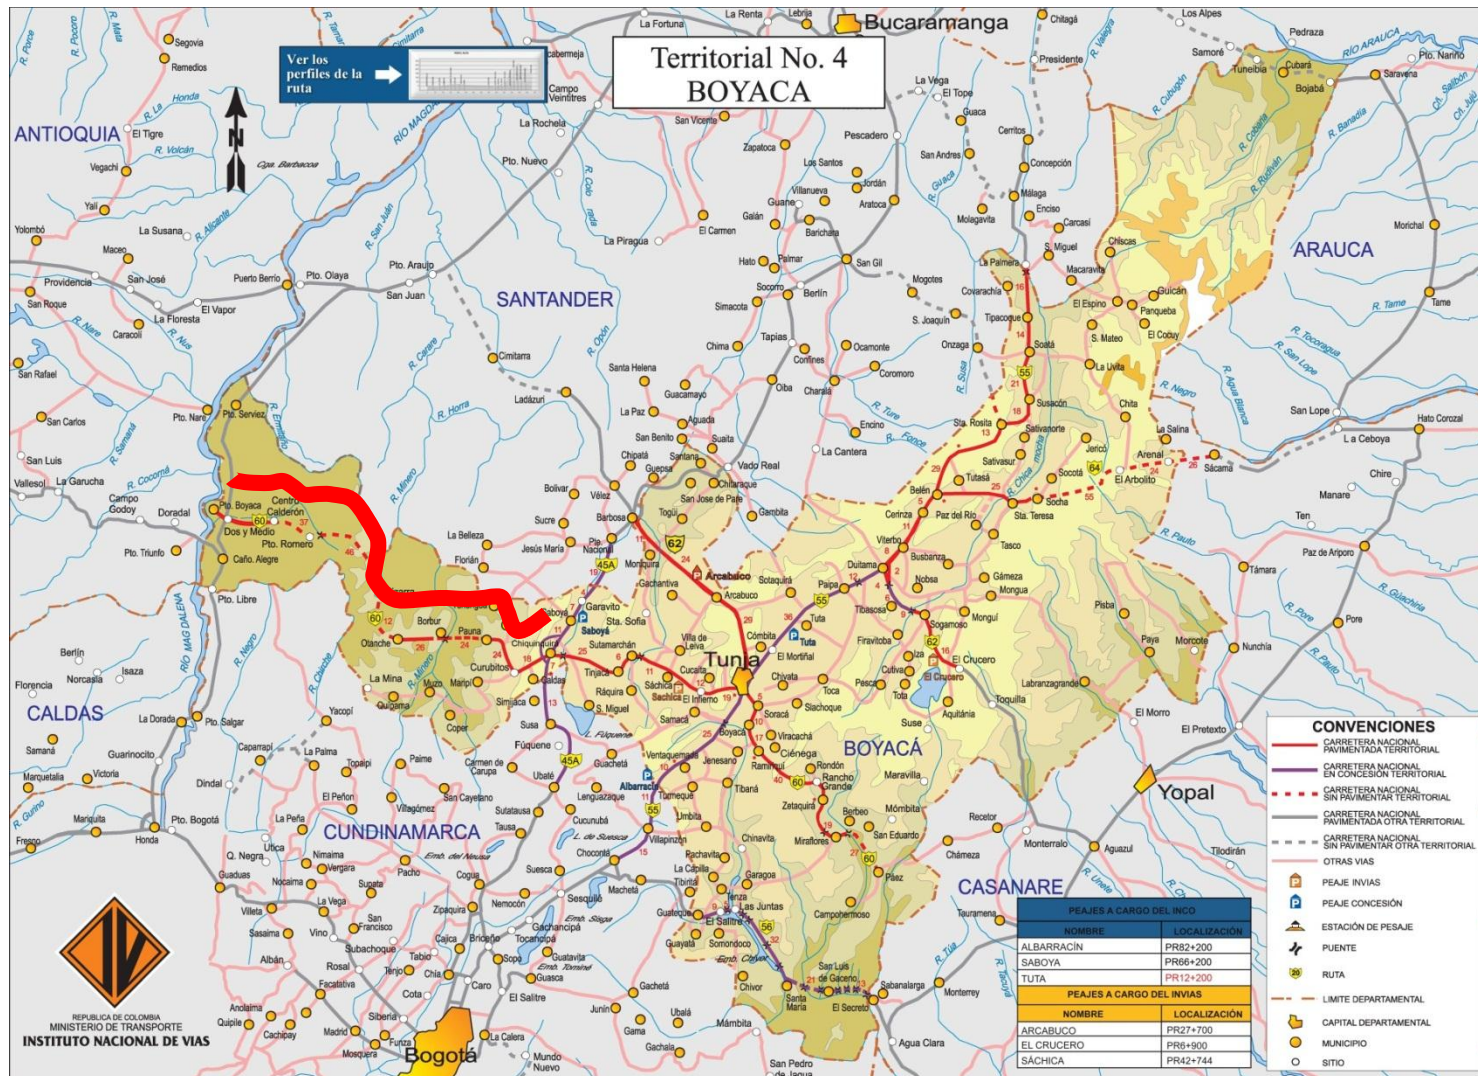

VIA: OTANCHE – PUERTO BOYACÁ (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ) TRANSVERSAL DE BOYACÁ FASE DOS



CONTRATO DE OBRA:	No. 563 de 2012
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD - CONPROS
COMPOSICIÓN:	CBPO ENGENHARIA LTDA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.
VALOR CONTRATO:	\$ 154.280.297.291
VIGENCIA 2013	\$ 13.159.519.760
PLAZO EN MESES:	48 MESES
ORDEN DE INICIO:	30 de JULIO DEL 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de JULIO 2016
EJECUCION A LA FECHA	\$ 5,451.541.780

VALOR CONTRATO:	\$ 154,280,297,291	Metas totales del proyecto:	
		Km pavimentados	puentes
VIGENCIA 2012	9,079,759,880	0	
VIGENCIA 2013	13,159,519,760	5	
VIGENCIA 2014	34,292,109,181,	10	
VIGENCIA 2015	38,669,148,590	15	1
VIGENCIA 2016	59,079,759,880	19	1
TOTAL	154,280,297,291	49	2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 628 DEL 2012
INTERVENTOR:	DISEÑO GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S
VALOR ADJUDICADO:	\$ 7.361.905.230
PLAZO EN MESES:	49 MESES

ANTICIPAR VIGENCIA 2016

20.000.000.000

Km previstos a intervenir

5


AVANCE DEL CONTRATO	TOTAL
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	0
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	30
MK DE EXPLANACION	1,7



TRANSVERSAL DE BOYACA

CHIQUINQUIRA – PUERTO BOYACA

LONGITUD DEL CORREDEOR 170 Km

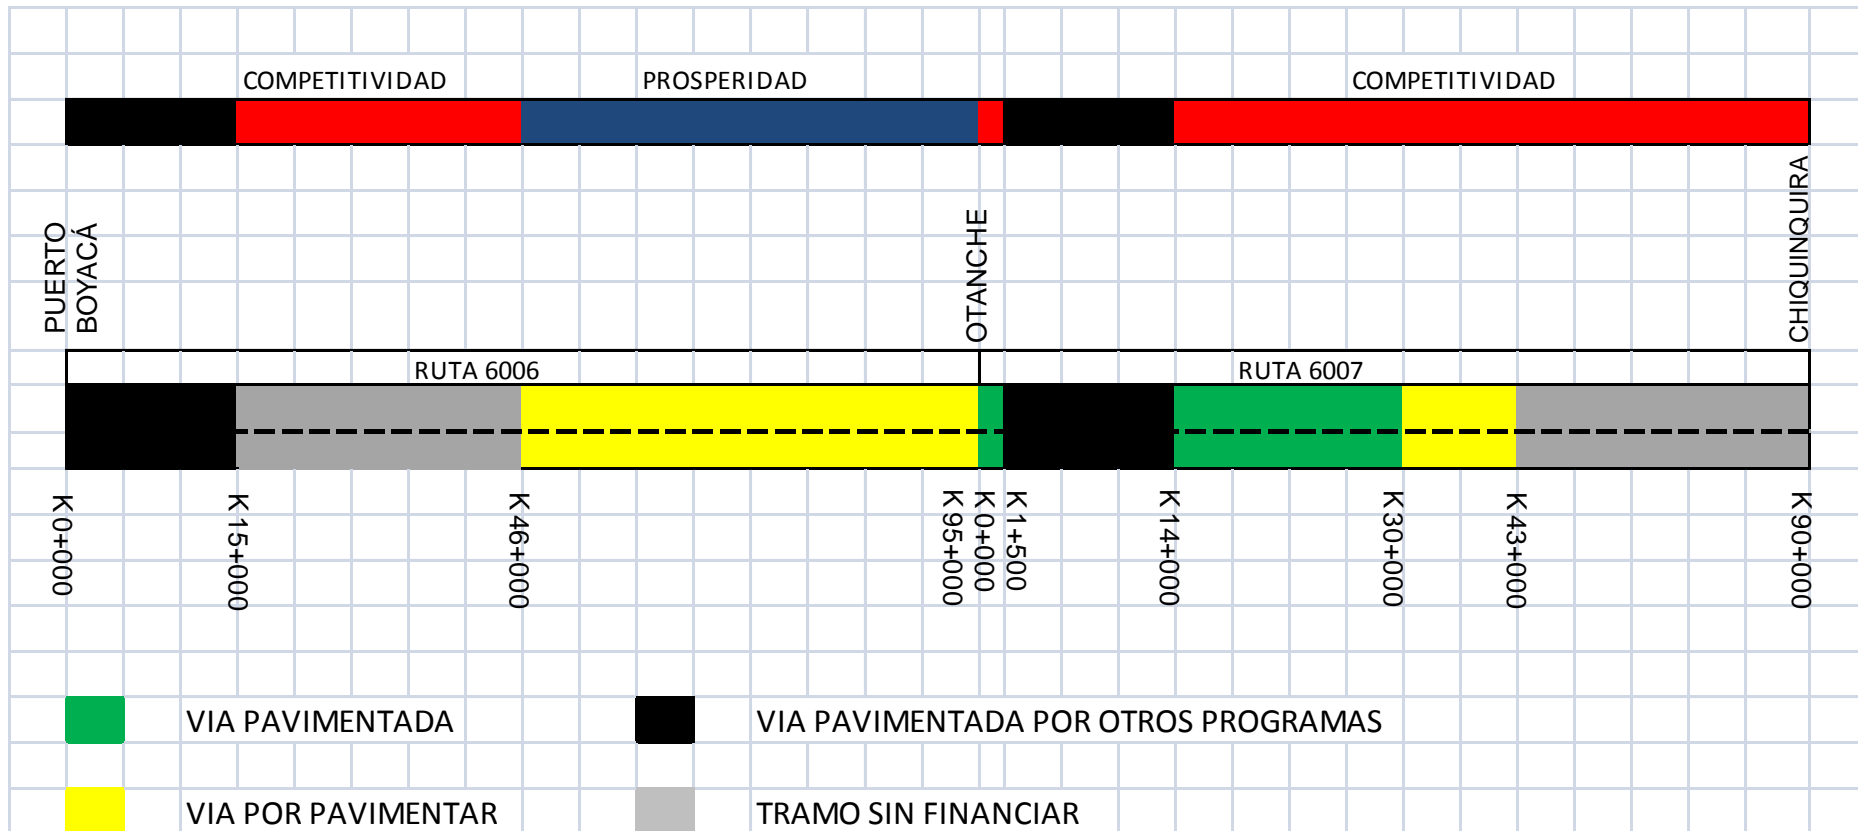

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL BOYACA OTANCHE – PUERTO BOYACÁ



ANTES



ACTUALMENTE

