



MinTransporte  
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

**VIA: QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR  
(DEPARTAMENTO DE CHOCO)  
TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2  
LONGITUD CORREDOR 127 Km**





## VIA: EL DIECIOCHO – CIUDAD BOLIVAR (DEPARTAMENTO DE CHOCO) TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2



<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	<b>No. 544 de 2012</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO LAX 051
<b>COMPOSICIÓN:</b>	Tradeco Infraestructura:40% Coninsa Ramon H S.A.: 30% SP Ingenieros: 30%
<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 254.560.365.898
<b>PLAZO EN MESES:</b>	51 MESES
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	08 de Agosto de 2012
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	Noviembre de 2016
<b>EJECUCION A LA FECHA</b>	\$ 3.500.000.000

VALOR CONTRATO:	254.560.365.898	METAS:	
		Km Pavimentados	N° Puentes
VIGENCIA 2012	\$ 7.248.601.192	0	0
VIGENCIA 2013	\$ 32.416.470.588	6	1
VIGENCIA 2014	\$ 84.916.470.588	25	2
VIGENCIA 2015	\$ 91.916.470.588	25	2
VIGENCIA 2016	\$ 38.062.352.942	20	2
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 254.560.365.898</b>	<b>76</b>	<b>7</b>

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 601-2012</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO INTERVIAL 2012
<b>VALOR ADJUDICADO:</b>	\$10.979.979.752
<b>PLAZO EN MESES:</b>	52 MESES


ANTICIPAR VIGENCIA 2014 **10.000.000.000**

Km previstos a intervenir **3**

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
<b>KM PAVIMENTADOS</b>	<b>0</b>
<b>KM MANTENIMIENTO PERIODICO</b>	<b>56</b>
<b>MK DE EXPLANACION</b>	<b>6</b>



# TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDO QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR LONGITUD CORREDOR 127 Km

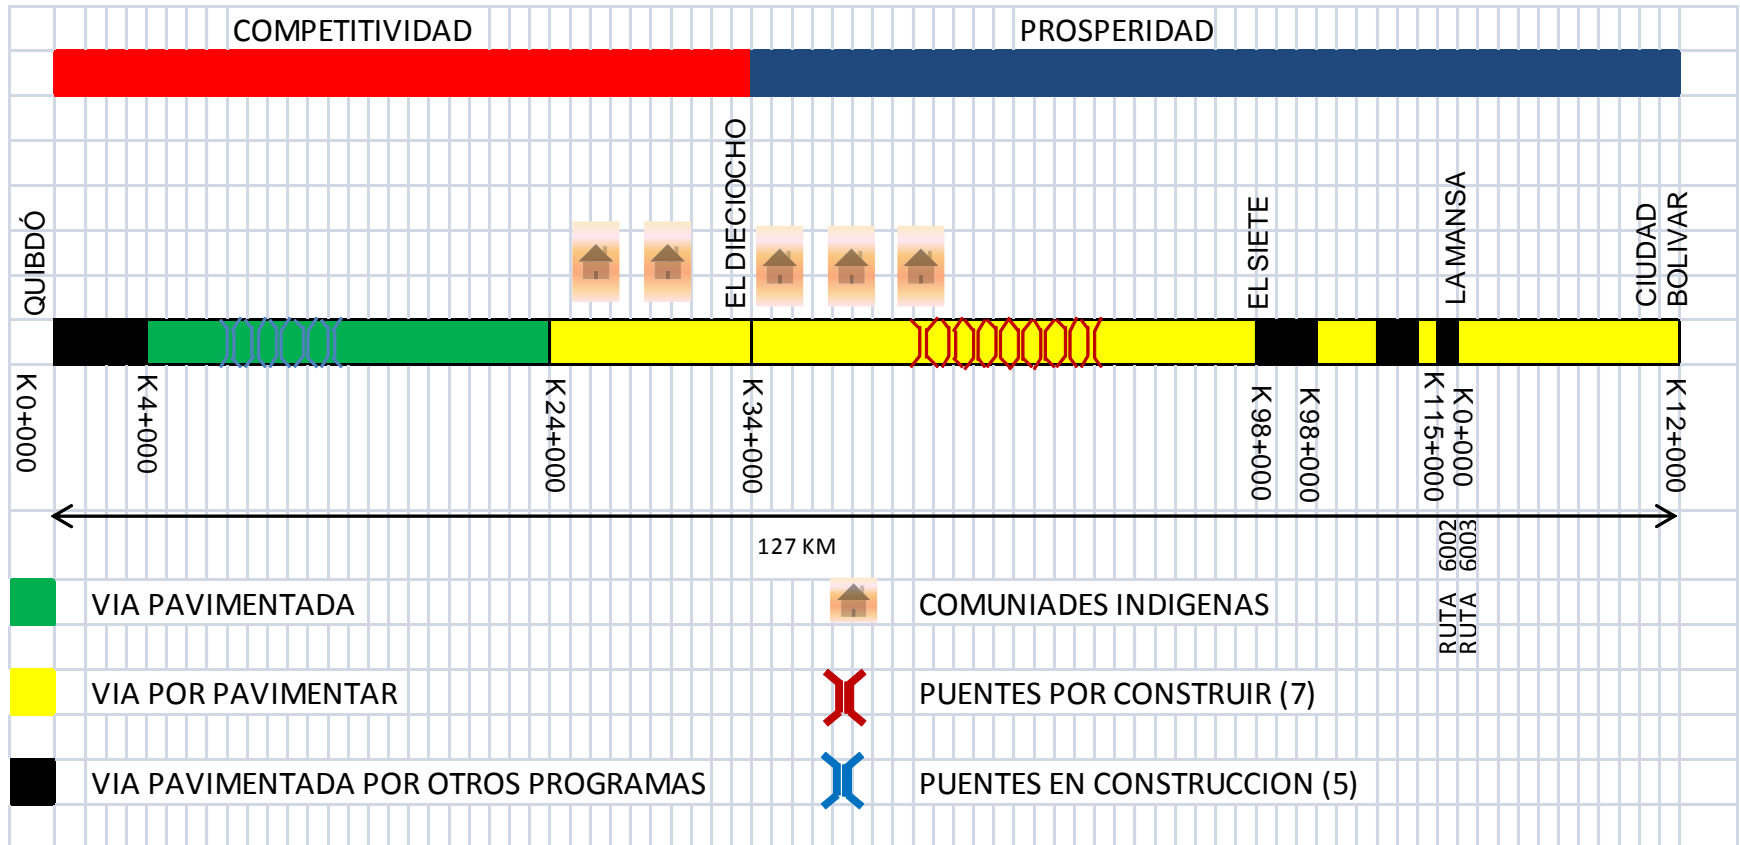



## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2



AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800

ACTUALMENTE



AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800 TALUD YA REVEGETALIZADO.

ACTUALMENTE



TRITURADORA LOCALIZADA PR 96+000 – PROCESANDO MAT. PETREOS
