


**VIA: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA. SECTOR SAN JOSÉ DEL FRAGUA YURAYACO (DEPARTAMENTO DEL CAQUETA)**

**LONGITUD DEL CORREDOR 60 Km**



## VIA: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA. SECTOR SAN JOSÉ DEL FRAGUA YURAYACO (DEPARTAMENTO DEL CAQUETA)

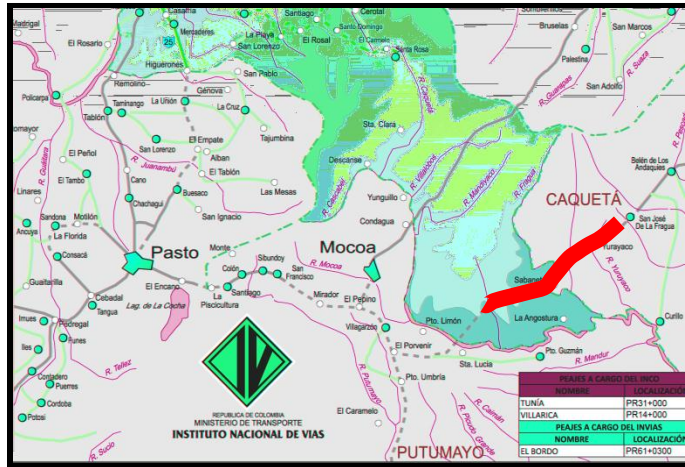

CONTRATO:	545 DE 2012
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO 049
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO S.A HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS.
CONTRATO DE OBRA:	No. 545 de 2012
VALOR INICIAL:	\$ 120.317.718.902
PLAZO:	27 MESES
FECHA DE INICIO:	15 de AGOSTO de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2014
EJECUCION ACTUAL	\$ 17.377.000.000


<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 120.317.718.902	Metas totales del proyecto:
		Km pavimentados
<b>VIGENCIA 2012</b>	\$ 3.119.211.317	0
<b>VIGENCIA 2013</b>	\$ 34.132.142.857	15
<b>VIGENCIA 2014</b>	\$ 83.066.364.728	45
<b>TOTAL</b>	\$ 120.317.718.902	60

<b>Contrato:</b>	637 de 2012
<b>Contratista:</b>	CONSORCIO PRIORITARIOS 004
<b>Integrantes:</b>	A.I.M-LTDA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A
<b>Valor Contrato:</b>	\$ 3.599.873.937 (incluido IVA y ajustes)
<b>Plazo:</b>	Veintiocho(28) meses
<b>Fecha Iniciación:</b>	9 de Agosto de 2012
<b>Fecha terminación:</b>	8 de Diciembre de 2014

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	95
KM PAVIMENTADOS	0
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	10
K DE EXPLANACION	2



# VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA LONGITUD DEL CORREDOR 60 Km

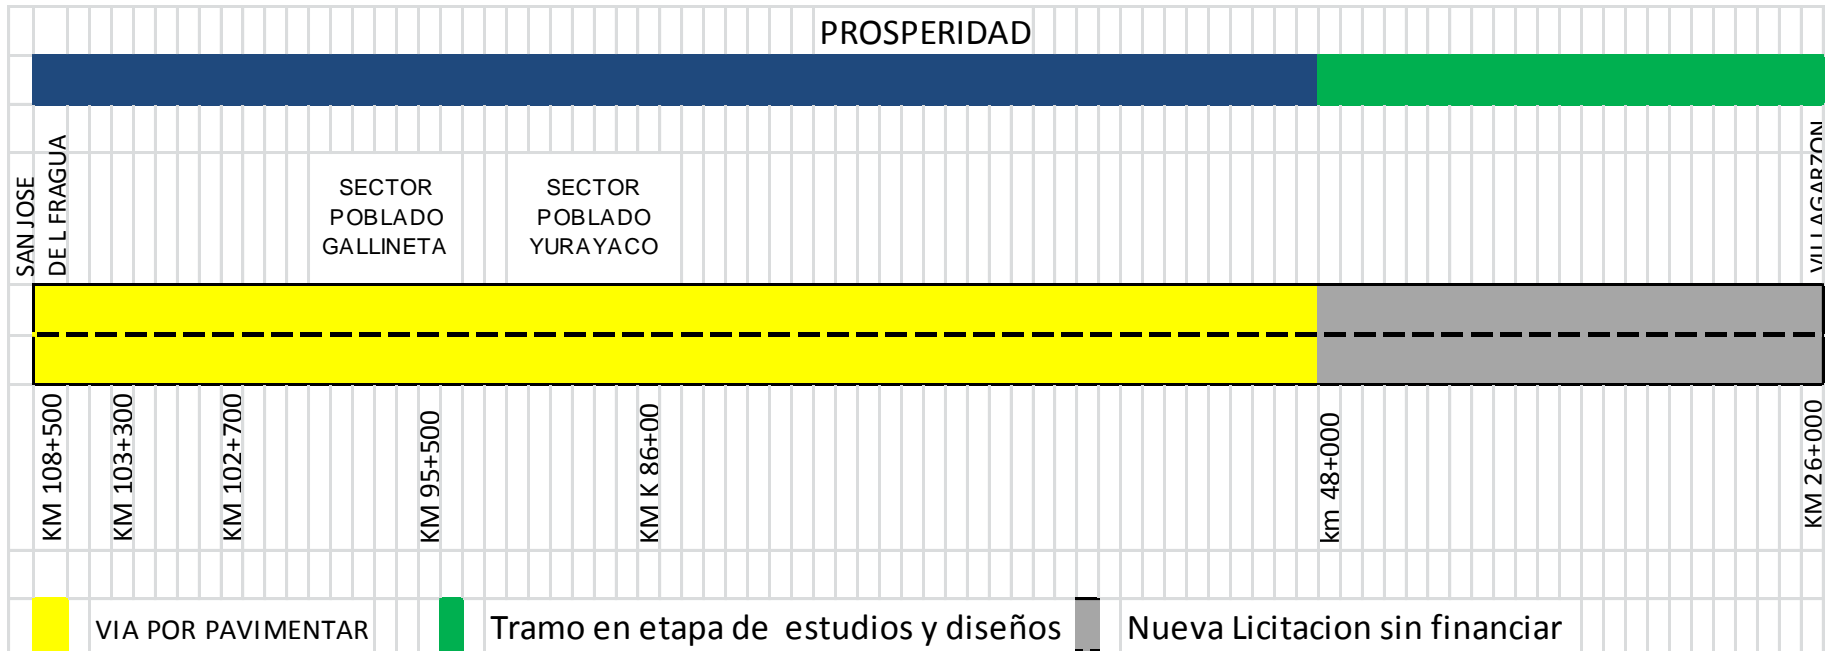

## REGISTRO FOTOGRAFICO VIA: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA. SECTOR SAN JOSÉ DEL FRAGUA YURAYACO (DEPARTAMENTO DEL CAQUETA)



K 98 + 660  
INSTALACION DE GEOTEXTIL  
CORREDOR VIAL  
SAN JOSE DEL FRAGUA - VILLAGARZÓN



K 98 + 640  
INSTALACION DE GEOTEXTIL  
CORREDOR VIAL  
SAN JOSE DEL FRAGUA - VILLAGARZÓN
