

# CORREDORES DE COMPETITIVIDAD INVIAS



**MinTransporte**  
Ministerio de Transporte


**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**INVIAS**

**EJECUTAR  
ES NUESTRA RUTA**

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD

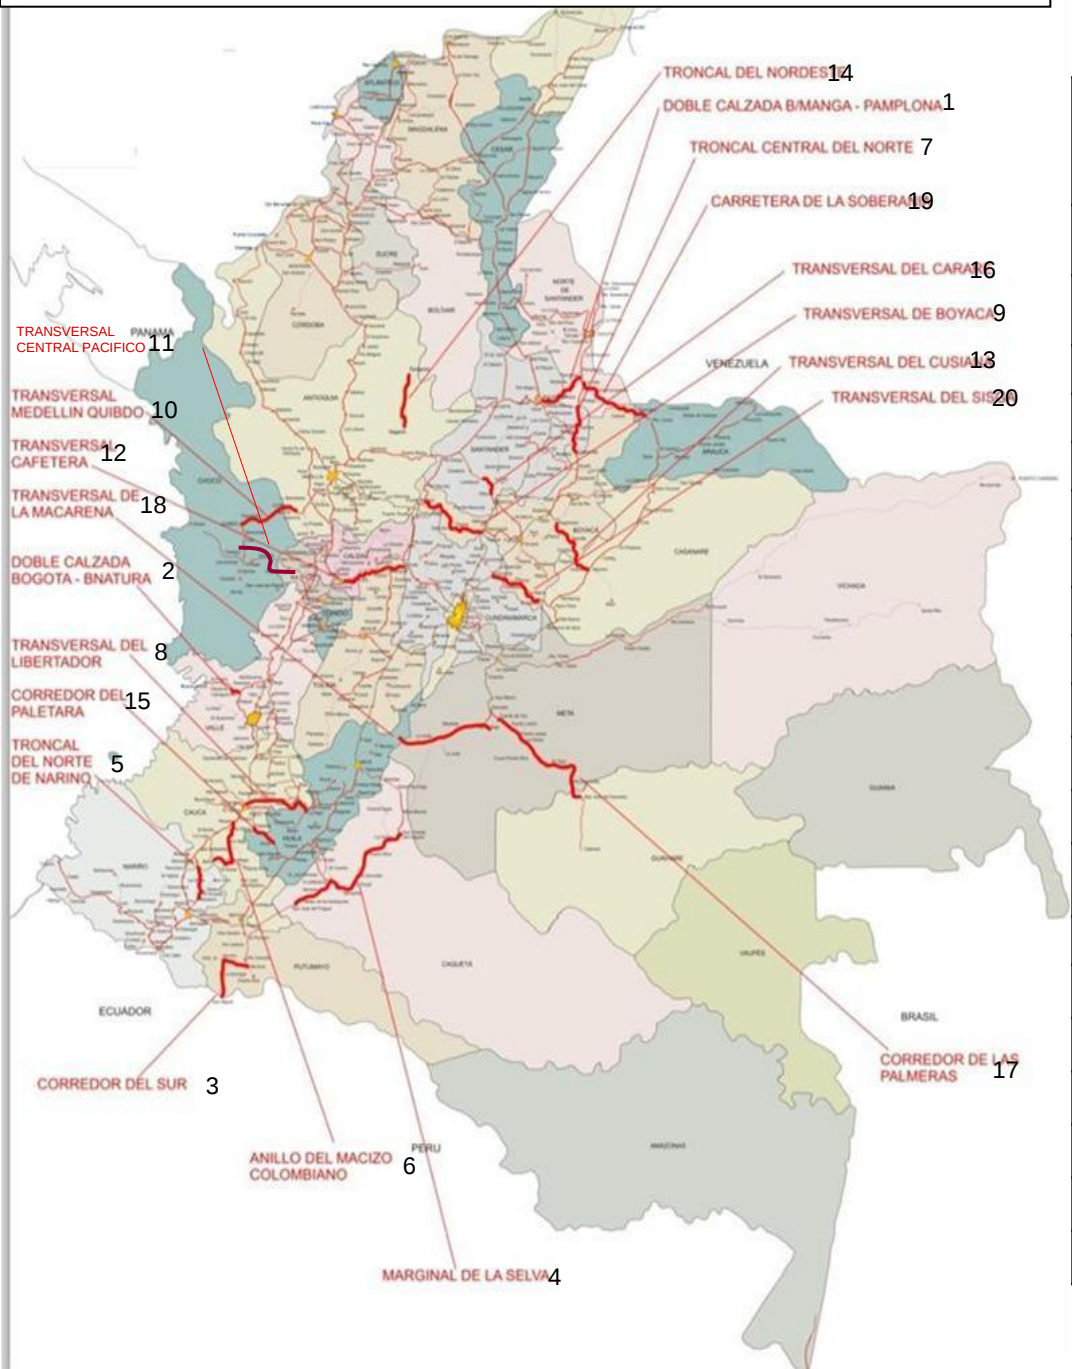

| PROYECTOS |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1         | Doble Calzada Bucaramanga-Cúcuta                        |
| 2         | Doble Calzada Bogotá - Buenaventura                     |
| 3         | Corredor del Sur                                        |
| 4         | Marginal de La Selva                                    |
| 5         | Troncal Norte de Nariño                                 |
| 6         | Anillo del Macizo Colombiano                            |
| 7         | Troncal Central del Norte                               |
| 8         | Transversal del Libertador                              |
| 9         | Transversal de Boyacá                                   |
| 10        | Transversal Medellín - Quibdo                           |
| 11        | Transversal Central Pacifico                            |
| 12        | Transversal Cafetera                                    |
| 13        | Transversal del Cusiana Tramo ( El Crucero - Aquitania) |
| 14        | Troncal Nordeste                                        |
| 15        | Corredor del Paletará                                   |
| 16        | Transversal del Carare                                  |
| 17        | Corredor de Las Palmeras                                |
| 18        | Transversal de La Macarena                              |
| 19        | Carretera de La Soberanía                               |
| 20        | Transversal del Sisga                                   |

# PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS DE COMPETITIVIDAD

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA \$ 2.890.270

INICIO DE OBRAS Sep. -09


TERMINACION OBRAS Sep. -15

TOTAL DE CONTRATOS DEL PROGRAMA 19

| AÑOS                       | VIGENCIA   |            |            |            |              | EN MILLONES |           | TOTAL     |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|                            | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013         | 2014        | 2015      |           |
| VALOR CONTRATO             | \$ 232.096 | \$ 518.304 | \$ 533.153 | \$ 819.486 | \$ 618.019   | \$ 153.270  | \$ 15.943 | 2.890.270 |
| TERMINACION DE CONTRATOS   |            |            |            |            | 14           | 4           | 1         | 19        |
| EJECUCION A LA FECHA       |            |            |            |            | \$ 2.226.642 |             |           |           |
| VIGENCIA ANTICIPADA A 2013 |            |            |            |            | \$ 50.000    |             |           |           |

| META FISICA        |      |     |       |       |       |      |   |       |
|--------------------|------|-----|-------|-------|-------|------|---|-------|
| PAVIMENTOS KM      | 13.9 | 103 | 152.7 | 194.5 | 158.5 | 47.3 | 3 | 673.1 |
| PUENTES UN         | 0    | 1   | 16    | 23    | 17    | 3    | 0 | 60    |
| DOBLES CALZADAS KM | 0    | 0   | 0.5   | 2     | 8     | 11   | 8 | 29.5  |

# VIA: CIMITARRA – LANDÁZURI - TRANSVERSAL DEL CARARE FASE 1

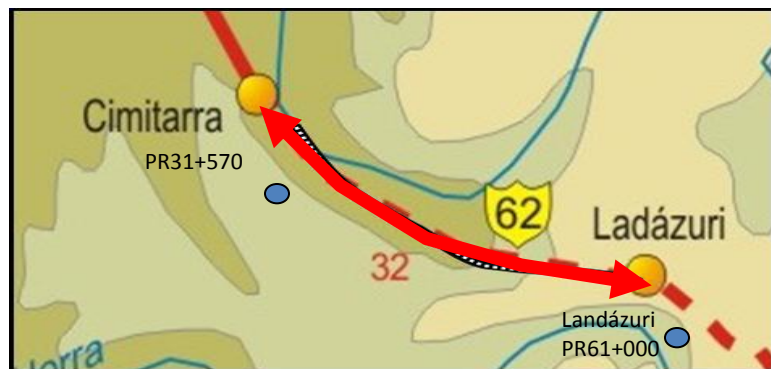

| VALOR CONTRATO: | \$ 84.061.507.615        | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                          | Km<br>pavimenta<br>dos      | puentes |
| VIGENCIA 2009   | \$ 3.878.666.636         | 0                           |         |
| VIGENCIA 2010   | \$ 15.520.894.909        | 2.1                         |         |
| VIGENCIA 2011   | \$ 29.096.993.978        | 7.0                         |         |
| VIGENCIA 2012   | \$ 29.931.666.092        | 4.0                         |         |
| VIGENCIA 2013   | \$ 5.633.286.000         | 4.3                         |         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 84.061.507.615</b> | <b>17,4</b>                 |         |

| ITEM                        | TOTAL        |
|-----------------------------|--------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00       |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>14,10</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>3.3</b>   |


|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:           | No. 655 de 2009                                  |
| CONTRATISTA:                | CONSORCIO TRANSVERSAL DEL CARARE                 |
| COMPOSICIÓN:                | Ingeniería de Vías S.A. 45%<br>PROCOPAL S.A. 55% |
| REPRESENTANTE LEGAL:        | PEDRO CONTECHA CARRILLO                          |
| VALOR CONTRATO ACTUALIZADO: | \$ 84.061.507.615,00                             |
| VIGENCIA 2013               | \$ 5.633.286.000,00                              |
| PLAZO EN MESES:             | 48 MESES                                         |
| ORDEN DE INICIO:            | 23 de Septiembre de 2009                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN:       | 22 de Septiembre de 2013                         |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1477-2009             |
| INTERVENTOR:               | CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | JAIME DURAN MELENDEZ      |
| VALOR ACTUALIZADO:         | \$3.393.800.562.00        |
| PLAZO EN MESES:            | 49 MESES                  |


# ALCANCE DE INTERVENCION

## TRANSVERSAL DEL CARARE CIMITARRA – LANDAZURI

### LONGITUD DEL CORREDOR 28,7

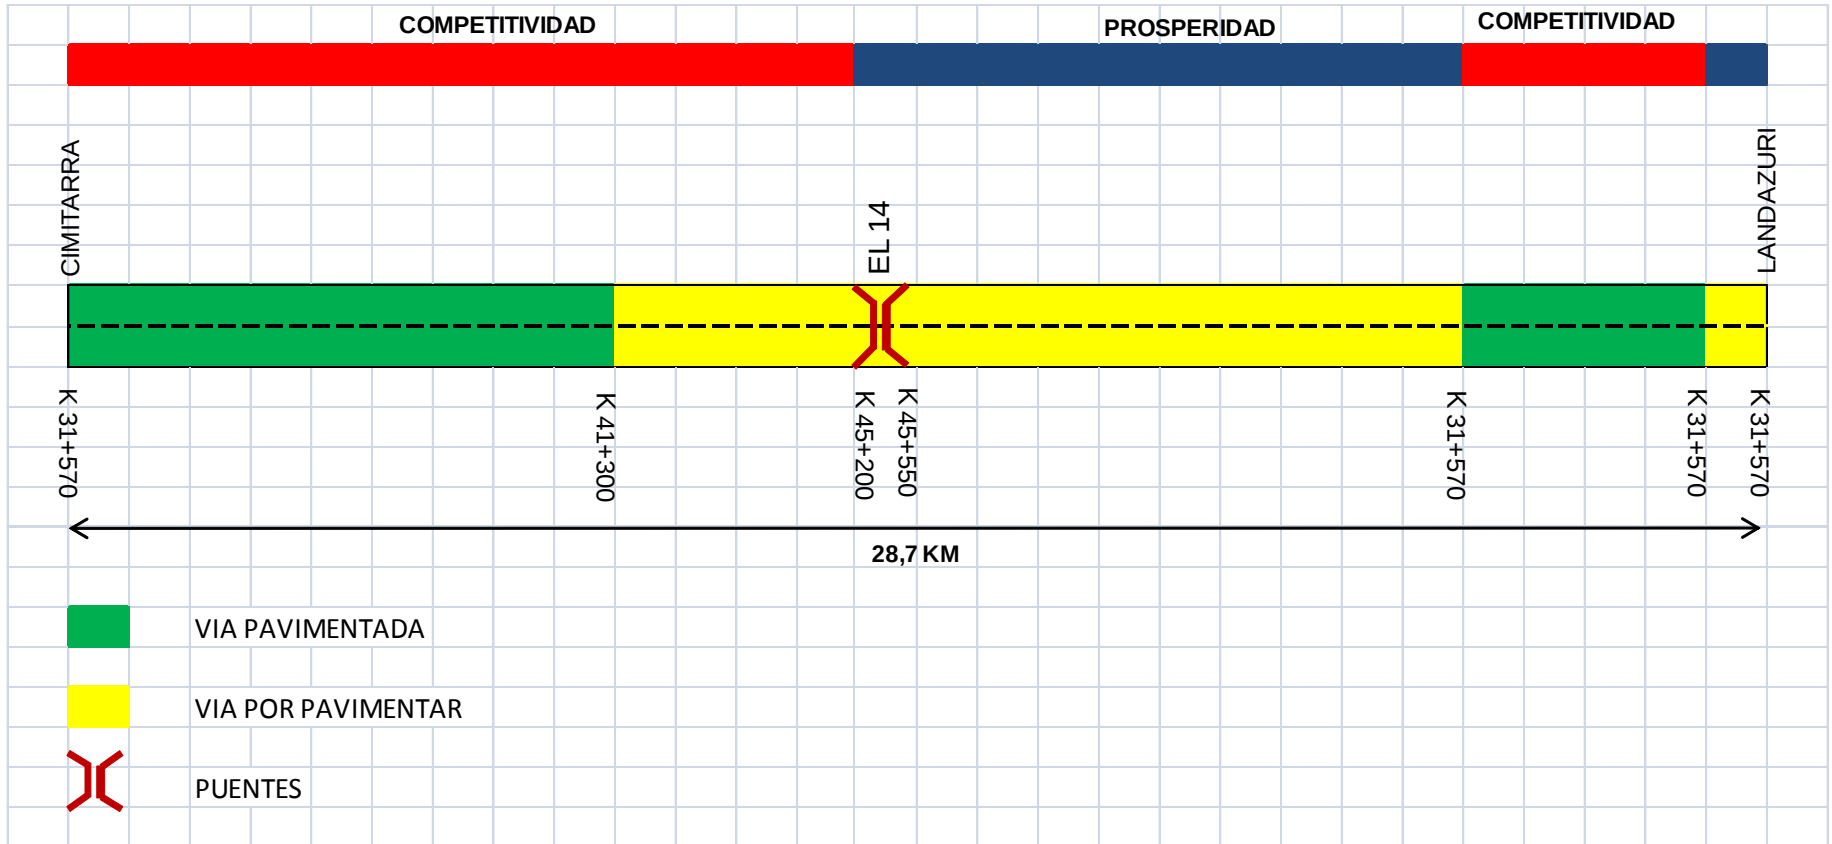

# TRANSVERSAL DEL CARARE

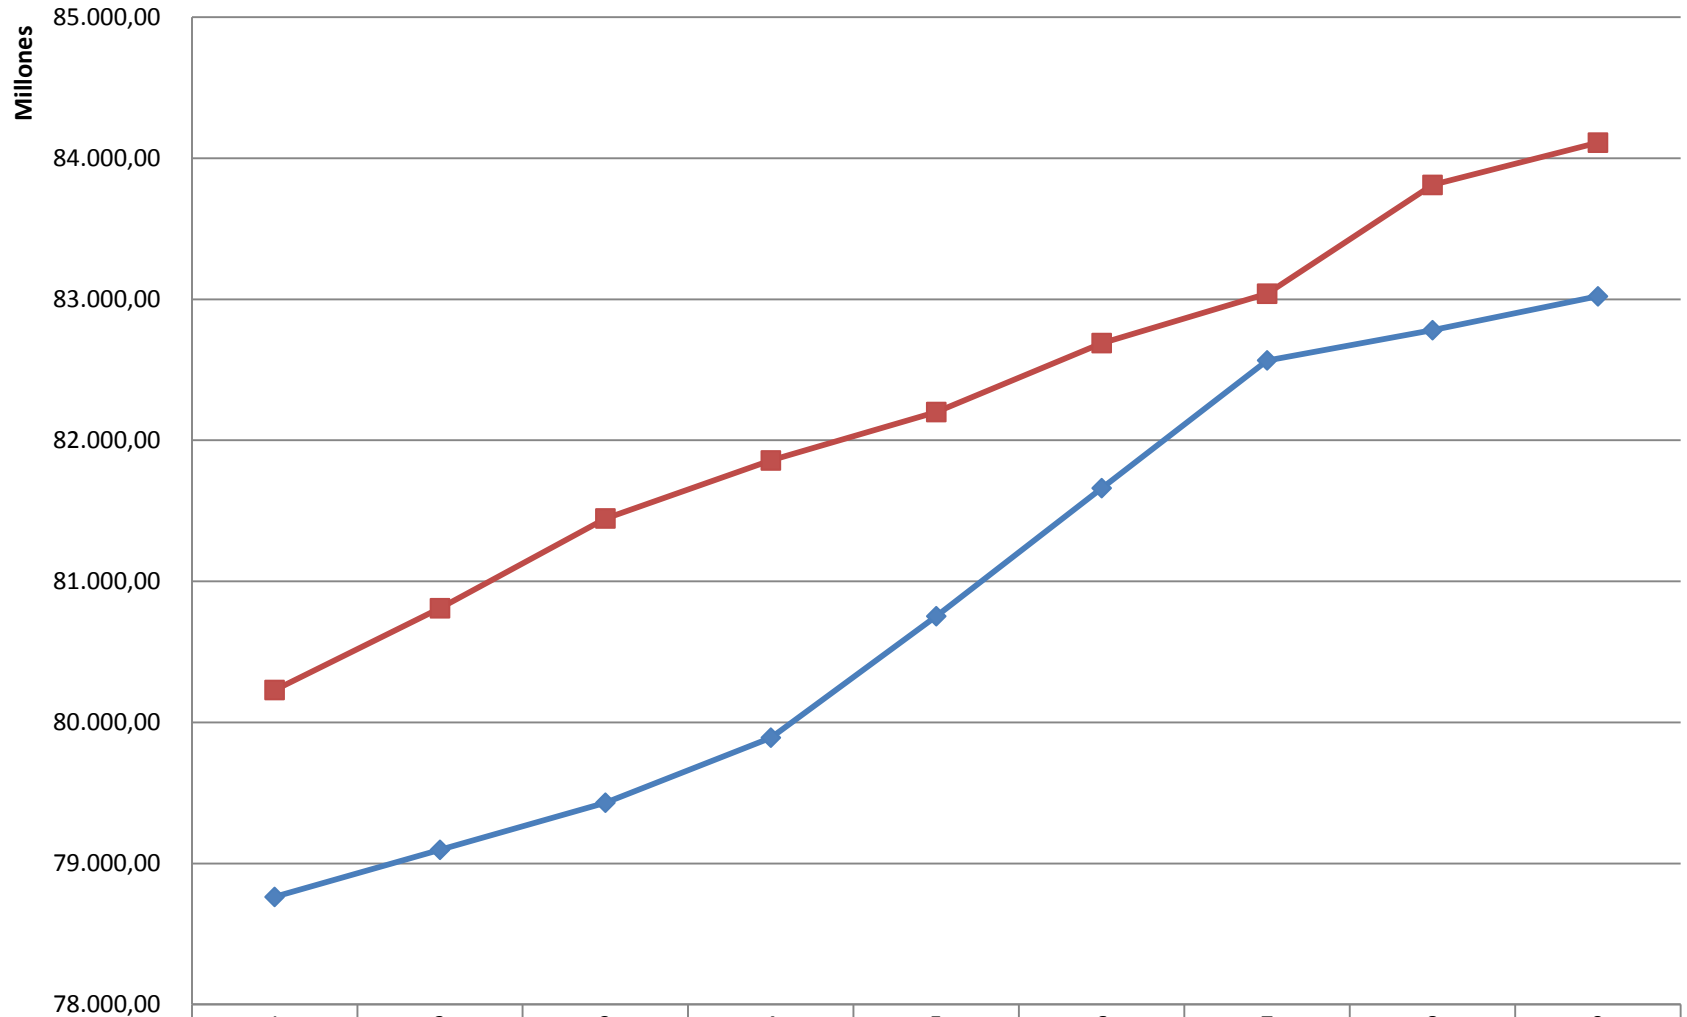


|               |             |             |             |             |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMADO    | 78.762.315. | 79.096.409. | 79.430.503. | 79.891.647. | 80.752.763.2 | 81.660.934.3 | 82.566.752.7 | 82.780.855.2 | 83.020.806.2 |
| EJECUTADO     | 80.229.570. | 80.809.289. | 81.445.974. | 81.857.096. | 82.200.462.  | 82.689.462.  | 83.039.462.  | 83.810.621.  | 84.110.621.  |
| PROG. MENSUAL | 334.094.040 | 334.094.040 | 334.094.040 | 461.143.890 | 861.115.630  | 908.171.120  | 905.818.350  | 214.102.520  | 239.950.980  |
| EJEC. MENSUAL | 601.349.374 | 579.718.408 | 636.684.967 | 411.122.515 | 343.365.288  | 489.000.000  | 350.000.000  | 771.159.096  | 300.000.000  |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE CIMITARRA – LANDAZURI



# VIA: POPAYAN – TOTORO- GABRIEL LOPEZ – INZA - PUERTO VALENCIA – LA PLATA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR FASE 1

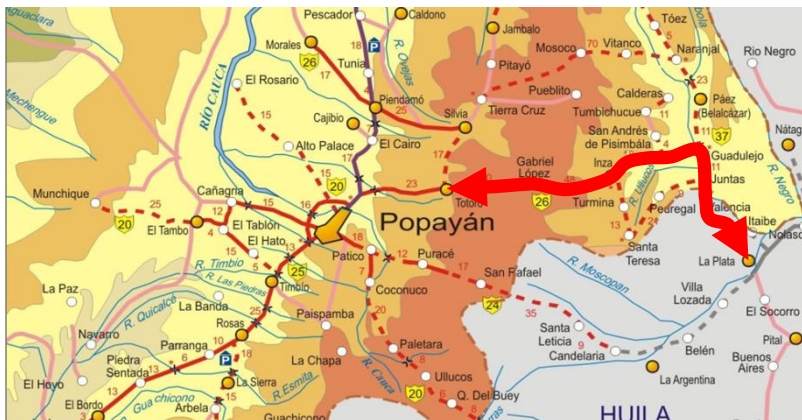

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>           | <b>No. 852 de 2009</b>                                                             |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | CONSORCIO VIAL LIBERTADOR                                                          |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>                | CASS CONSTRUCTORES Y CIA S.C.A. 30%<br>SONACOL S.A. 30%<br>LUIS HECTOR SOLARTE 40% |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>        | CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE                                                     |
| <b>VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:</b> | <b>\$ 194.351.226.194,00</b>                                                       |
| <b>VIGENCIA 2013</b>               | \$ 28.550.000.000,00                                                               |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>             | 60 MESES                                                                           |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>            | 09 de Septiembre de 2009                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>       | 09 de Septiembre de 2014                                                           |


| VALOR CONTRATO: | \$ 194.351.226.194        | Metas totales del proyecto: |          |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
|                 |                           | Km<br>pavimentados          | puentes  |
| VIGENCIA 2009   | \$ 12.211.158.443         | 1                           |          |
| VIGENCIA 2010   | \$ 27.224.959.742         | 6                           |          |
| VIGENCIA 2011   | \$ 41.593.918.626         | 10                          |          |
| VIGENCIA 2012   | \$ 50.718.189.383         | 10                          | 1        |
| VIGENCIA 2013   | \$ 28.550.000.000         | 13                          | 1        |
| VIGENCIA 2014   | \$ 34.053.000.000         | 10                          | 1        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 194.351.226.194</b> | <b>50,0</b>                 | <b>3</b> |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1316-2009</b>             |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | CONSORCIO INTERVIALES ARTERIALES |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO    |
| <b>VALOR ACTUALIZADO:</b>         | \$8.280.752.912.00               |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 61 MESES                         |


| ITEM                        | TOTAL        |
|-----------------------------|--------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00       |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>28,00</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>22.00</b> |

# TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR CORDOBA – INZA – PUERTO VALENCIA

## LONGITUD CORREDOR 96 Km

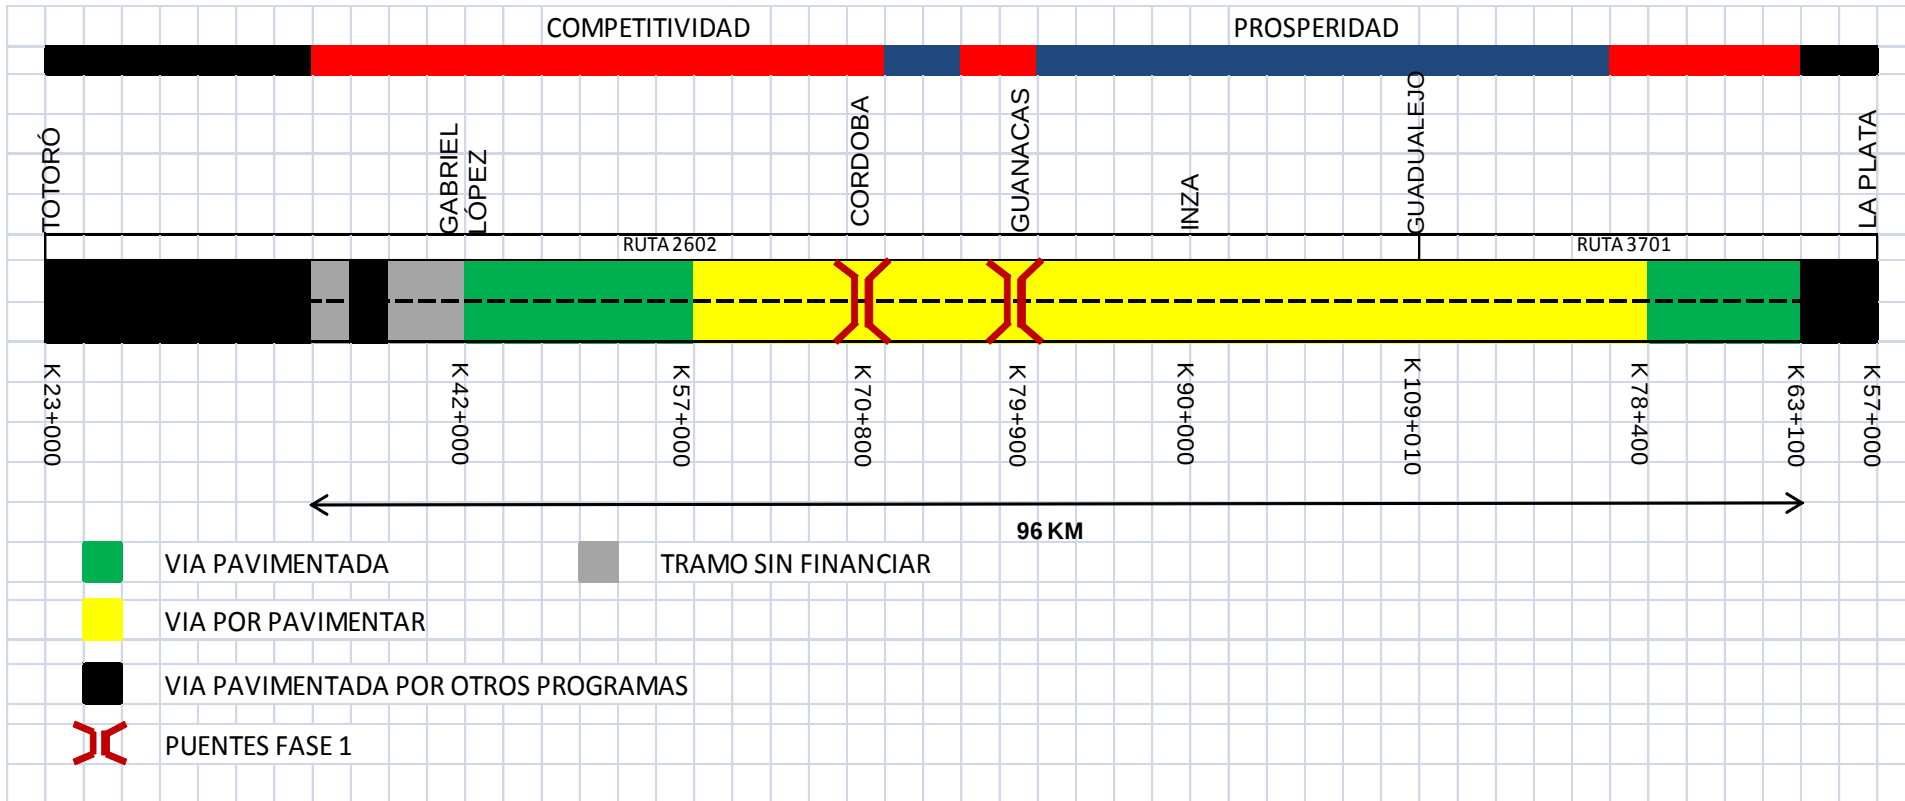

TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR

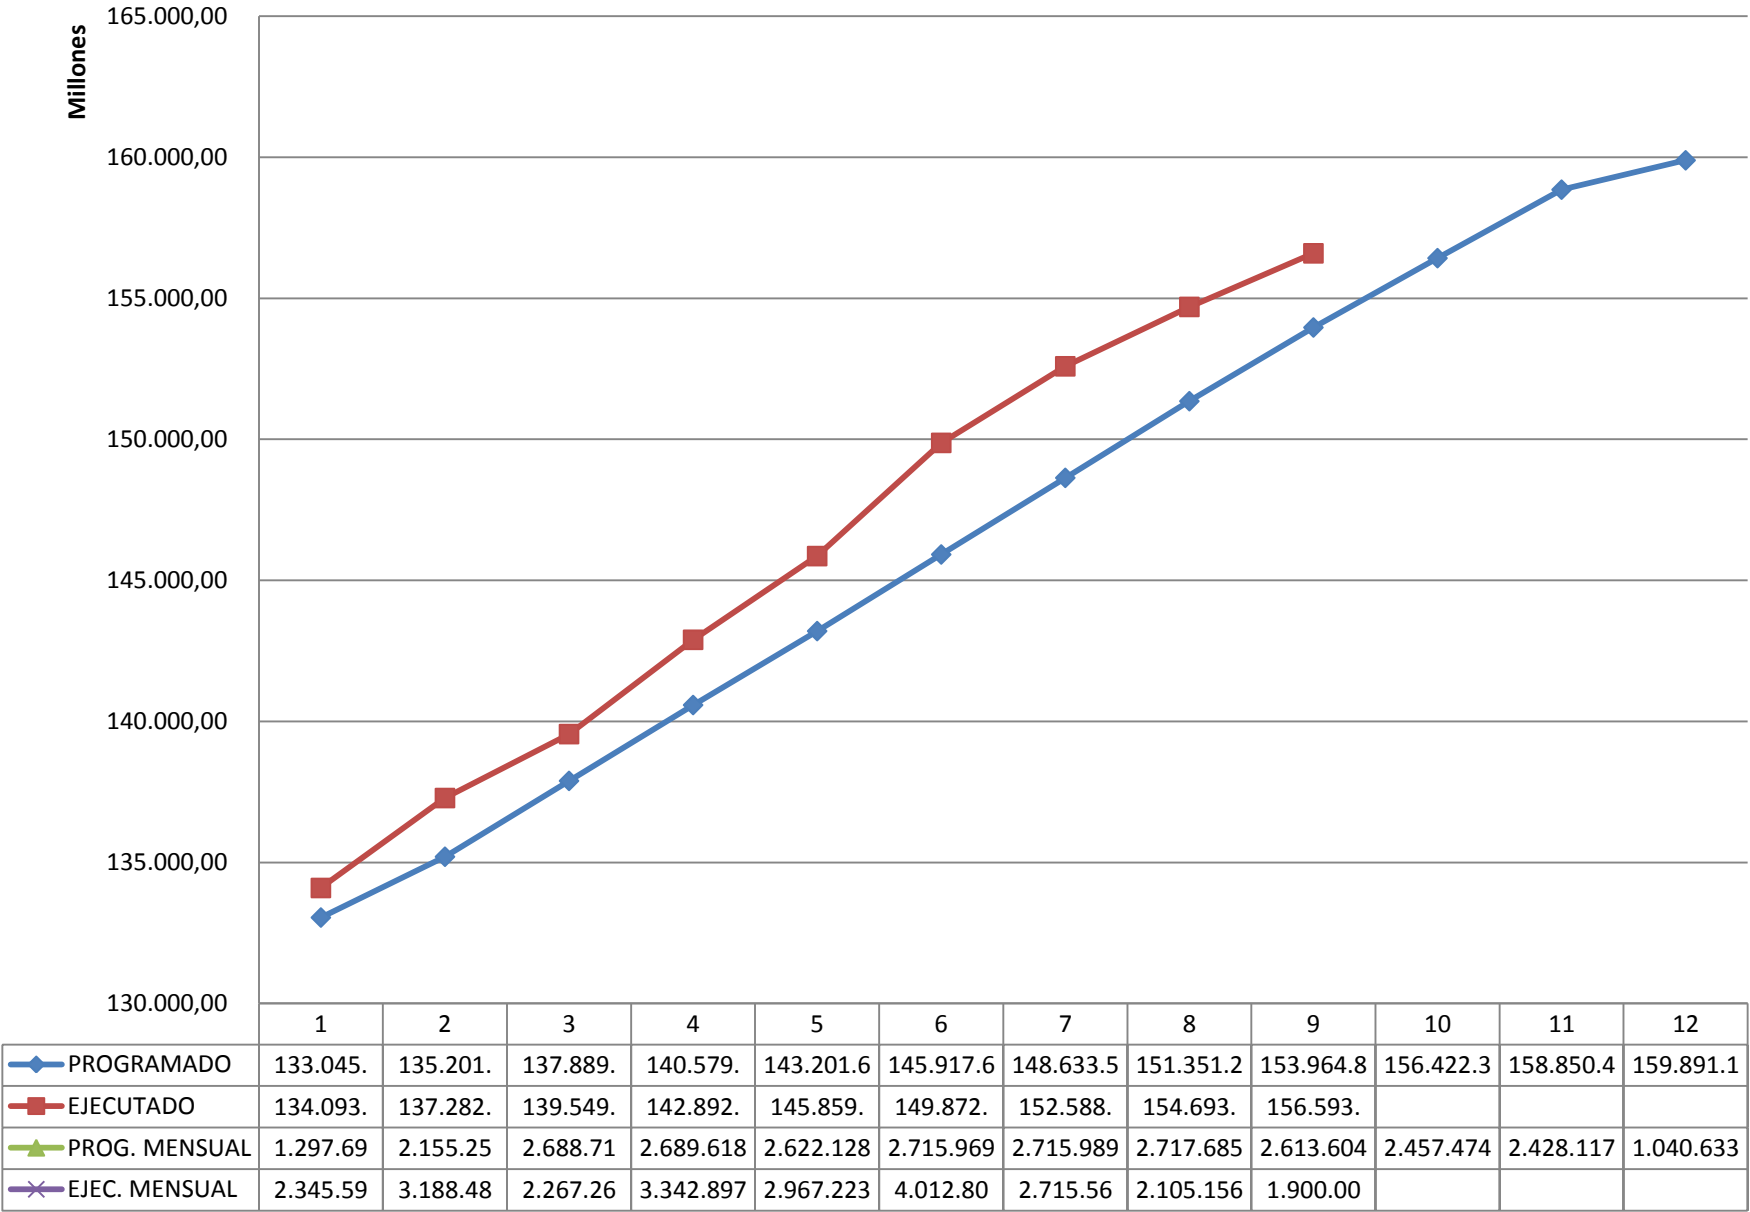

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR CORDOBA – INZA – PUERTO VALENCIA



## MARGINAL DE LA SELVA FASE 1



|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato:</b>            | 850 de 2009                                                            |
| <b>Contratista:</b>         | Consorcio Metrocorredores 3                                            |
| <b>Integrantes:</b>         | Luis Héctor Solarte Solarte<br>CASS Constructores & CIA y Sonacol S.A. |
| <b>Representante Legal:</b> | PAOLA FERNANDA SOLARTE ENRIQUEZ                                        |
| <b>Valor total:</b>         | \$ 140.998.417.615                                                     |
| <b>Plazo:</b>               | (54) meses                                                             |
| <b>Fecha Iniciación:</b>    | 23 de Septiembre de 2009                                               |
| <b>Fecha terminación:</b>   | 22 de Marzo de 2014                                                    |

| VALOR CONTRATO: | \$140.998.417.615        | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                          | Km pavimentados             | puentes |
| VIGENCIA 2009   | 12.466.449.586           | 4                           |         |
| VIGENCIA 2010   | 21.412.748.622           | 20                          |         |
| VIGENCIA 2011   | 33.274992.627            | 15                          |         |
| VIGENCIA 2012   | 48.845.422.230           | 30                          |         |
| VIGENCIA 2013   | 24.998.804.550           | 7                           |         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$140.998.417.615</b> | <b>76</b>                   |         |


|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato:</b>            | 1569 de 2009                                                                                     |
| <b>Contratista:</b>         | CONSORCIO SELVA Y SUR                                                                            |
| <b>Integrantes:</b>         | TNM LIMITED, Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia (TNMC LTDA) y Cáceres Bolaños y Cía. Ltda. |
| <b>Representante Legal:</b> | JUAN MANUEL ESCALLON                                                                             |
| <b>Valor total</b>          | \$11.769.019.376 (Incluido IVA y ajustes)                                                        |
| <b>Plazo:</b>               | Cuarenta y nueve (49) meses                                                                      |
| <b>Fecha Iniciación:</b>    | 23 de Septiembre de 2009                                                                         |
| <b>Fecha terminación:</b>   | 22 de Octubre de 2013                                                                            |

| AVANCE DEL CONTRATO               |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | TOTAL     |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):           | 100,00    |
| <b>KM PAVIMENTADOS</b>            | <b>70</b> |
| <b>KM MANTENIMIENTO PERIODICO</b> | <b>40</b> |


# “MARGINAL DE LA SELVA”

## SAN JOSE DEL FRAGUA - FLORENCIA – K25+000.

### LONGITUD DEL CORREDOR 154Km

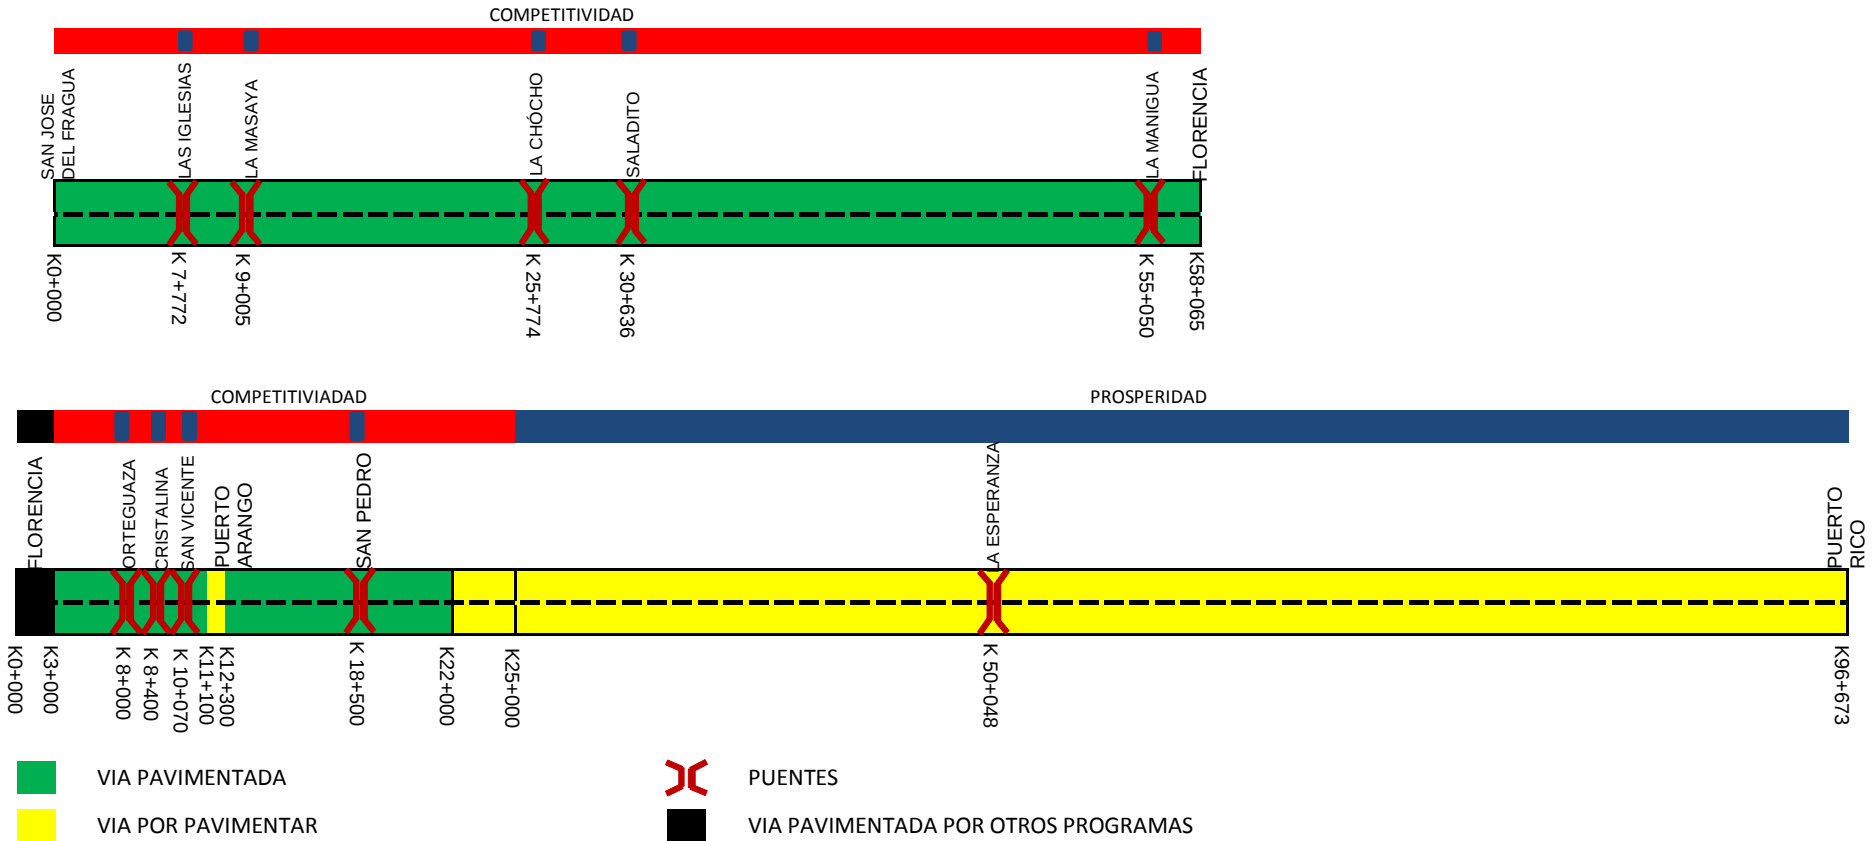

# MARGINAL DE LA SELVA

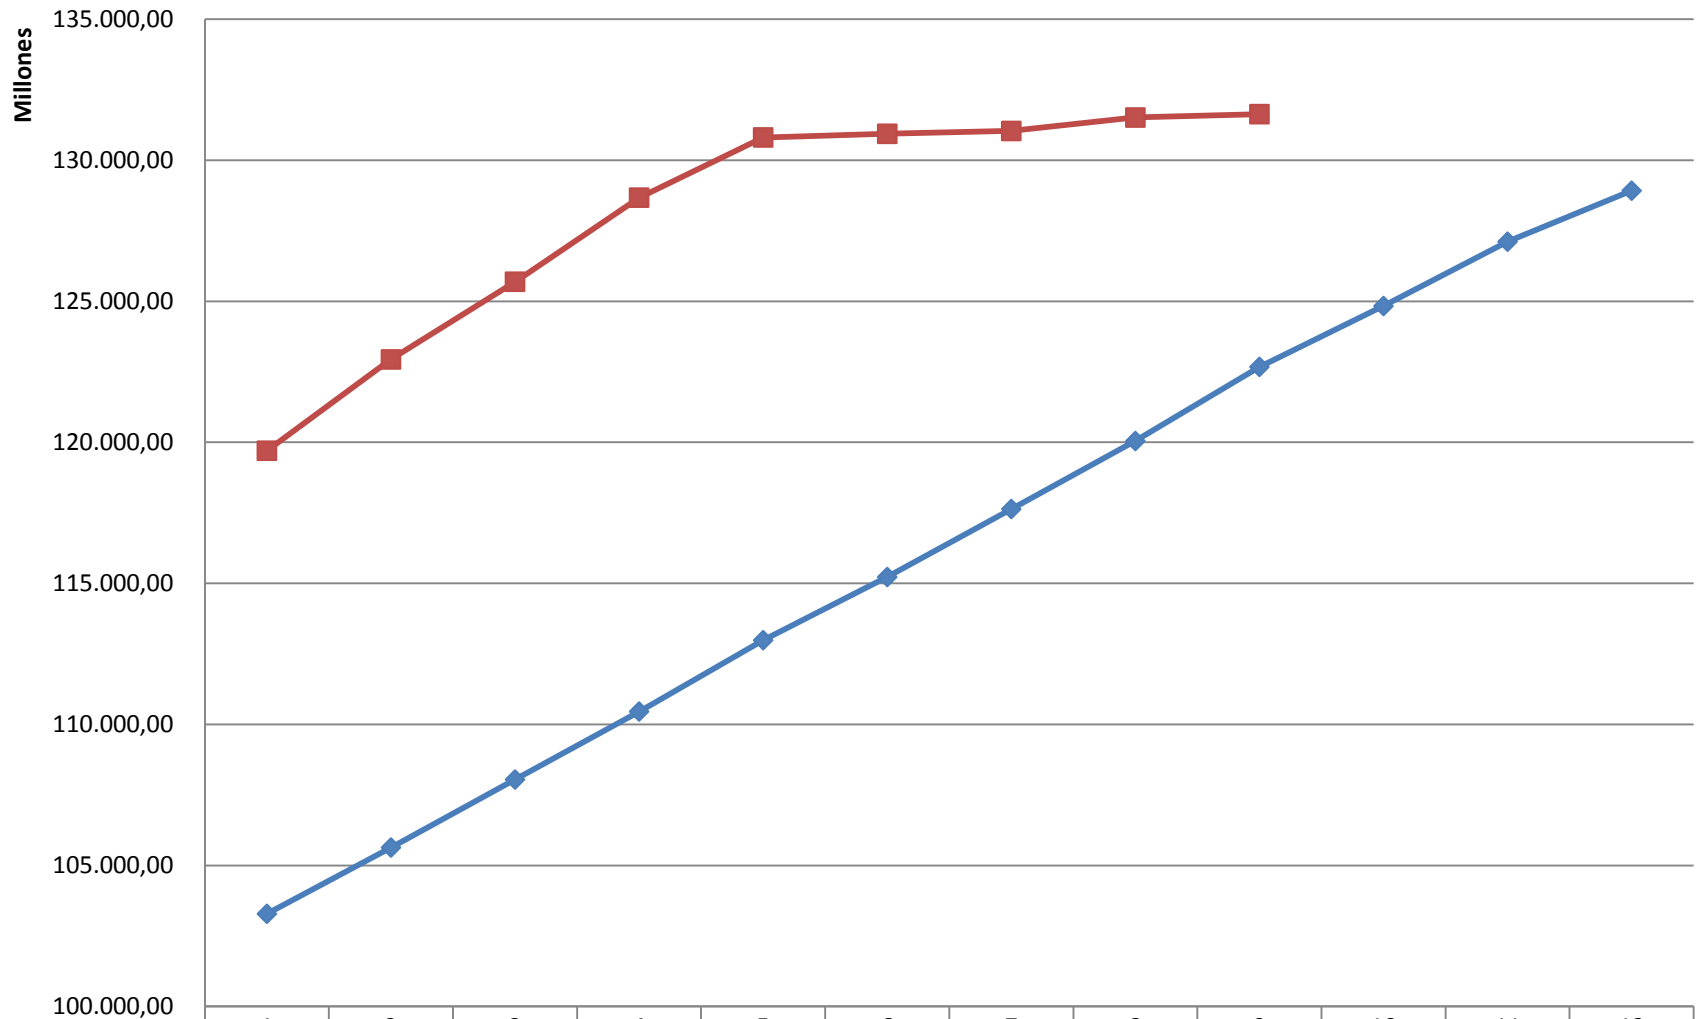

|               | 1        | 2        | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROYECTADO    | 103.284. | 105.635. | 108.045.  | 110.456.  | 112.984.6 | 115.224.4 | 117.635.0 | 120.045.6 | 122.674.2 | 124.831.6 | 127.112.0 | 128.919.9 |
| EJECUTADO     | 119.701. | 122.937. | 125.692.  | 128.674.  | 130.807.  | 130.937.  | 131.037.6 | 131.514.0 | 131.633.8 |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 2.458.41 | 2.350.58 | 2.410.40  | 2.410.536 | 2.528.647 | 2.239.776 | 2.410.587 | 2.410.587 | 2.628.647 | 2.157.383 | 2.280.375 | 1.807.943 |
| EJE. MENSUAL  | 3.236.40 | 2.754.77 | 2.982.186 | 2.132.945 | 130.000.  | 100.000.0 | 476.406.  | 119.788.  |           |           |           |           |

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE MARGINAL DE LA SELVA SAN JOSÉ DEL FRAGUA –  
FLORENCIA – PUERTO RICO**

**Ruta 6502 K 33+000**



**ANTES**



**ACTUALMENTE**

## CORREDOR DEL SUR FASE 1



| VALOR CONTRATO: | \$ 304.194.622.255 | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                    | Km pavimentados             | puentes |
| VIGENCIA 2009   | \$26.895.531.493   | 0                           | 0       |
| VIGENCIA 2010   | \$ 46.196.533.524  | 12                          | 0       |
| VIGENCIA 2011   | \$63.568.315.392   | 20                          | 1       |
| VIGENCIA 2012   | \$92.004.449.715   | 21                          | 6       |
| VIGENCIA 2013   | \$39.529.792.131   | 15                          | 3       |
| VIGENCIA 2014   | \$ 36.000.000.000  | 10                          |         |
| TOTAL           | \$ 304.194.622.255 | 78                          | 10      |

| ITEM                        | TOTAL     |
|-----------------------------|-----------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00    |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>53</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>25</b> |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un)    | 7         |


|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:     | No. 850 de 2009                                                                                                           |
| CONTRATISTA:          | CONSORCIO METROCORREDORES 8                                                                                               |
| COMPOSICIÓN:          | CASS Constructores y CIA S.C.A.<br>Solarte Nacional de Construcciones S.A.<br>SONACOL S.A.<br>Luis Héctor Solarte Solarte |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS                                                                                             |
| VALOR CONTRATO:       | \$ 304.194.622.255                                                                                                        |
| VIGENCIA 2013         | \$ 31.000.000.000,00                                                                                                      |
| PLAZO EN MESES:       | 48 MESES                                                                                                                  |
| ORDEN DE INICIO:      | 03 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 22 de marzo de 2014                                                                                                       |

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato:            | 1569 de 2009                                                                                     |
| Contratista:         | CONSORCIO SELVA Y SUR                                                                            |
| Integrantes:         | TNM LIMITED, Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia (TNMC LTDA) y Cáceres Bolaños y Cía. Ltda. |
| Representante Legal: | JUAN MANUEL ESCALLON                                                                             |
| Valor total          | \$11.769.019.376 (Incluido IVA y ajustes)                                                        |
| Plazo:               | Cuarenta y nueve (49) meses                                                                      |
| Fecha Iniciación:    | 23 de Septiembre de 2009                                                                         |
| Fecha terminación:   | 22 de abril de 2014                                                                              |


# ALCANCE DE INTERVENCION

## CORREDOR DEL SUR: SAN MIGUEL – SANTA ANA

LONGITUD CORREDOR 101 Km

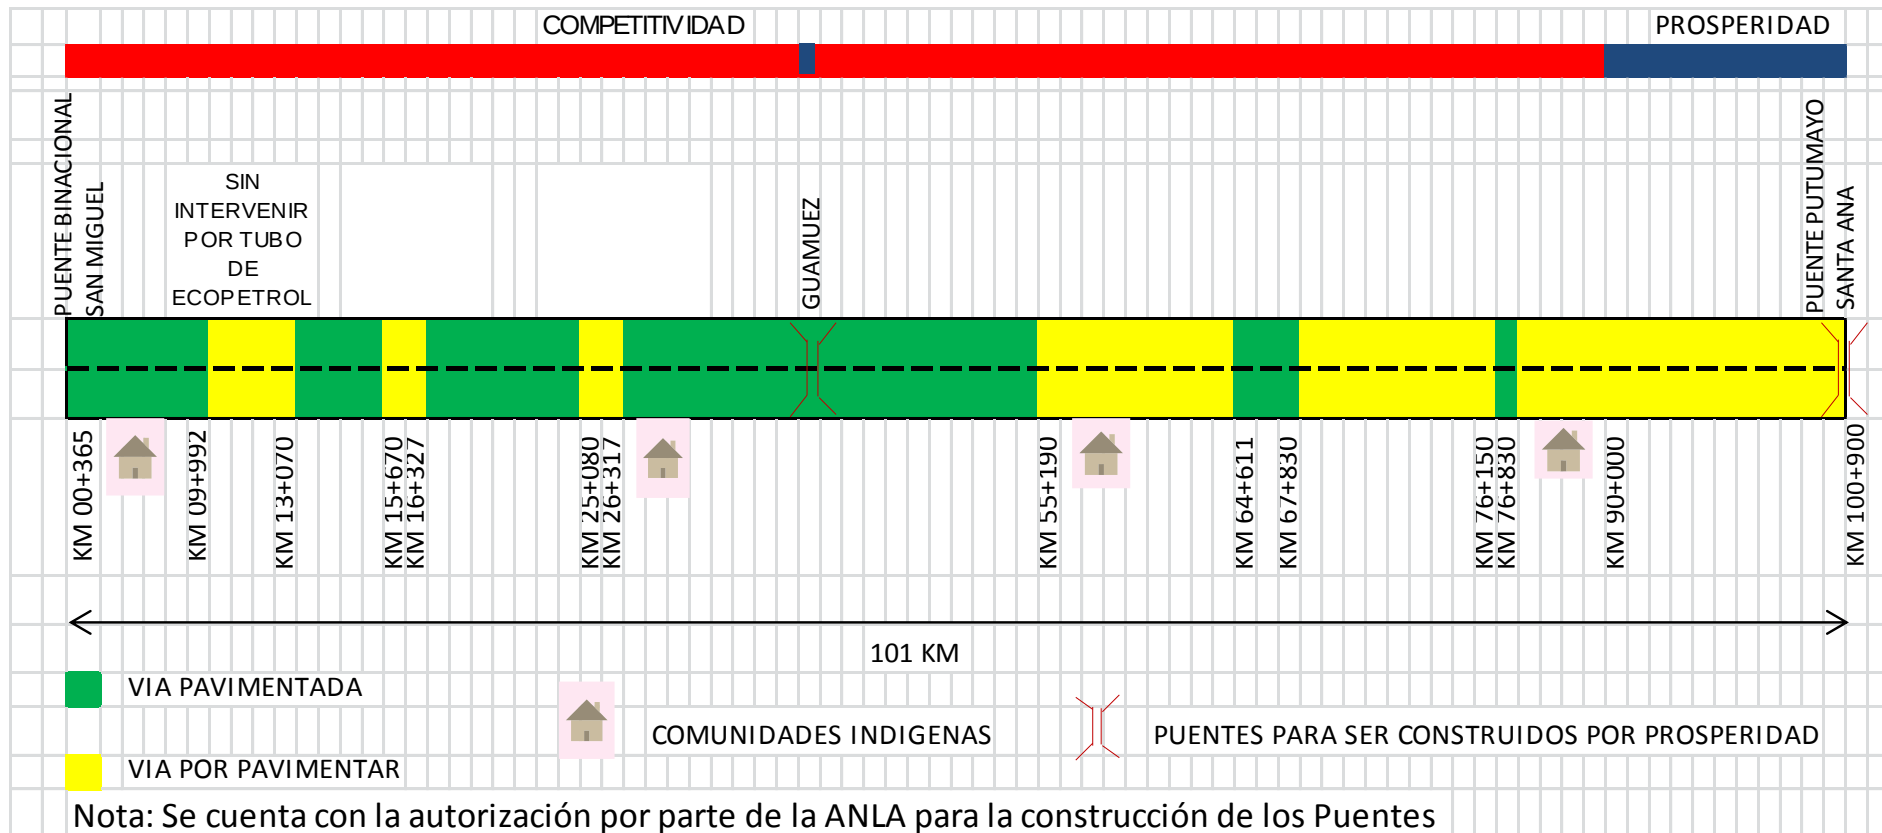

## CORREDOR DEL SUR

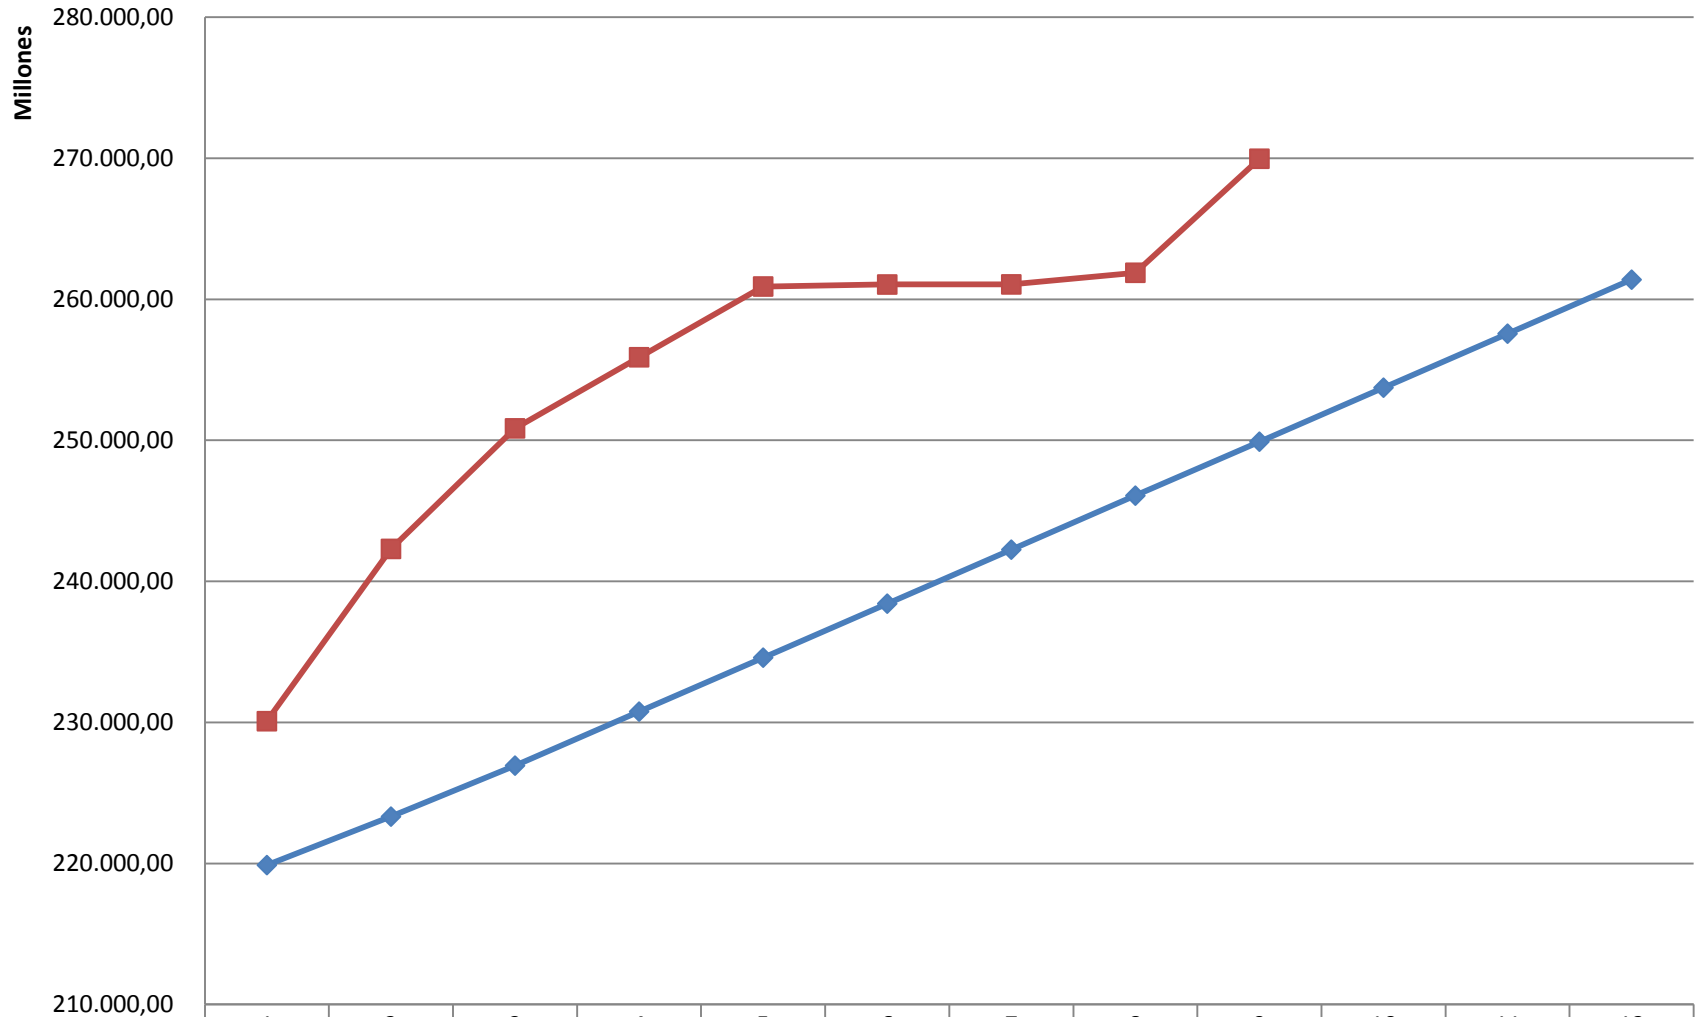

|               |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROYECTADO    | 219.882. | 223.318. | 226.933. | 230.762.  | 234.590.  | 238.418.  | 242.246.  | 246.075.  | 249.903.  | 253.731.  | 257.559.  | 261.388.  |
| EJECUTADO     | 230.084. | 242.300. | 250.847. | 255.888.  | 260.904.  | 261.047.  | 261.053.  | 261.878.  | 269.963.  |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 3.400.30 | 3.436.07 | 3.615.67 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 | 3.828.273 |
| EJEC. MENSUAL | 3.330.78 | 12.215.8 | 8.546.60 | 5.041.92  | 5.015.558 | 142.711.1 | 6.486.86  | 825.225.  | 8.084.19  |           |           |           |

## REGISTRO FOTOGRAFICO CORREDOR DEL SUR FASE SAN MIGUEL – SANTA ANA 1



## TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 1



|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>     | <b>No. 851 de 2009</b>                                                                                                    |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CONSORCIO METROCORREDORES 8                                                                                               |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | CASS Constructores y CIA S.C.A.<br>Solarte Nacional de Construcciones S.A.<br>SONACOL S.A.<br>Luis Héctor Solarte Solarte |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS                                                                                             |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | \$ 115.751.834.618,00                                                                                                     |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>       | 48 MESES                                                                                                                  |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 03 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 01 de Septiembre de 2013                                                                                                  |


| VALOR CONTRATO:      | \$115.751.834.618    | Metas totales del proyecto: |         |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                      | Km pavimentados             | puentes |
| <b>VIGENCIA 2009</b> | \$ 11.804.053.195,00 | 2                           |         |
| <b>VIGENCIA 2010</b> | \$ 25.056.938.781,00 | 4                           |         |
| <b>VIGENCIA 2011</b> | \$ 17.604.345.269,00 | 5                           | 2       |
| <b>VIGENCIA 2012</b> | \$ 29.794.510.450,00 | 8                           | 2       |
| <b>VIGENCIA 2013</b> | \$ 31.491.986.923,00 | 7                           | 2       |
| <b>TOTAL</b>         | \$ 115.751.834.618   | 26                          | 6       |

| ITEM                        | TOTAL        |
|-----------------------------|--------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00       |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>21,55</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>5.0</b>   |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un)    | 4            |


|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1139-2009</b>                                      |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO<br>"DIEGO LUIS CORDOBA" |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA                               |
| <b>VALOR ADJUDICADO:</b>          | \$7.256.960.393.00                                        |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 48 MESES                                                  |

# TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDO QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR

## LONGITUD CORREDOR 127 Km

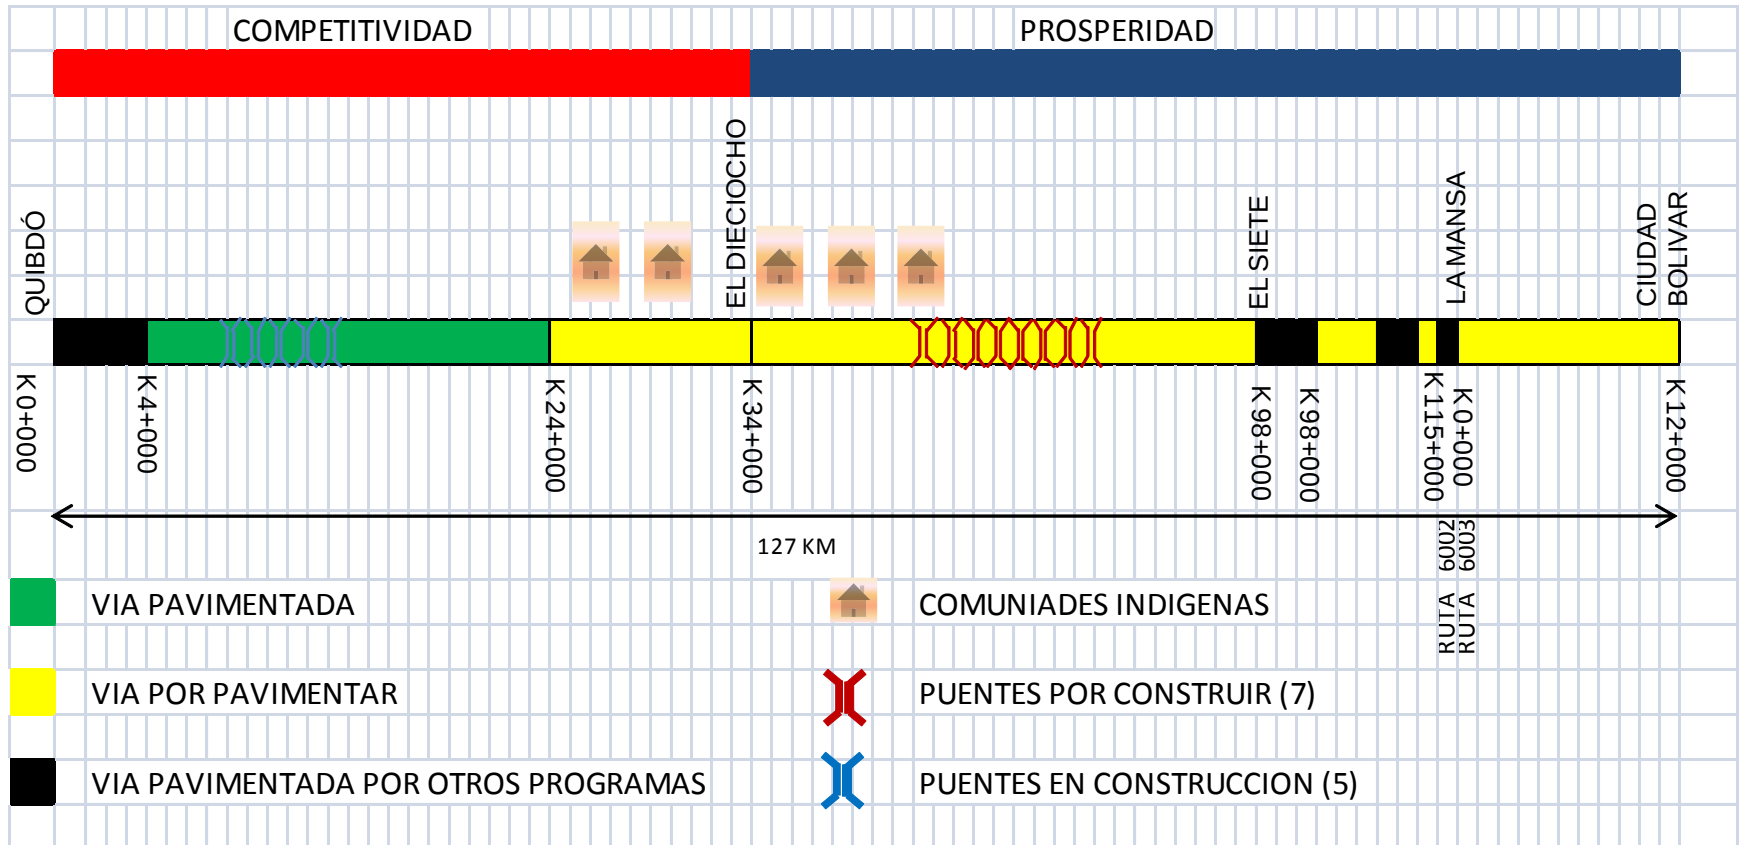

MEDELLÍN - QUIBDÓ

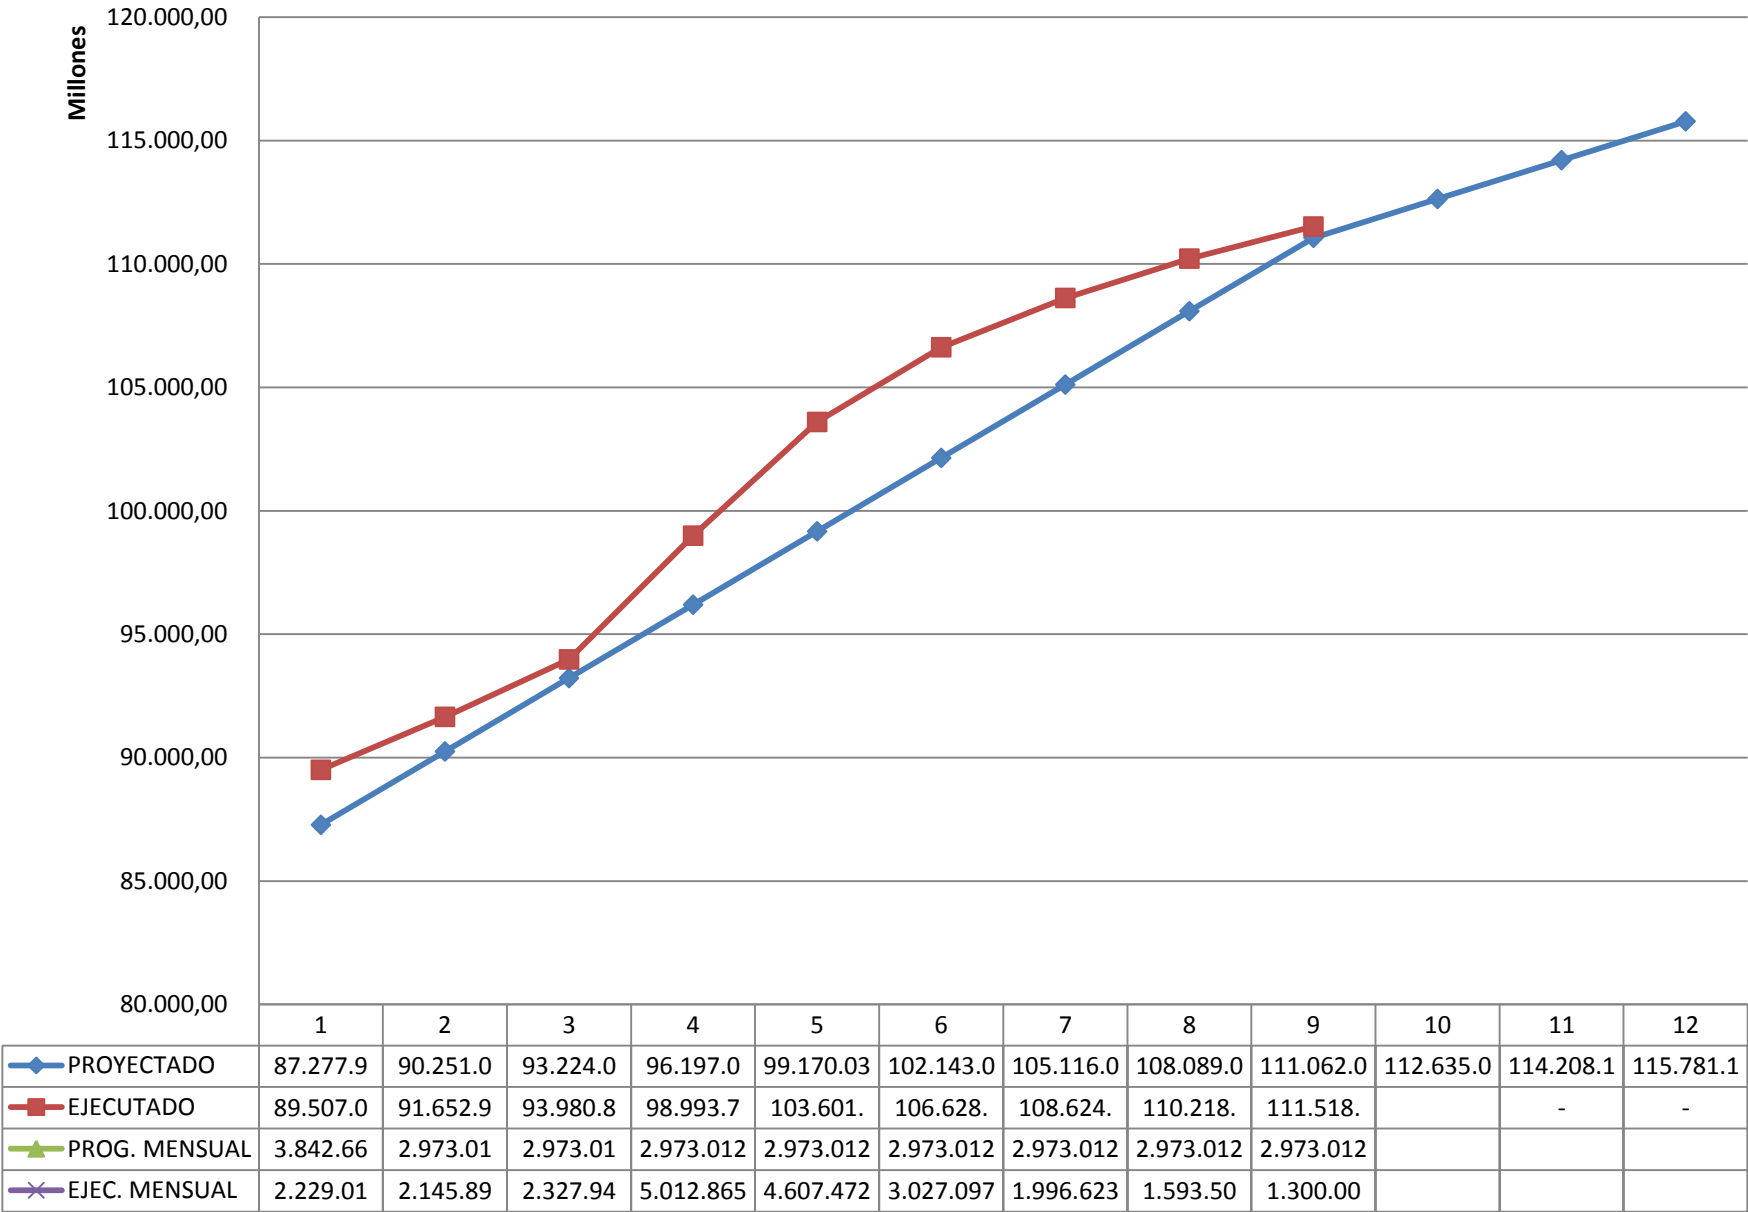

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR



## TRANSVERSAL DE BOYACA



| VALOR CONTRATO: | \$ 125.521.056.860 | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                    | Km pavimentados             | puentes |
| VIGENCIA 2009   | \$ 10.985.655.832  | 0                           |         |
| VIGENCIA 2010   | \$26.078.875.205   | 5                           |         |
| VIGENCIA 2011   | \$21.840.000.000   | 9                           |         |
| VIGENCIA 2012   | \$28.291.431.136   | 4                           |         |
| VIGENCIA 2013   | \$33.669.475.403   | 11                          | 2       |
| TOTAL           | \$ 125.521.056.860 | 26                          | 2       |

| ITEM                        | TOTAL     |
|-----------------------------|-----------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00    |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>18</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>9</b>  |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un)    | 0         |


|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:     | No. 780 de 2009                                                                                                    |
| CONTRATISTA:          | UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA                                                                               |
| COMPOSICIÓN:          | ÁLVAREZ Y COLLINS SA, VERGEL Y CASTELLANOS, PROMOTORA MONTECARLO Y CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS SA - CONSTRUCTEC SA |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | ADRIANA CARDENAS                                                                                                   |
| VALOR CONTRATO:       | \$ 125.521.056.860,00                                                                                              |
| VIGENCIA 2013         | \$ 33.669.475.403                                                                                                  |
| PLAZO EN MESES:       | 48 MESES                                                                                                           |
| ORDEN DE INICIO:      | 07 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 07 de Septiembre de 2013                                                                                           |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1323-2009                 |
| INTERVENTOR:               | CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 2009 |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | ARGELINO DURAN                |
| VALOR ADJUDICADO:          | \$5.870.309.138,00            |
| PLAZO EN MESES:            | 48 MESES                      |


# TRANSVERSAL DE BOYACA

CHIQUINQUIRA – PUERTO BOYACA

LONGITUD DEL CORREDEOR 170 Km

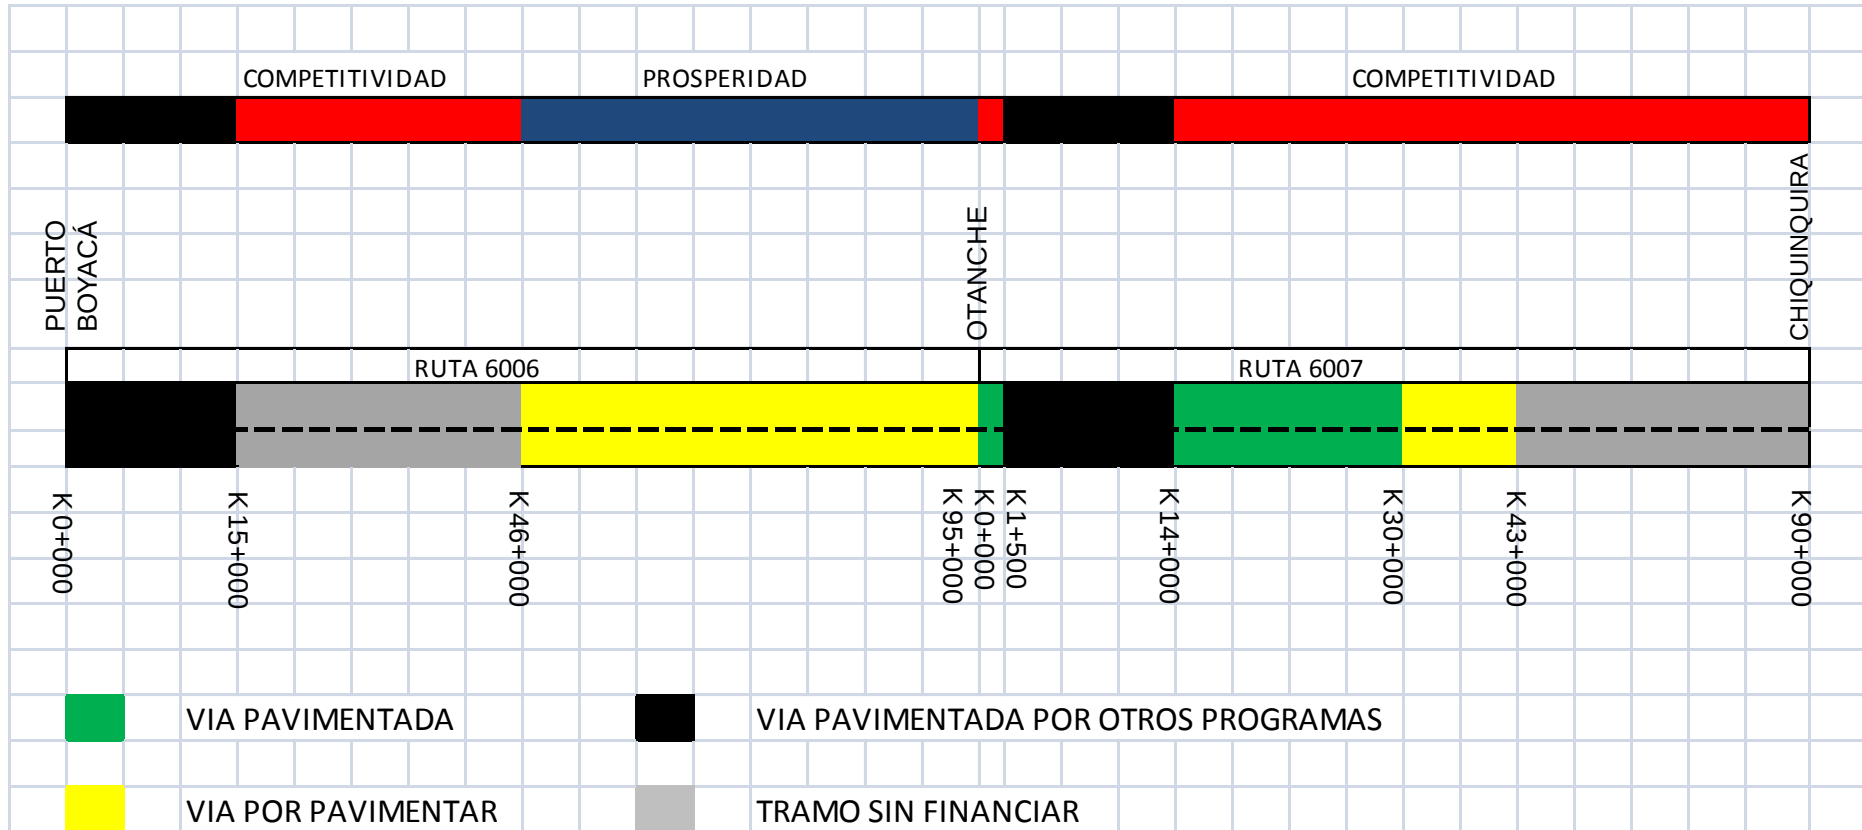

# TRANSVERSAL DE BOYACÁ

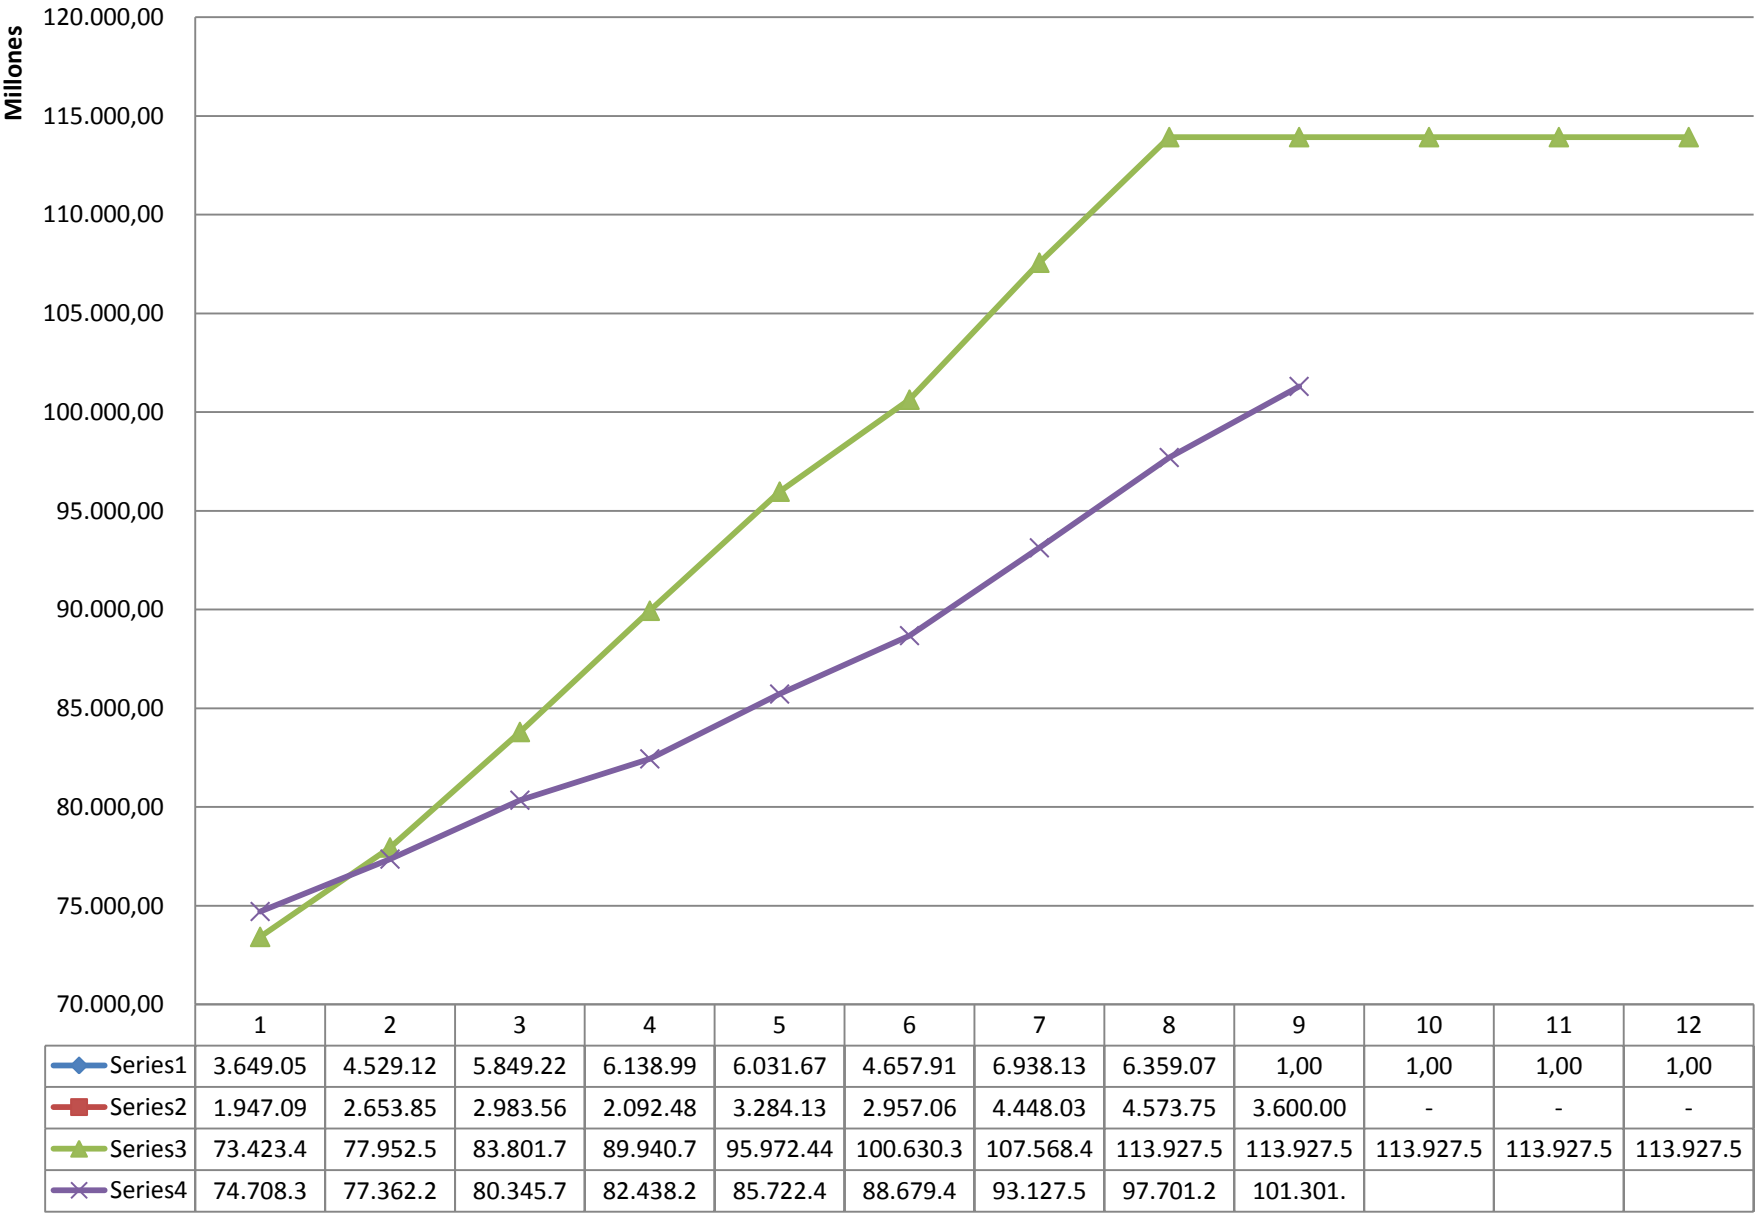

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL BOYACA OTANCHE – PUERTO BOYACÁ



ANTES



ACTUALMENTE



**VIA: HONDA – MANIZALES FASE I (DEPARTAMENTO DE CALDAS)  
“TRANSVERSAL CAFETERA”**



| VALOR CONTRATO: | \$151.358.927.550  | Metas totales del proyecto: |         |               |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------------|
|                 |                    | Km pavimento                | puentes | Doble clazada |
| VIGENCIA 2009   | \$7.863.801.605    | 0                           | 0       | 0             |
| VIGENCIA 2010   | \$ 25.456.864.869  | 4                           | 0       | 0             |
| VIGENCIA 2011   | \$ 22.583.000.000  | 7                           | 0       | 0.5           |
| VIGENCIA 2012   | \$ 58.211.231.474  | 9                           | 0       | 1             |
| VIGENCIA 2013   | \$ 37.244.029.602  | 5                           | 1       | 1             |
| TOTAL           | \$ 151.358.927.550 | 25                          | 1       | 2.5           |

| AVANCE DEL CONTRATO        |        |
|----------------------------|--------|
| ITEM                       | TOTAL  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):    | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS            | 21     |
| KM MANTENIMIENTO PERIODICO | 10     |
| PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS  | 130    |



|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:             | CONSORCIO VIAS DEL CENTRO                       |
| CONTRATO No.:            | 663 de 2009                                     |
| COMPOSICIÓN:             | PROCOPAL S.A. 50%<br>INGENIERIA DE VIAS 50%     |
| VALOR TOTAL:             | \$151.358.927.550,00<br>(incluye IVA y Ajustes) |
| PLAZO TOTAL:             | 50 meses 24 días                                |
| FECHA INICIACION         | 8 de Octubre de 2009                            |
| FECHA FINALIZACION FINAL | 31 de Diciembre de 2013                         |

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:       | CONSORCIO ETSA PEBSA                                        |
| CONTRATO No.       | 1478 DE 2009                                                |
| COMPOSICION:       | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. 50%<br>PAULO EMILIO BRAVO S.A. 50% |
| VALOR TOTAL:       | \$ 7.499.999.996 (incluye IVA y Ajustes)                    |
| PLAZO TOTAL:       | 51 meses 10 días                                            |
| FECHA INICIACION   | 22 de Septiembre de 2009                                    |
| FECHA FINALIZACION | 31 de Diciembre de 2013                                     |


# ALCANCE DE INTERVENCION

## HONDA MANIZALES

LONGITUD DEL CORREDOR 64 KM

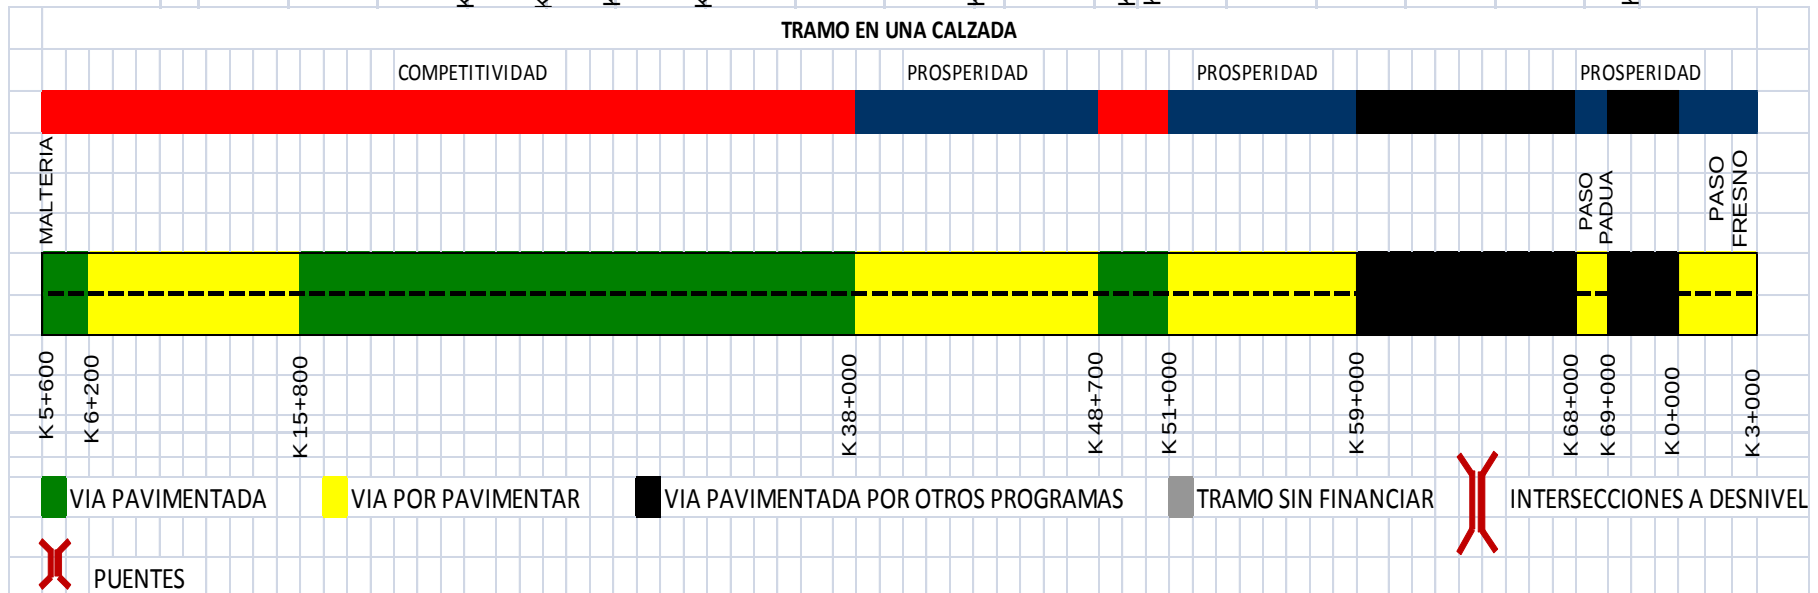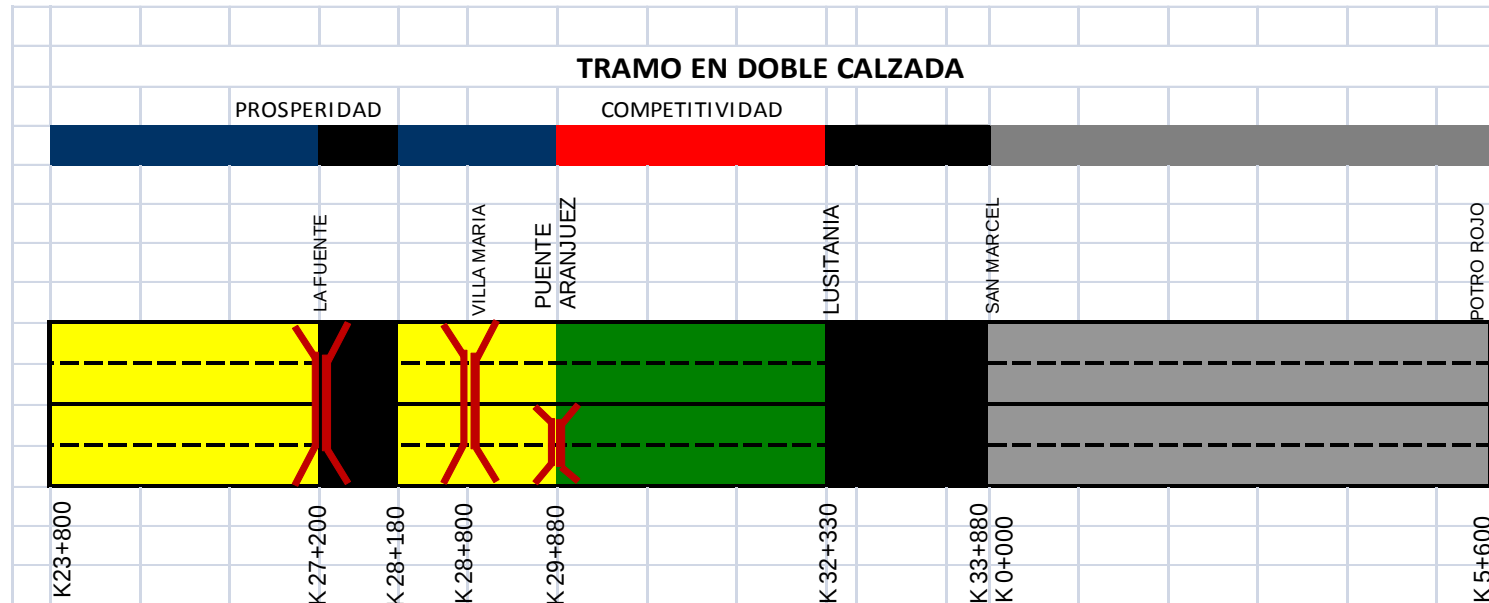

# HONDA - MANIZALES

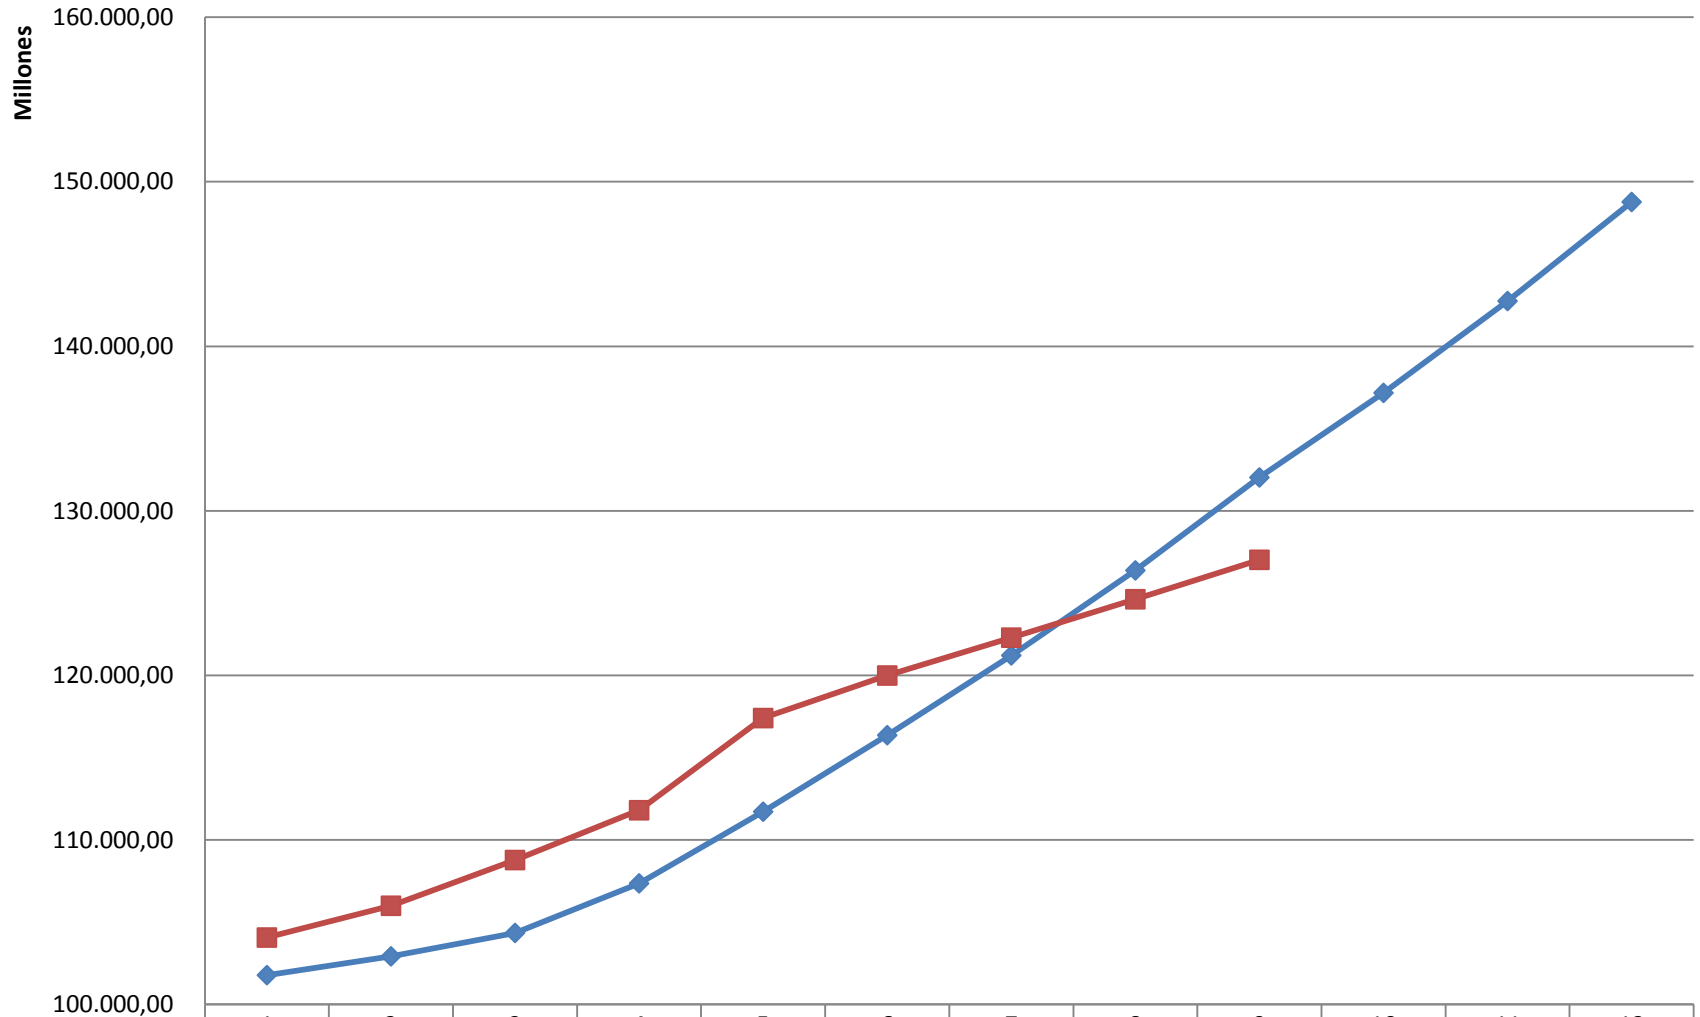

|               | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROYECTADO    | 101.782. | 102.924. | 104.347. | 107.359.  | 111.713.9 | 116.363.2 | 121.213.3 | 126.379.5 | 132.029.5 | 137.167.7 | 142.748.7 | 148.770.3 |
| FACTURADO     | 104.066. | 105.998. | 108.775. | 111.803.  | 117.404.  | 119.991.  | 122.291.  | 124.626.  | 127.022.  |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 1.082.55 | 1.142.55 | 1.422.55 | 3.011.789 | 4.354.904 | 4.649.337 | 4.850.059 | 5.166.242 | 5.649.985 | 5.138.224 | 5.580.969 | 6.021.605 |
| EJEC. MENSUAL | 3.366.84 | 1.932.36 | 2.776.65 | 3.027.787 | 5.601.478 | 2.587.003 | 2.300.00  | 2.334.40  | 2.396.00  |           |           |           |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE CORREDOR HONDA MANIZALES



## TRANSVERSAL DEL CUSIANA - FASE 1



| VALOR CONTRATO: | \$146.408.005.446  | Metas totales del proyecto: |         |               |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------------|
|                 |                    | Km pavimento                | puentes | Doble clazada |
| VIGENCIA 2009   | \$11.913.241.900   | 0                           | 0       |               |
| VIGENCIA 2010   | \$23.547.106.421   | 11                          | 1       |               |
| VIGENCIA 2011   | \$34.857.194.965   | 2                           | 5       |               |
| VIGENCIA 2012   | \$30.500.462.160   | 1.5                         | 3       |               |
| VIGENCIA 2013   | \$ 34.680.000.000, | 5.2                         | 4       |               |
| VIGENCIA 2014   | \$10.910.000.000   | 1.2                         | 1       |               |
| TOTAL           | \$146.408.005.44   | 21.9                        | 14      |               |


| ITEM                        | TOTAL        |
|-----------------------------|--------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00       |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>14,47</b> |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un)    | <b>8</b>     |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:     | No. 807 de 2009                                                                  |
| CONTRATISTA:          | CONSORCIO CC-MP-HV CUSIANA                                                       |
| COMPOSICIÓN:          | CONCRETO S.A. (60%)<br>CONSTRUCTORA MP S.A. (20%)<br>HORACIO VEGA CÁRDENAS (20%) |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | JULIO ALIRIO TORRES                                                              |
| VALOR CONTRATO:       | \$ 146.408.005.446                                                               |
| PLAZO EN MESES:       | 57 MESES                                                                         |
| ORDEN DE INICIO:      | 18 de SEPTIEMBRE de 2009                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 de Junio de 2014                                                              |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1463-2009                   |
| INTERVENTOR:               | CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ      |
| VALOR CONTRATO:            | \$5.920.361.970,35              |
| PLAZO EN MESES:            | 57 MESES                        |


# TRANSVERSAL DEL CUSIANA

LONGITUD CORREDOR 57 Km.

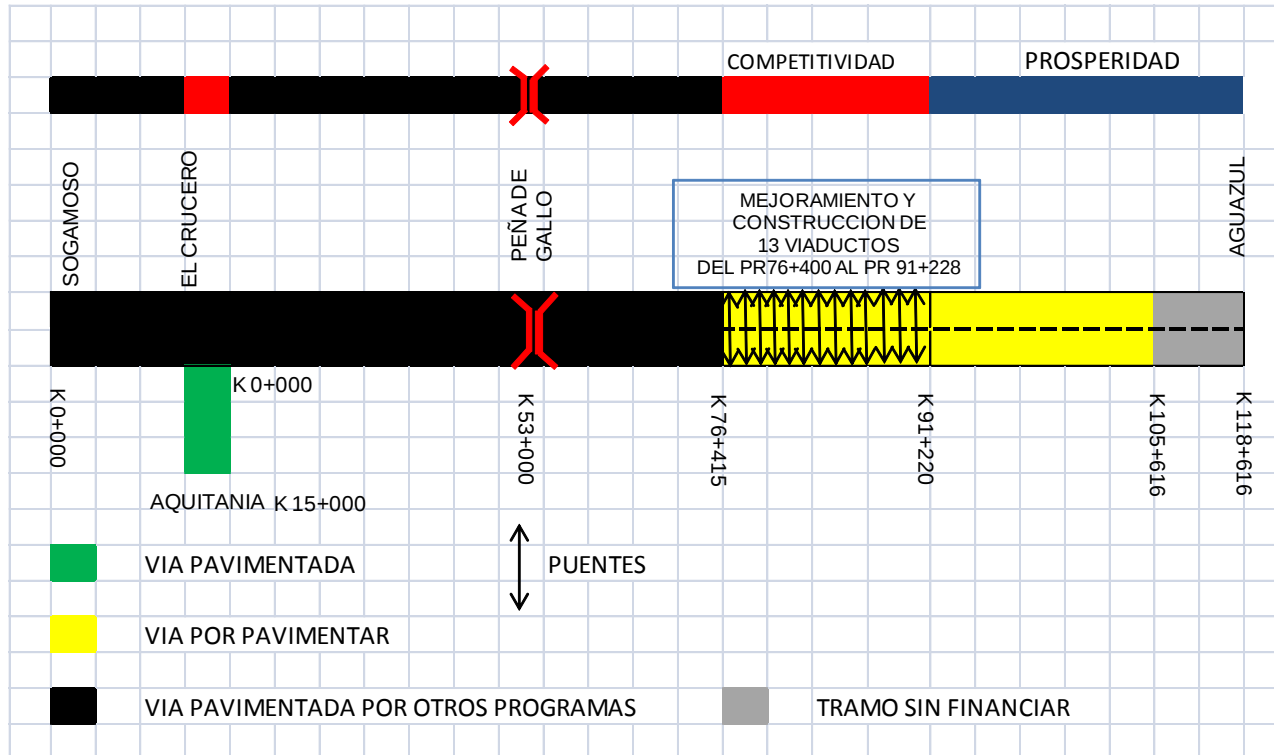

| NOMBRE DEL PUENTE | LONG (mt) | PR     | ESTADO    |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| PEÑA DE GALLO     | 360       | 53+000 | EN CONST. |
| LA CONGUTA        | 89        | 76+415 | TERMINADO |
| LA LEONERA        | 181       | 80+350 | TERMINADO |
| LOS GRILLOS       | 262       | 81+250 | TERMINADO |
| NUEVO 3           | 103       | 81+450 | TERMINADO |
| CHORROBLANCO      | 300       | 81+600 | TERMINADO |
| EL VERBENO        | 43        | 82+560 | TERMINADO |
| LA CHIGUIRERA     | 110       | 85+700 | TERMINADO |
| LA ORQUIDEA I     | 110       | 86+510 | TERMINADO |
| LA ORQUIDEA II    | 92        | 86+740 | TERMINADO |
| LA GRANJA         | 236       | 87+640 | EN CONST. |
| LA CASCADA        | 96        | 89+300 | EN CONST. |
| CUSIANA           | 86        | 90+131 | EN CONST. |
| LA FRONTERA       | 53        | 91+228 | TERMINADO |

## Transversal del Cusiana

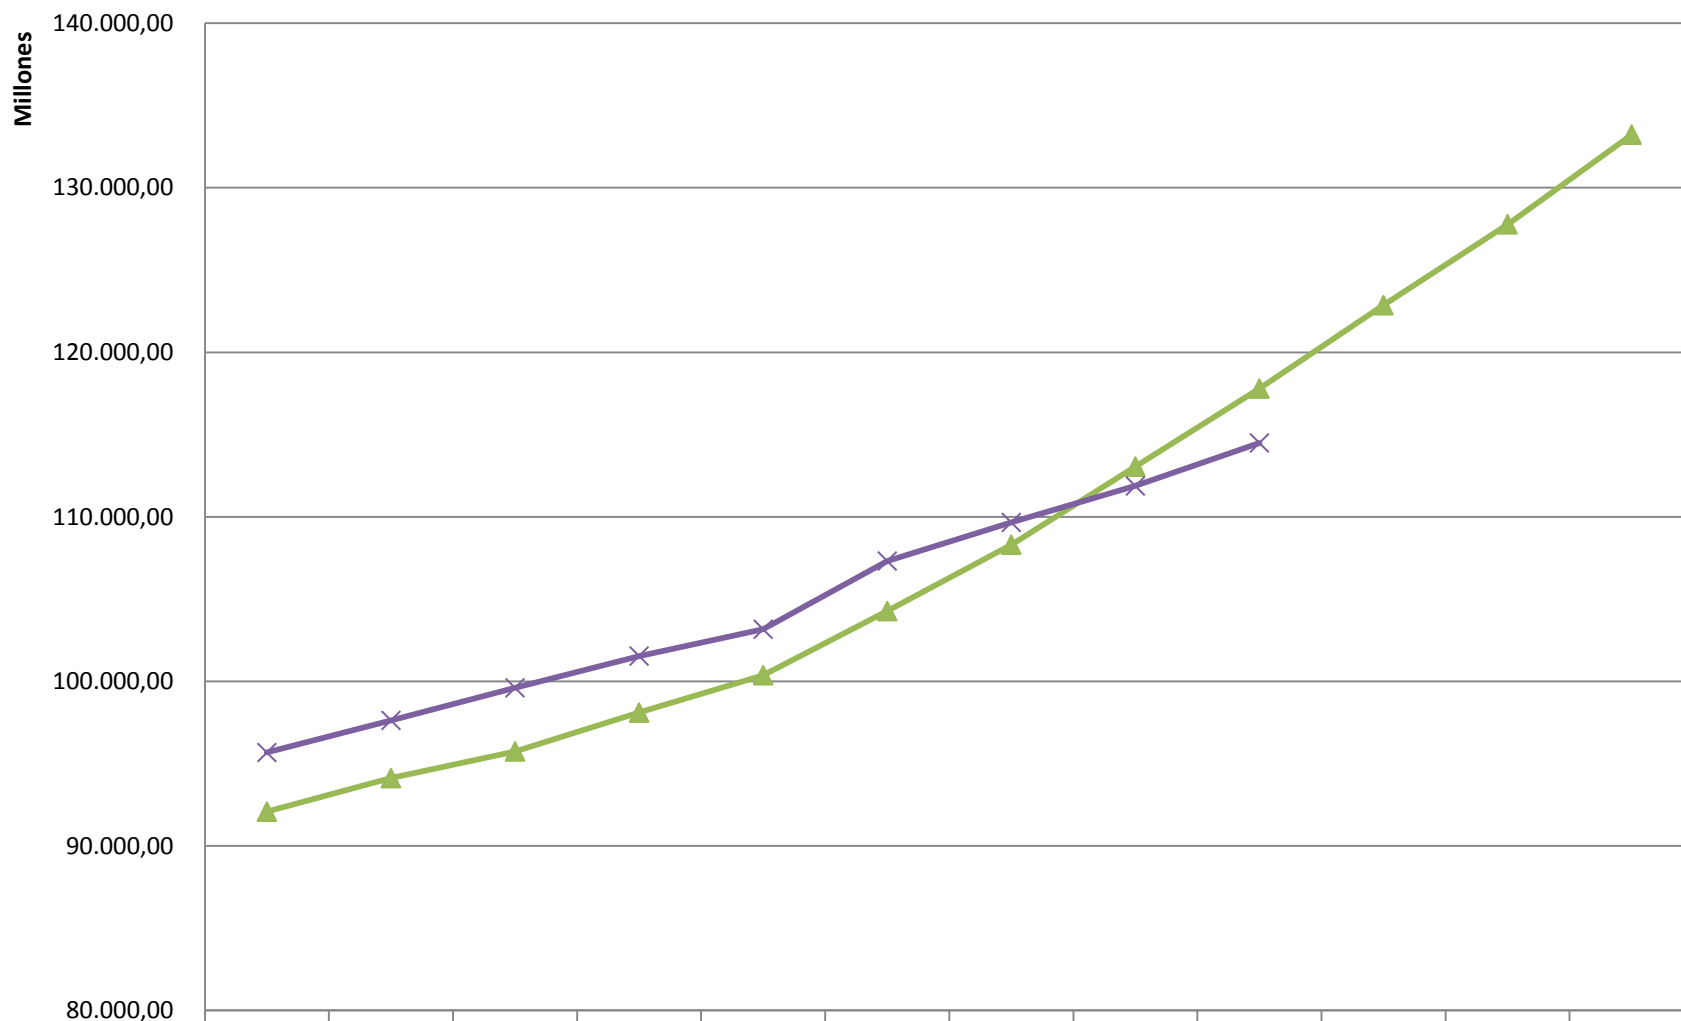

|               | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAMADO    | 1.702.78 | 2.036.35 | 1.621.38 | 2.361.603 | 2.272.740 | 3.896.226 | 4.034.239 | 4.745.033 | 4.743.010 | 5.066.490 | 4.917.854 | 5.443.871 |
| EJECUTADO     | 3.454.40 | 1.953.85 | 1.980.71 | 1.931.577 | 1.624.762 | 4.147.42  | 2.347.386 | 2.212.93  | 2.616.73  |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 92.084.1 | 94.120.4 | 95.741.8 | 98.103.4  | 100.376.1 | 104.272.  | 108.306.6 | 113.051.6 | 117.794.6 | 122.861.1 | 127.779.0 | 133.222.9 |
| EJEC. MENSUAL | 95.674.4 | 97.628.3 | 99.609.0 | 101.540.  | 103.165.  | 107.312.  | 109.660.  | 111.873.  | 114.489.  |           |           |           |

# REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 1



CONGUTA ANTES



CONGUTA DESPUES



CONGUTA ANTES



CONGUTA DESPUES

## VIA: BUCARAMANGA – CUESTABOBA (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)

### DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA



| VIGENCIA     | VALOR                  | Metas totales del proyecto: |                  |
|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|              |                        | Km MEJORADOS                | KM DOBLE CALZADA |
| 2009         | 33.364.964.982         |                             |                  |
| 2010         | 99.441.826.608         | 5,1                         |                  |
| 2011         | 40.081.989.200         | 17,1                        |                  |
| 2012         | 75.006.142.450         | 10                          | 1                |
| 2013         | 132.989.356.086        | 9                           | 7                |
| 2014         | 50.494.540.000         | 17,8                        | 11               |
| 2015         | 15.943.031.959         | 3                           | 8                |
| <b>TOTAL</b> | <b>447.321.851.285</b> | <b>62</b>                   | <b>27</b>        |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:           | No. 656 de 2009                                       |
| CONTRATISTA:                | CONSORCIO VIAS NACIONALES                             |
| COMPOSICIÓN:                | Mario Alberto Huertas Cotes - 80%<br>Meyan S.A. - 20% |
| REPRESENTANTE LEGAL:        | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES                           |
| VALOR CONTRATO ACTUALIZADO: | \$ 447.321 millones                                   |
| VIGENCIA 2013               | \$ 132.989 millones                                   |
| PLAZO EN MESES:             | 72 MESES                                              |
| ORDEN DE INICIO:            | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009                              |
| FECHA DE TERMINACIÓN:       | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015                              |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1310-2009              |
| INTERVENTOR:               | CONSORCIO CEI - EDL        |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | HERMANN MONTENEGRO ORJUELA |
| VALOR :                    | \$16.074 millones          |
| PLAZO:                     | 73 MESES                   |


| ITEM                    | TOTAL  |
|-------------------------|--------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS (Km)    | 1,84   |
| KM MEJORAMIENTO (Km)    | 35,3   |

**NOTA:** Se requiere urgente la colaboración del ANLA expidiendo la licencia del tramo del PR41+790 al PR70. (oficio radicado ANLA 4120-E1-4148 del 29 de enero de 2013).



# VIA: BUCARAMANGA – CUESTABOBA (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)

## DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA


### CONSTRUCCION DOBLE CALZADA

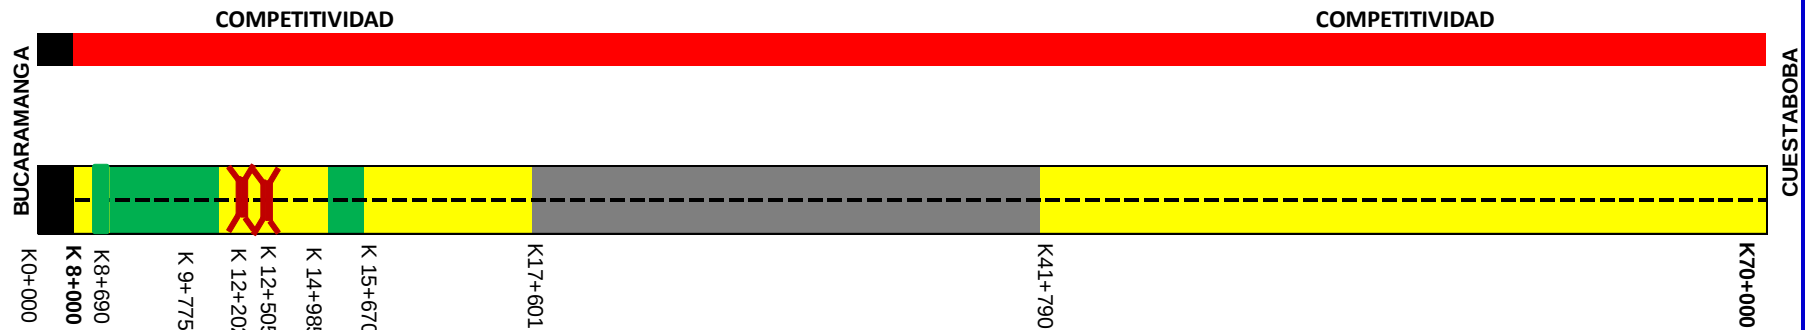

### MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALZADA EXISTENTE

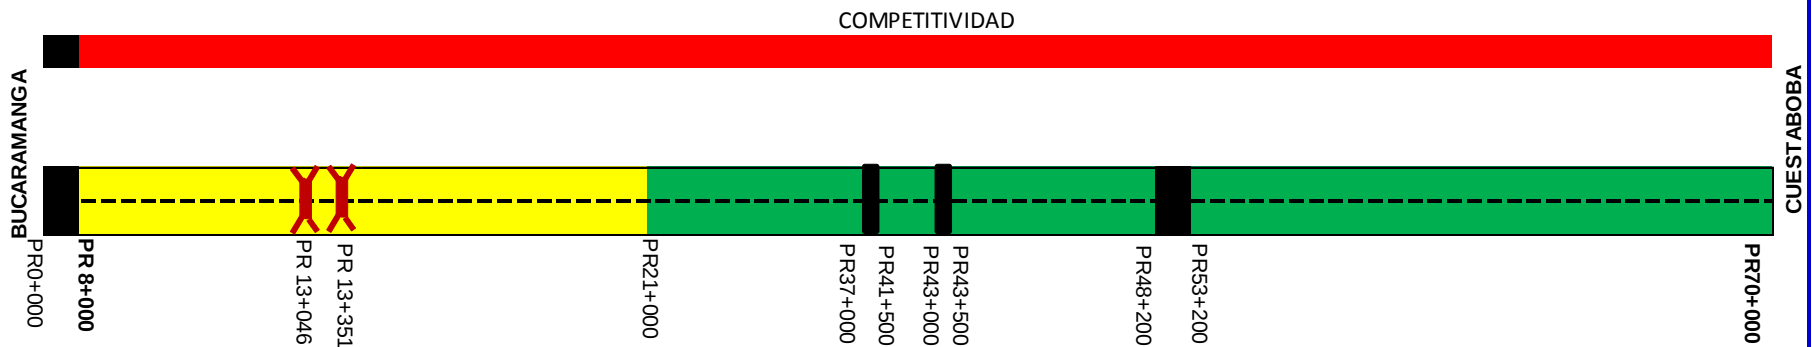

BUCARAMANGA -CUCUTA

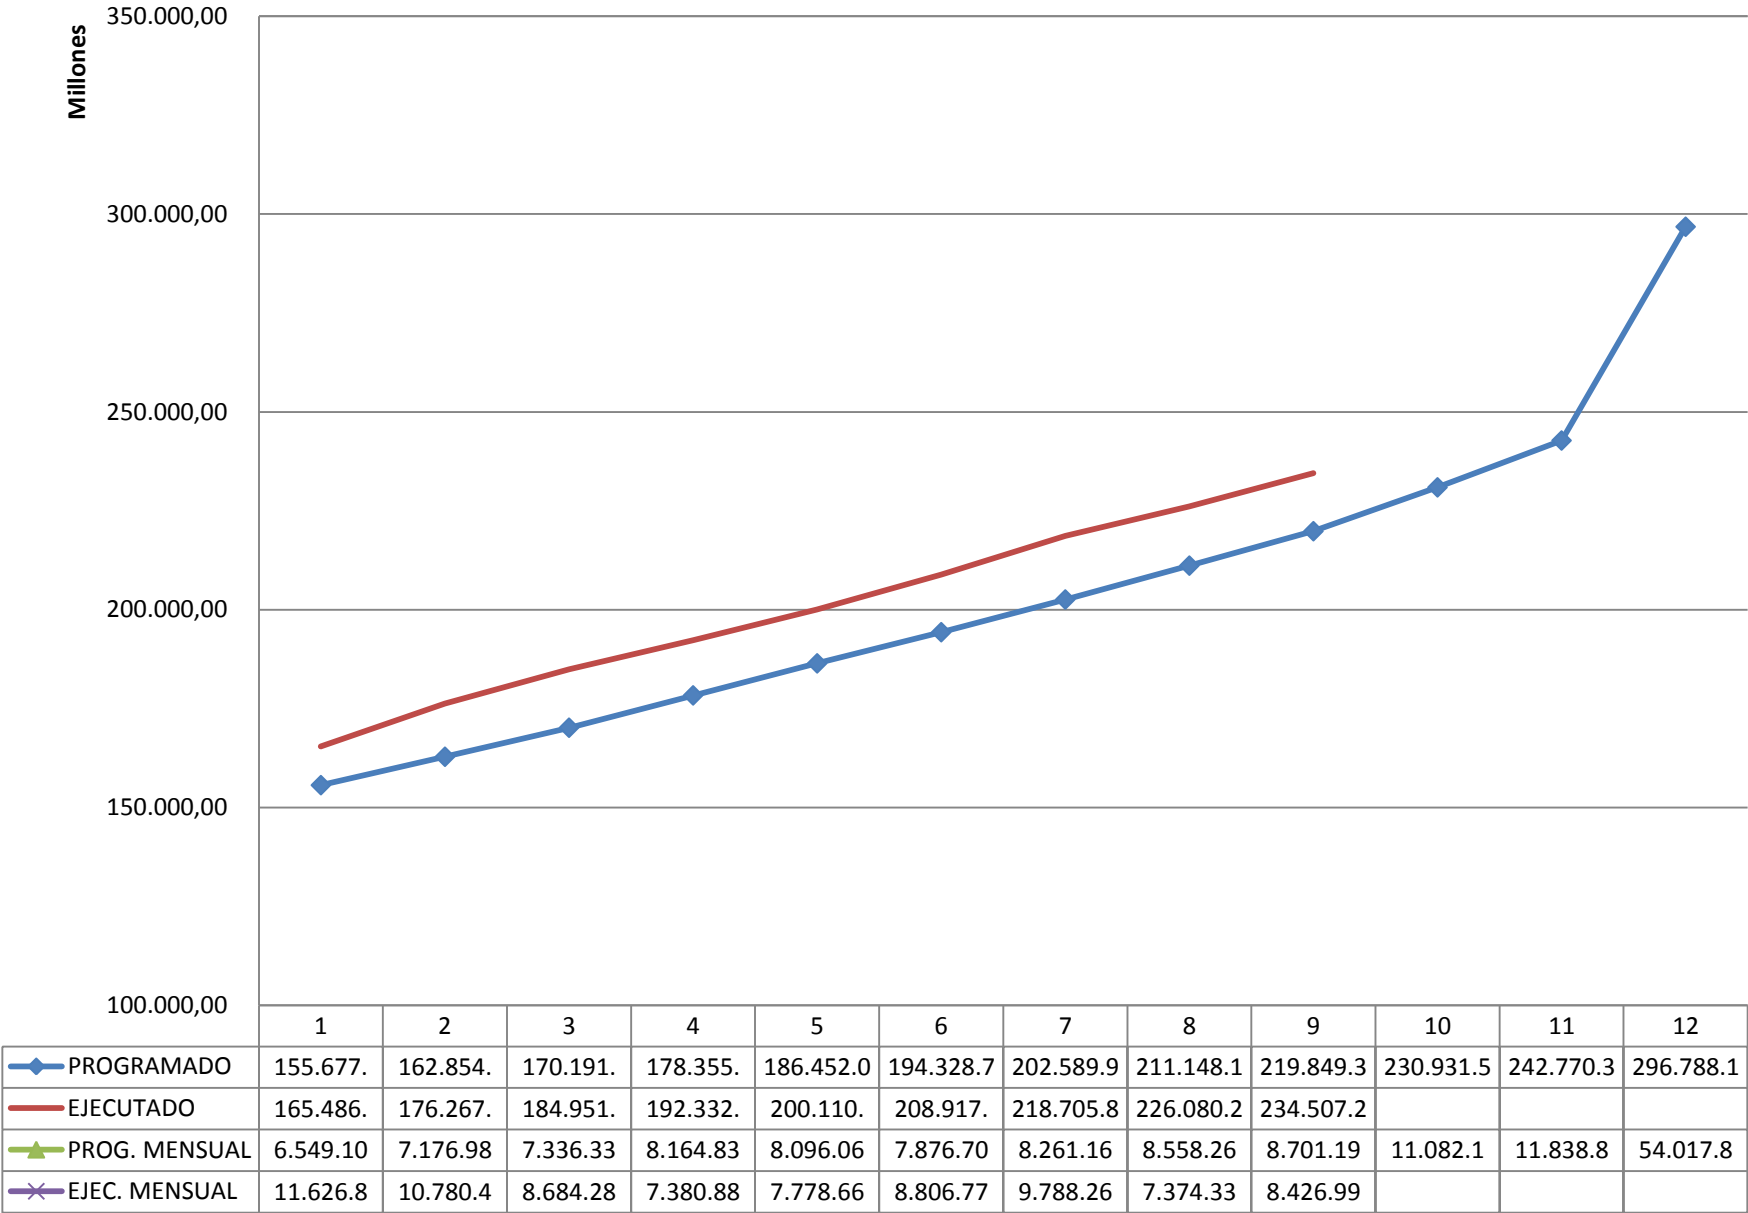

**VIA: BUCARAMANGA – CUESTABOBA (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)**  
**DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA**

**MEJORAMIENTO CALZADA EXISTENTE**



ESTADO DE LA VIA EXISTENTE PR 54  
DICIEMBRE 2009



VIA EXISTENTE CON MEJORAMIENTO PR 54  
DICIEMBRE 2012

**CONSTRUCCION DOBLE CALZADA**



PUENTE EN CONSTRUCCION PARA LA VIA  
PROYECTADA EN EL K13 - DICIEMBRE 2012



PAYMENTACION DE TRAMO DE VIA NUEVA EN  
EL K 9 - DICIEMBRE 2012

## TRONCAL CENTRAL DEL NORTE FASE 1



|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>     | <b>No. 794 de 2009</b>                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CONSORCIO SAN JOSE DE MIRANDA                                                                                                                                                     |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCTORA COLPATRIA</li> <li>• HD ESTRUCTURAS METALICAS S.A.</li> <li>• LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S.A</li> </ul> |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | SERGIO RAMIREZ ARROYABE.                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR TOTAL :</b>         | \$ 198.044.865.346                                                                                                                                                                |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>       | 60 MESES                                                                                                                                                                          |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 21 de Septiembre de 2009                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 20 de Septiembre de 2014                                                                                                                                                          |


| VALOR CONTRATO: | \$ 198.044.865.346       | Metas totales del proyecto: |           |               |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|                 |                          | Km pavimento                | puentes   | Doble calzada |
| VIGENCIA 2009   | \$10.840.015.305         | 0,1                         | 0         |               |
| VIGENCIA 2010   | \$28.180.544.333         | 8,1                         | 0         |               |
| VIGENCIA 2011   | \$37.611.000.000         | 7,1                         | 7         |               |
| VIGENCIA 2012   | \$57.307.000.000         | 17,2                        | 5         |               |
| VIGENCIA 2013   | \$42.293.955.708         | 4                           | 2         |               |
| VIGENCIA 2014   | \$21.812.350.000         | 8,5                         | 1         |               |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$198.044.865.346</b> | <b>44,2</b>                 | <b>15</b> |               |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1460-2009</b>      |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | CONSORCIO CHICAMOCHA      |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | GILBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ |
| <b>VALOR TOTAL:</b>               | \$ 8.453.999.978,00       |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 61 MESES                  |


| TRAMO                    | TOTAL |
|--------------------------|-------|
| KM PAVIMENTADOS (Km)     | 32,85 |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un) | 12    |

# VIA: LA PALMERA - PRESIDENTE (DEPARTAMENTO DE SANTANDER - NORTE DE SANTANDER)


LONGITUD CORREDOR 102 Km

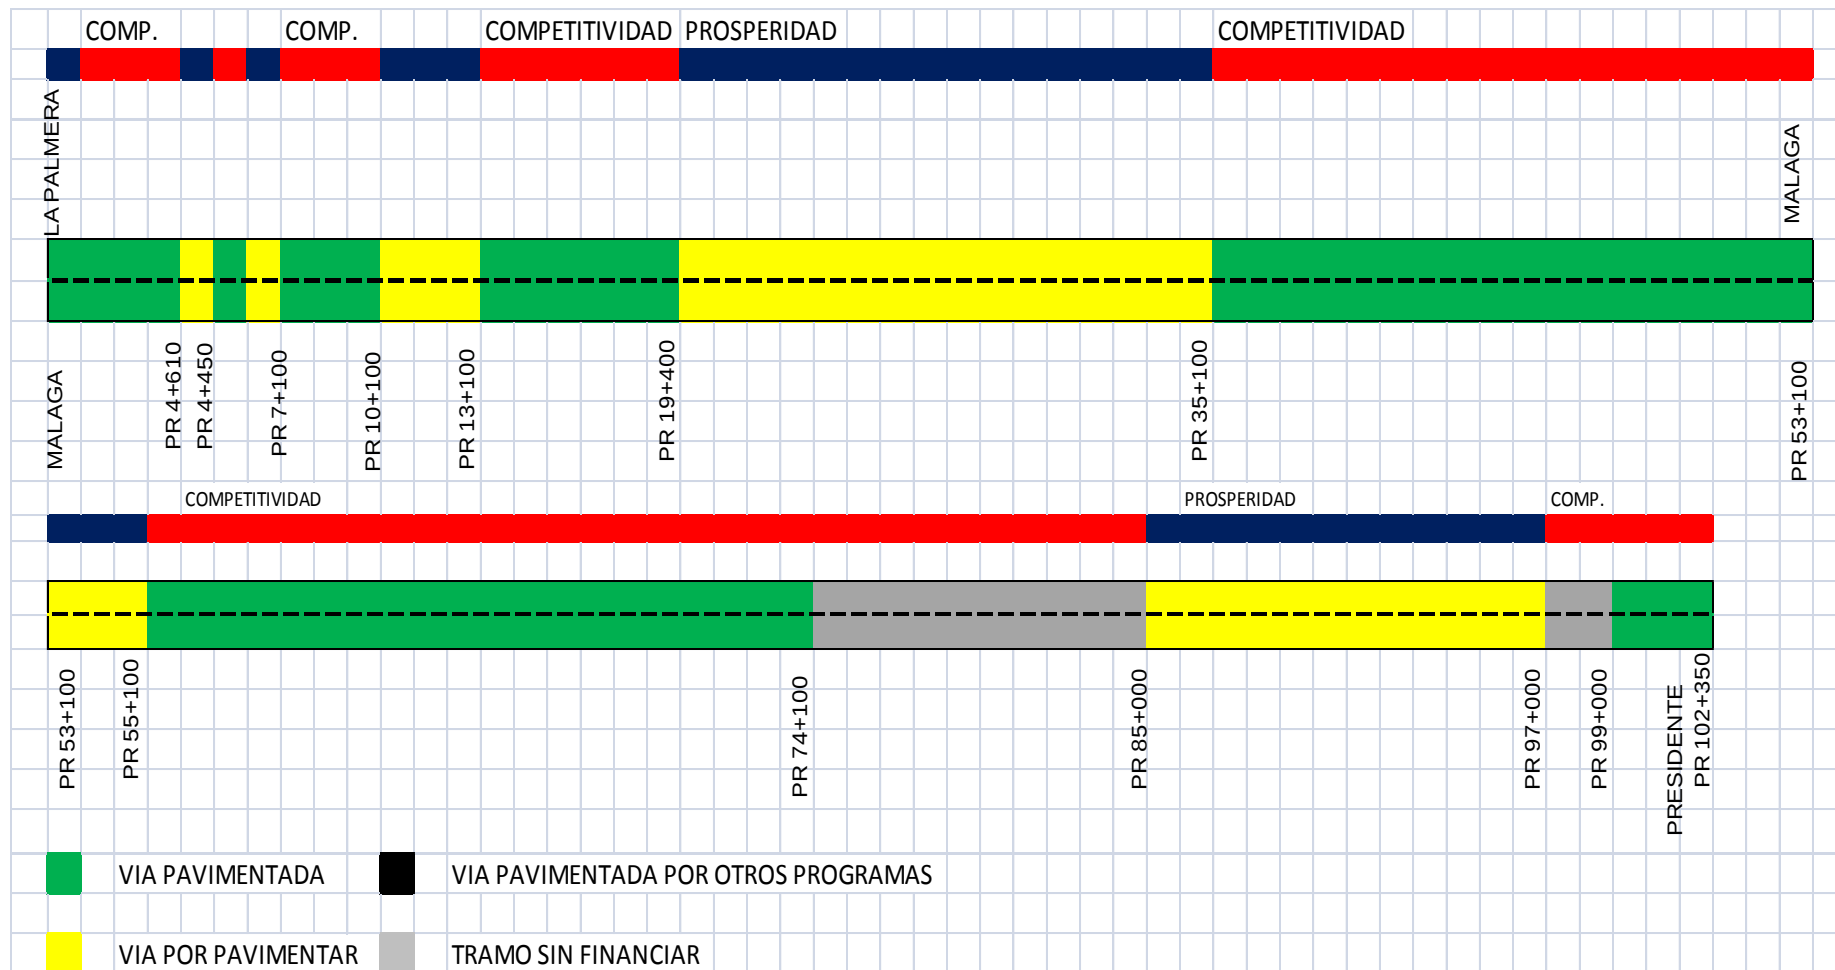

# TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

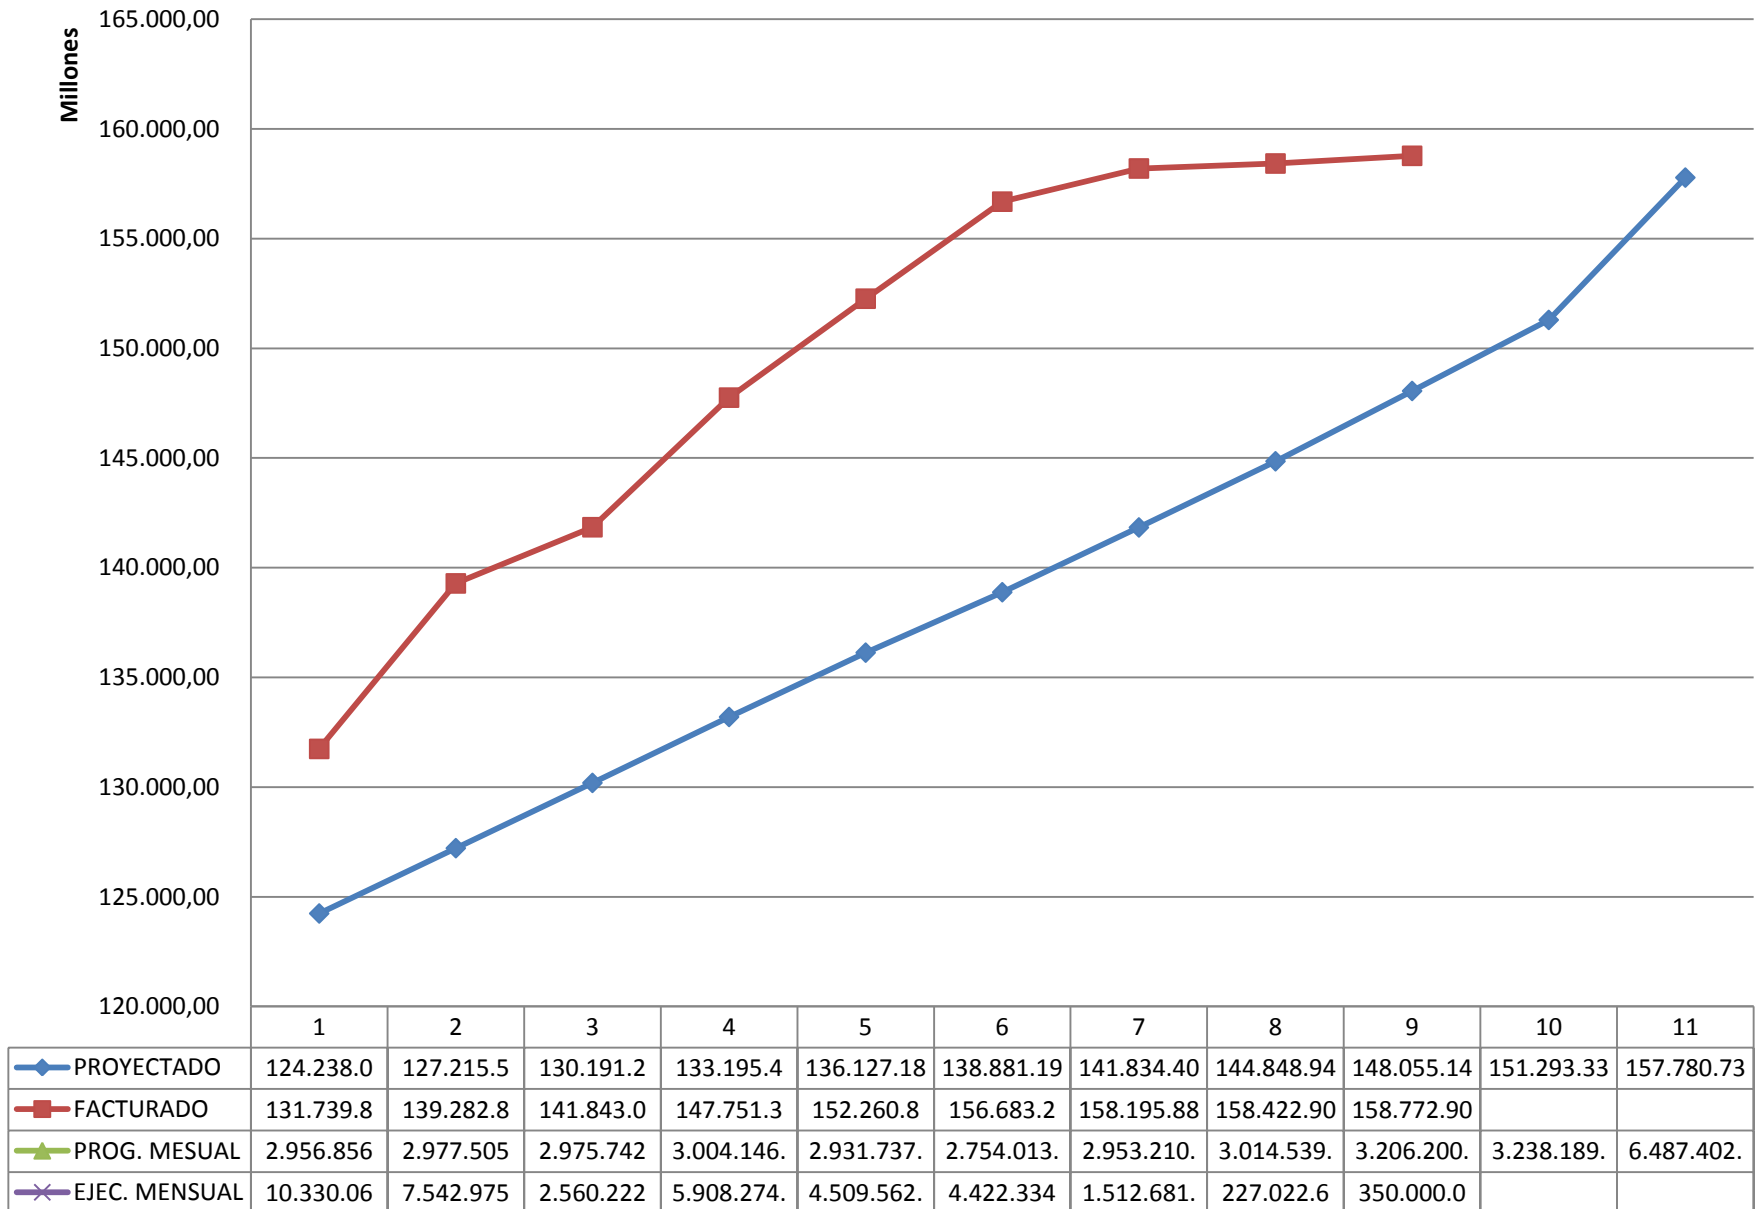

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

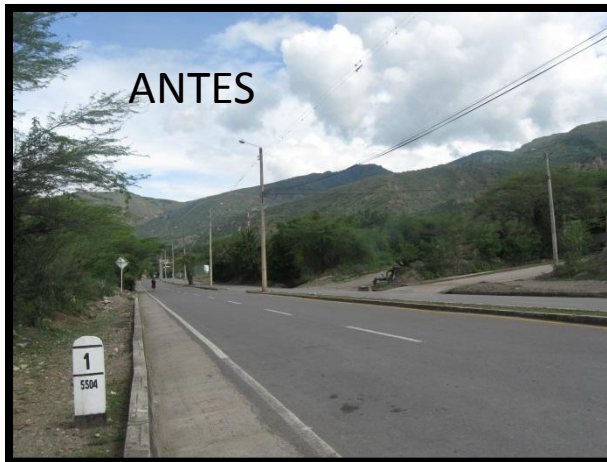

## TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 1



| VALOR CONTRATO: | 96.116.828.935,54    | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                      | Km pavimentados             | puentes |
| VIGENCIA 2009   | \$ 8.749.947.202,00  | 3                           |         |
| VIGENCIA 2010   | \$ 15.016.438.750,00 | 6                           |         |
| VIGENCIA 2011   | \$ 29.725.649.252,00 | 8                           |         |
| VIGENCIA 2012   | \$ 38.124.793.731,54 | 14                          | 2       |
| VIGENCIA 2013   | \$ 4.500.000.000,00  | 2                           |         |
| TOTAL           | \$ 96.116.828.935,54 | 33                          | 2       |

| ITEM                     | TOTAL  |
|--------------------------|--------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):  | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS (Km)     | 31.0   |
| KM FALTANTES             | 2.0    |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un) | 2      |

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:     | No. 851 de 2009                                                                                                           |
| CONTRATISTA:          | CONSORCIO METROCORREDORES 8                                                                                               |
| COMPOSICIÓN:          | CASS Constructores y CIA S.C.A.<br>Solarte Nacional de Construcciones S.A.<br>SONACOL S.A.<br>Luis Héctor Solarte Solarte |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS                                                                                             |
| VALOR CONTRATO:       | \$ 96.116.828.935,54                                                                                                      |
| VIGENCIA 2013         | \$ 4.500.000.000,00                                                                                                       |
| PLAZO EN MESES:       | 48 MESES                                                                                                                  |
| ORDEN DE INICIO:      | 03 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 01 de Septiembre de 2013                                                                                                  |


|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1139-2009                                             |
| INTERVENTOR:               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO<br>"DIEGO LUIS CORDOBA" |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA                               |
| VALOR ADJUDICADO:          | \$7.256.960.393.00                                        |
| PLAZO EN MESES:            | 48 MESES                                                  |

# ALCANCE DE INTERVENCION


## TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO LAS ANIMAS – PUEBLO RICO;

### APIA -LA VIRGINIA

#### LONGITUD CORREDOR 154 Km

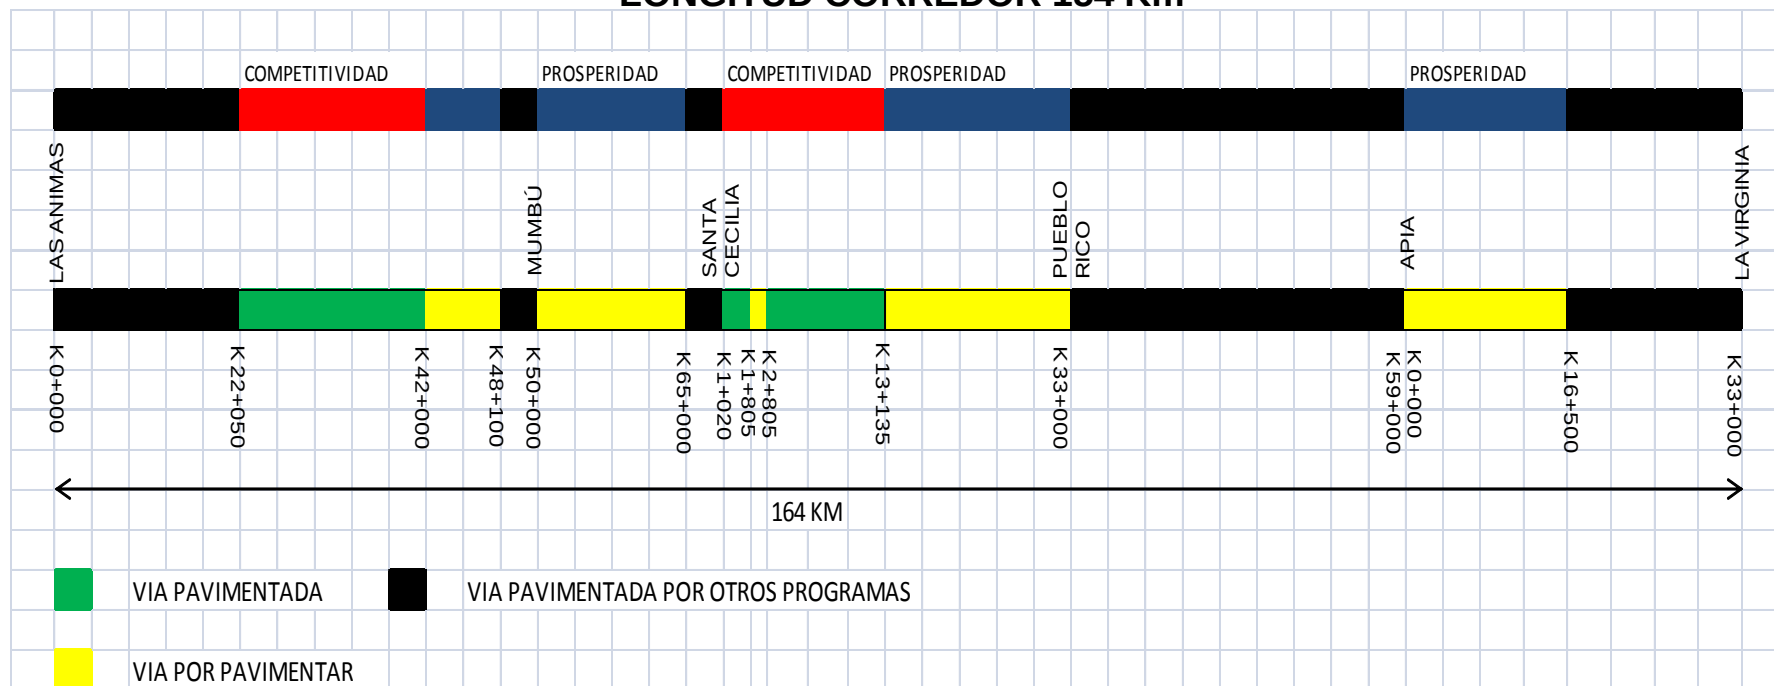

# TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO

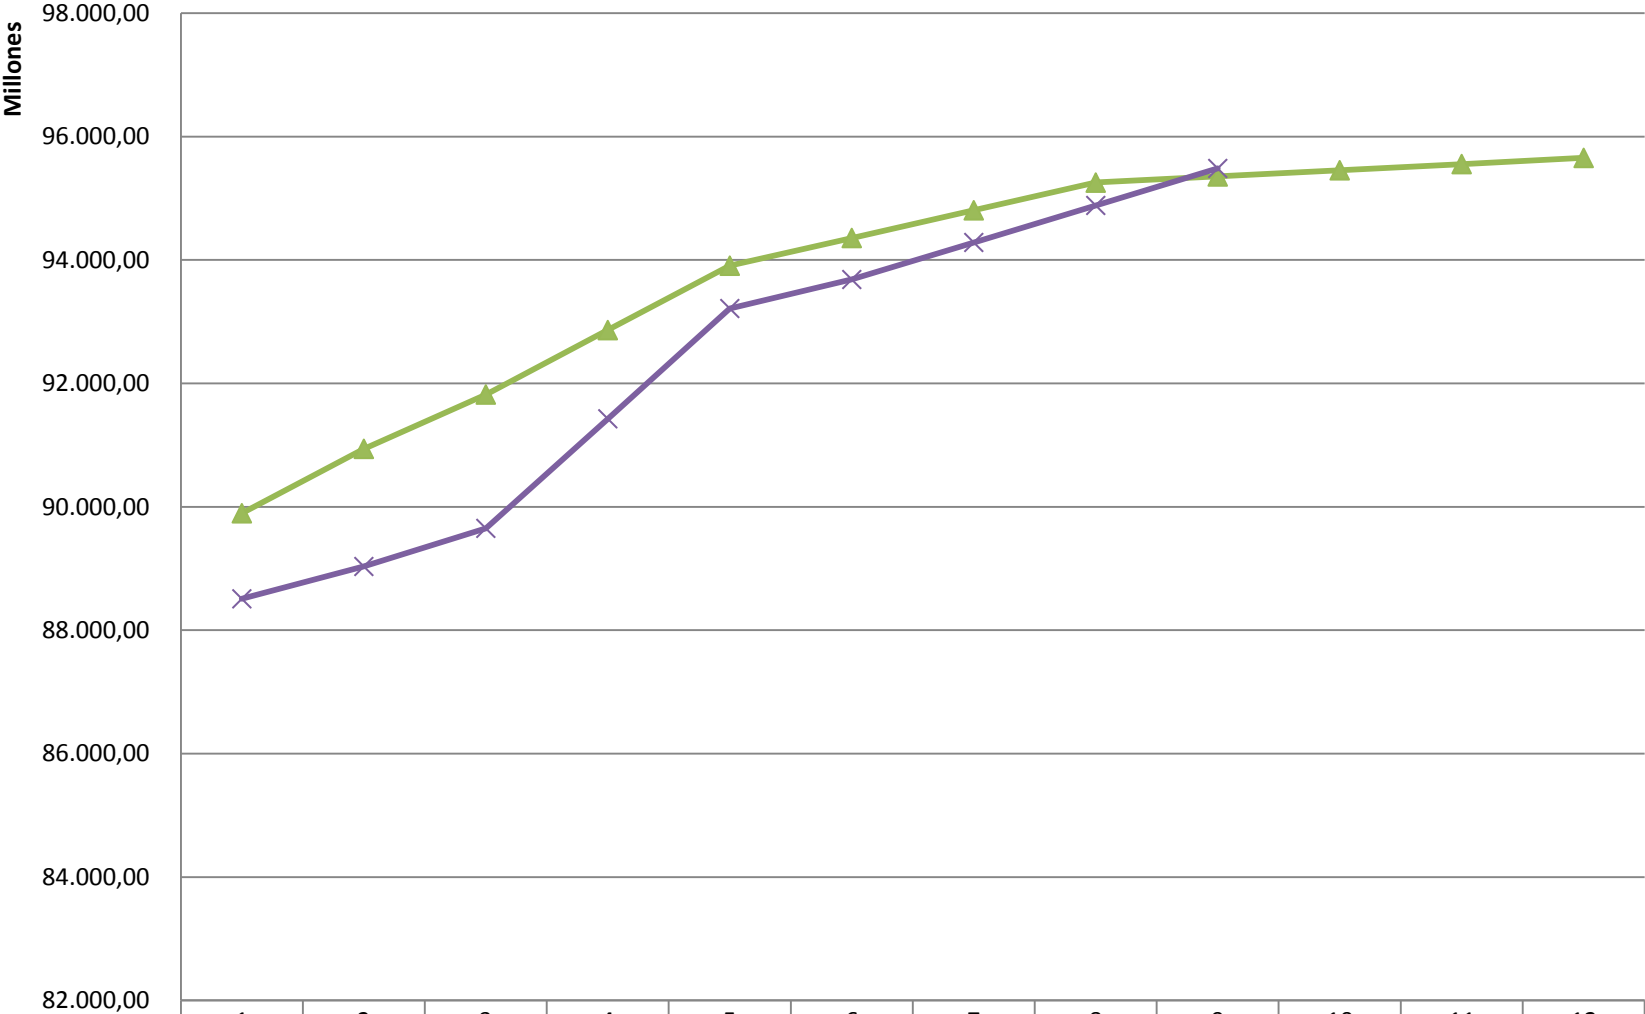

|                   |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Proyectado        | 1.043.57 | 1.043.57 | 881.048. | 1.043.577 | 1.043.577 | 448.989.8 | 448.989.8 | 448.989.8 | 100.000.0 | 100.000.0 | 100.000.0 | 100.000.0 |
| Ejecutado         | 1.838.48 | 523.896. | 617.994. | 1.775.782 | 1.786.710 | 470.590.4 | 600.000.  | 600.000.  | 600.000.  |           |           |           |
| Proyec. Acumulado | 89.896.2 | 90.939.7 | 91.820.8 | 92.864.4  | 93.907.9  | 94.356.9  | 94.805.9  | 95.254.9  | 95.354.9  | 95.454.9  | 95.554.9  | 95.654.9  |
| Ejecut. acumulado | 88.509.4 | 89.033.3 | 89.651.3 | 91.427.1  | 93.213.8  | 93.684.4  | 94.284.4  | 94.884.4  | 95.484.4  |           |           |           |


## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2



Continuación y Extensión y nivelación de base estabilizada con asfalto en caliente PR 15+700



## CORREDOR DE LAS PALMERAS FASE 1

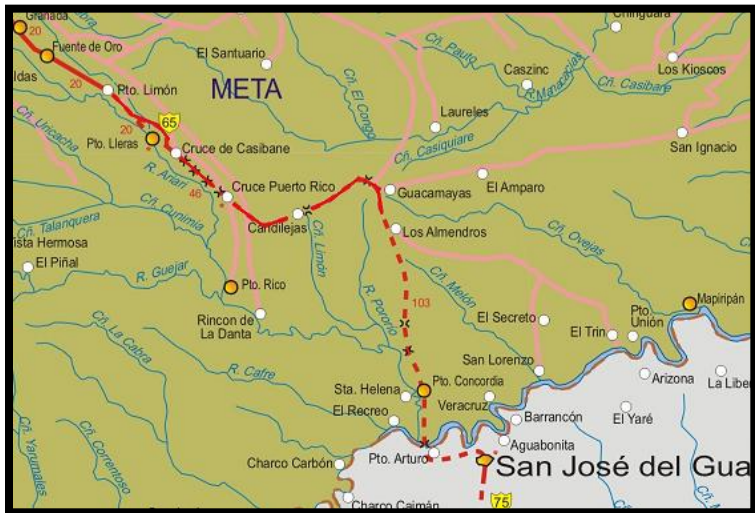

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>      | <b>No. 808 de 2009</b>                                           |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | CONSORCIO CC-MP-HV-PALMERAS                                      |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>           | CONCRETO S.A. 60%<br>CONSTRUCTORA MP S.A 20%<br>HORACIO VEGA 20% |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>   | JULIO TORRES                                                     |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>        | \$ 78.299.678.793                                                |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>        | 42 MESES                                                         |
| <b>ORDEN DE INICIO OBRAS:</b> | 21 de Noviembre de 2009                                          |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 20 de Mayo de 2013                                               |


| VALOR CONTRATO | \$ 78.299.678.793    | METAS | Puentes |
|----------------|----------------------|-------|---------|
| VIGENCIA 2009  | \$ 6.951.541.935,00  | 2     |         |
| VIGENCIA 2010  | \$ 14.943.682.790,00 | 8     |         |
| VIGENCIA 2011  | \$ 38.815.426.106,00 | 10    | 1       |
| VIGENCIA 2012  | \$ 32.153.352.810,00 | 11    | 1       |
| VIGENCIA 2013  | \$ 3.293.388.205,00  | 2     |         |
| Total          | \$ 78.299.678.793    | 33    | 2       |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1457-2009</b> |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | DESSAU – CEI S.A.S   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | HERMANN MONTENEGRO   |
| <b>VALOR ADJUDICADO:</b>          | \$3.063.088.501      |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 45 MESES             |


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ITEM                        | TOTAL       |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):     | 100,00      |
| <b>KM PAVIMENTADOS (Km)</b> | <b>32,6</b> |
| <b>KM FALTANTES</b>         | <b>0.40</b> |
| Puentes construidos (Un)    | 2           |

**INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 76.513.463.232**

VIA: LOS ALMENDROS – PUERTO CONCORDIA - PUENTE NOWEN SAN JOSE DEL GUAVIARE (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE)  
LONGITUD DEL CORREDOR 65 Km.

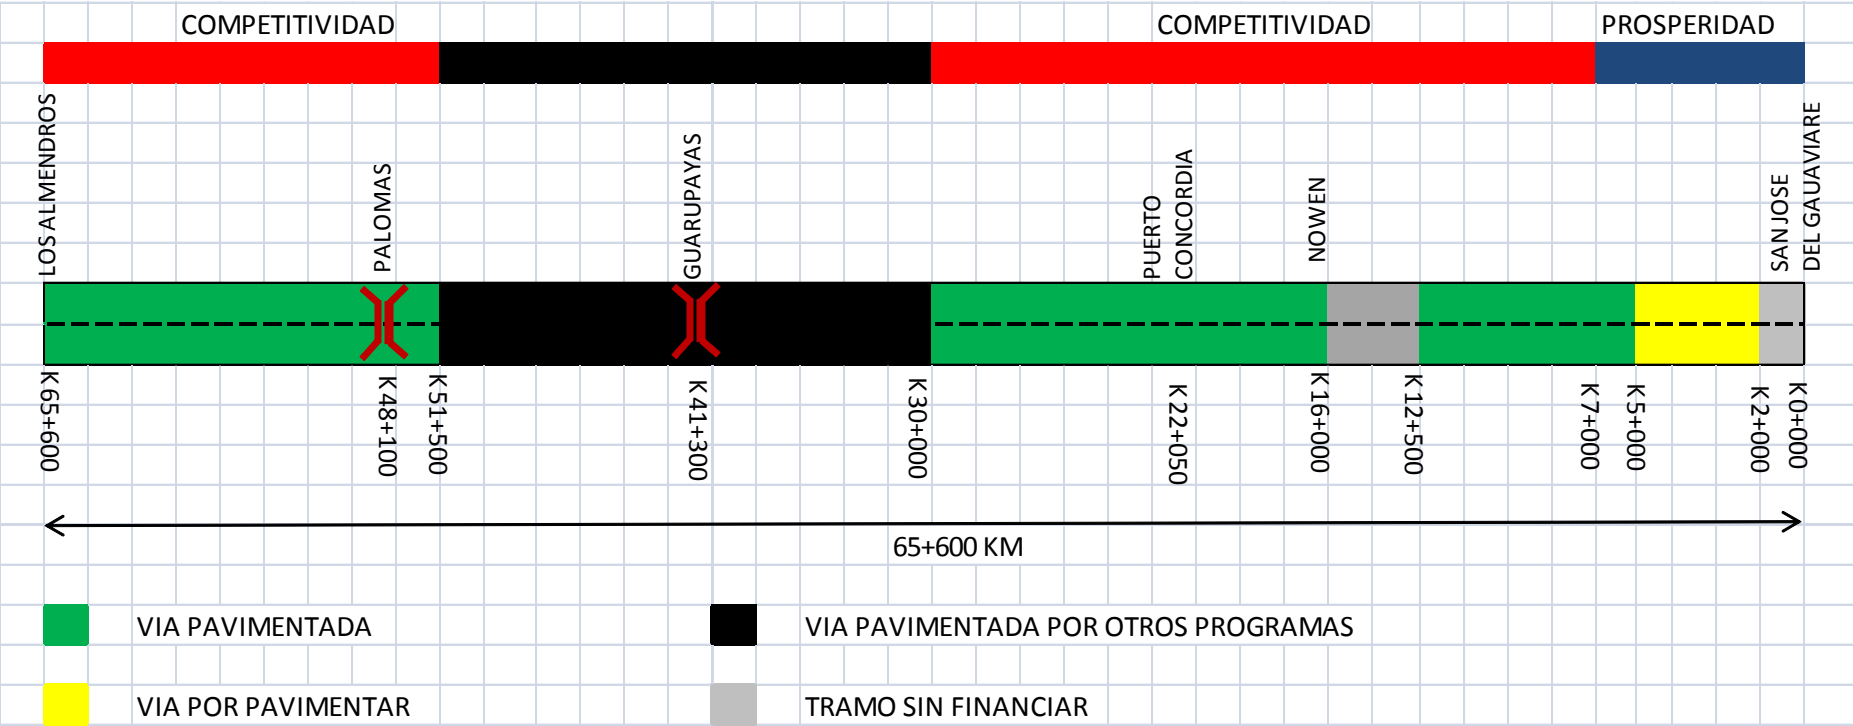

CORREDOR DE LAS PALMERAS

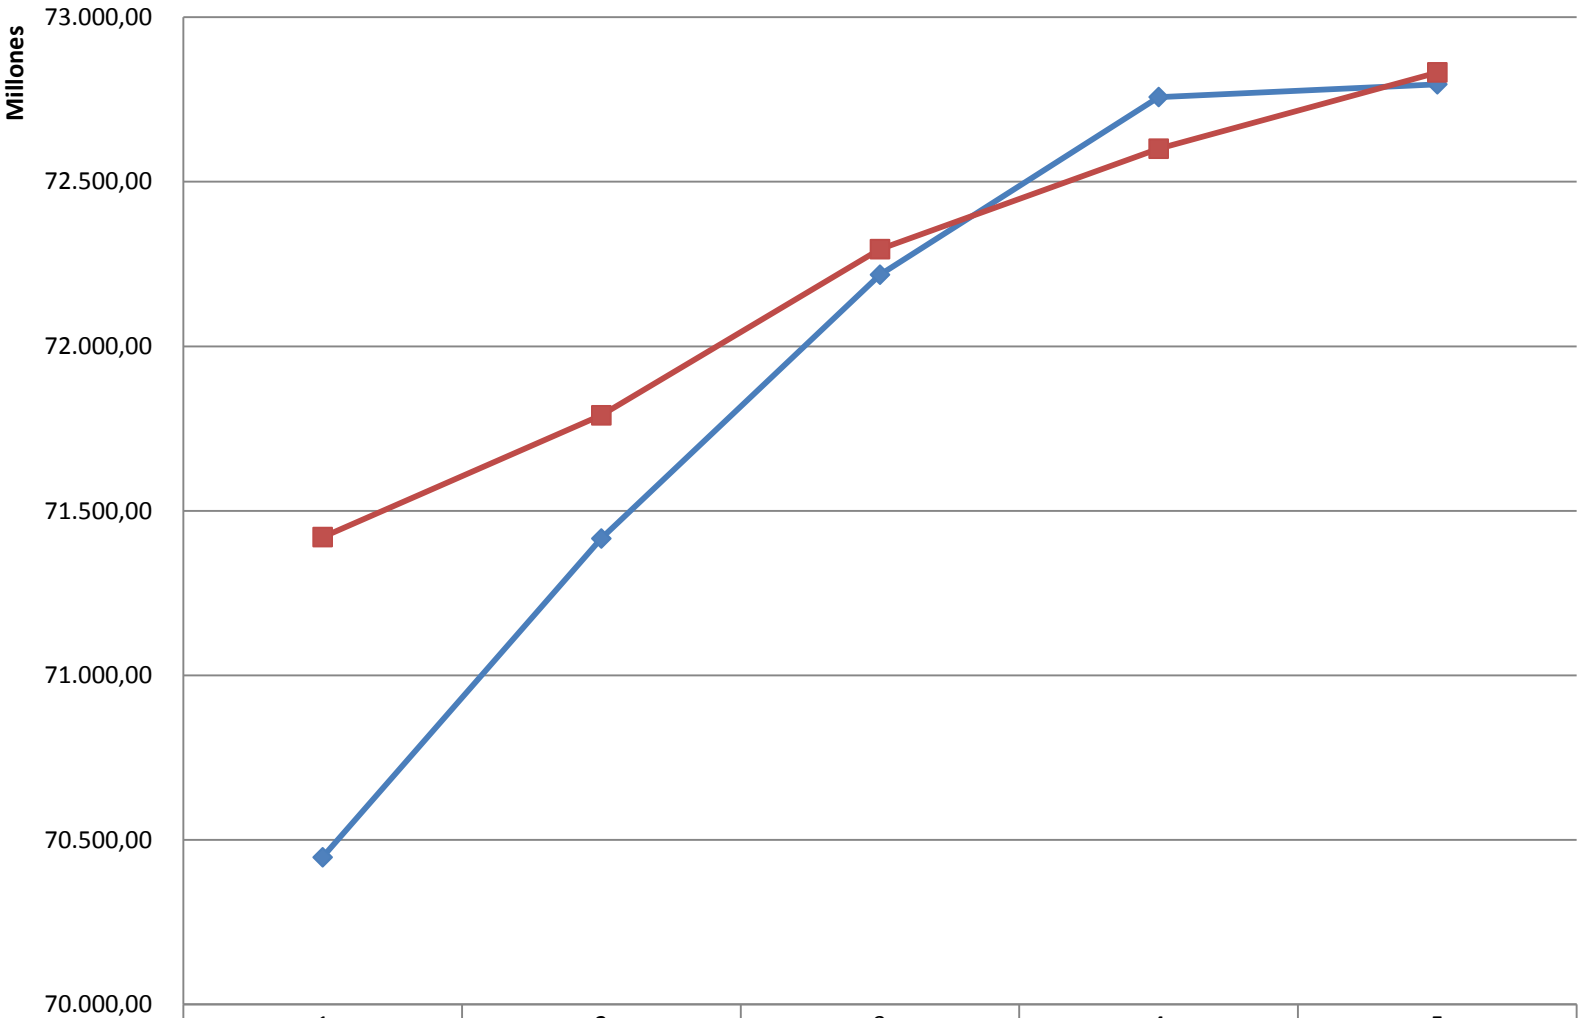

|                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMADO         | 70.447.255.011,00 | 71.415.902.140,00 | 72.217.525.528,00 | 72.757.460.808,00 | 72.796.162.947    |
| EJECUTADO          | 71.420.273.546,00 | 71.790.294.136,00 | 72.295.197.209,00 | 72.600.374.761,00 | 72.832.374.761,00 |
| PROGRAMADO MENSUAL | 1.210.905.726,00  | 968.647.129,00    | 801.623.388,00    | 539.935.280       | 38.702.139        |
| EJECUTADO MENSUAL  | 1.168.220.069,00  | 370.020.590,00    | 504.903.073,00    | 305.177.552       | 232.000.000,00    |

**VIA: LOS ALMENDROS – PUERTO CONCORDIA - PUENTE NOWEN SAN JOSE DEL  
GUAVIARE (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE)**



## CORREDOR DEL PALETARA (POPAYAN –COCONUCO-PALETARA ISNOS)




| VALOR CONTRATO: | \$ 101.572.114.990 | Metas totales del proyecto: |         |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                 |                    | Km pavimentados             | puentes |
| VIGENCIA 2009   | \$ 4.743.906.202   | 0                           |         |
| VIGENCIA 2010   | \$ 16.745.187.048  | 0.04                        |         |
| VIGENCIA 2011   | \$ 19.510.000.000  | 3                           |         |
| VIGENCIA 2012   | \$ 49.739.034.228  | 13                          |         |
| VIGENCIA 2013   | \$ 10.833.987.512  | 5                           |         |
| TOTAL           | \$ 101.572.114.990 | 23                          | 0       |

| ITEM                          | TOTAL |
|-------------------------------|-------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):       | 95,00 |
| KM PAVIMENTADOS (Km)          | 18    |
| KM REHABILITADOS Y MANTENIDOS | 65    |
| KM FALTANTES                  | 17    |

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:     | No. 679 de 2009                                                                                                                                              |
| CONTRATISTA:          | Unión Temporal Corredores Arteriales                                                                                                                         |
| COMPOSICIÓN:          | INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO 40%<br>NOARCO S.A. 25%<br>ALCA INGENIERIA S.A.S 15%<br>ODEKA S.A.S ( Antes SAUREZ Y SILVA LTDA<br>INGENIEROS CONTRTISTAS) 20% |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | ALICIA NARANJO URIBE                                                                                                                                         |
| VALOR CONTRATO:       | \$ 101.572.114.990                                                                                                                                           |
| VIGENCIA 2013         | \$ 10.833.987.512                                                                                                                                            |
| PLAZO EN MESES:       | 48 meses                                                                                                                                                     |
| ORDEN DE INICIO:      | 17 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 de Septiembre de 2013                                                                                                                                     |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 1462-2009                  |
| INTERVENTOR:               | Consorcio CCC – AIM – SEDIC/20 |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | JAIME ALFONSO RODAS DUQUE      |
| VALOR CONTRATO:            | \$ 3.618.406.740               |
| PLAZO EN MESES:            | 49 MESES                       |


## CORREDOR DEL PALETARA (POPAYAN –COCONUCO-PALETARA ISNOS)

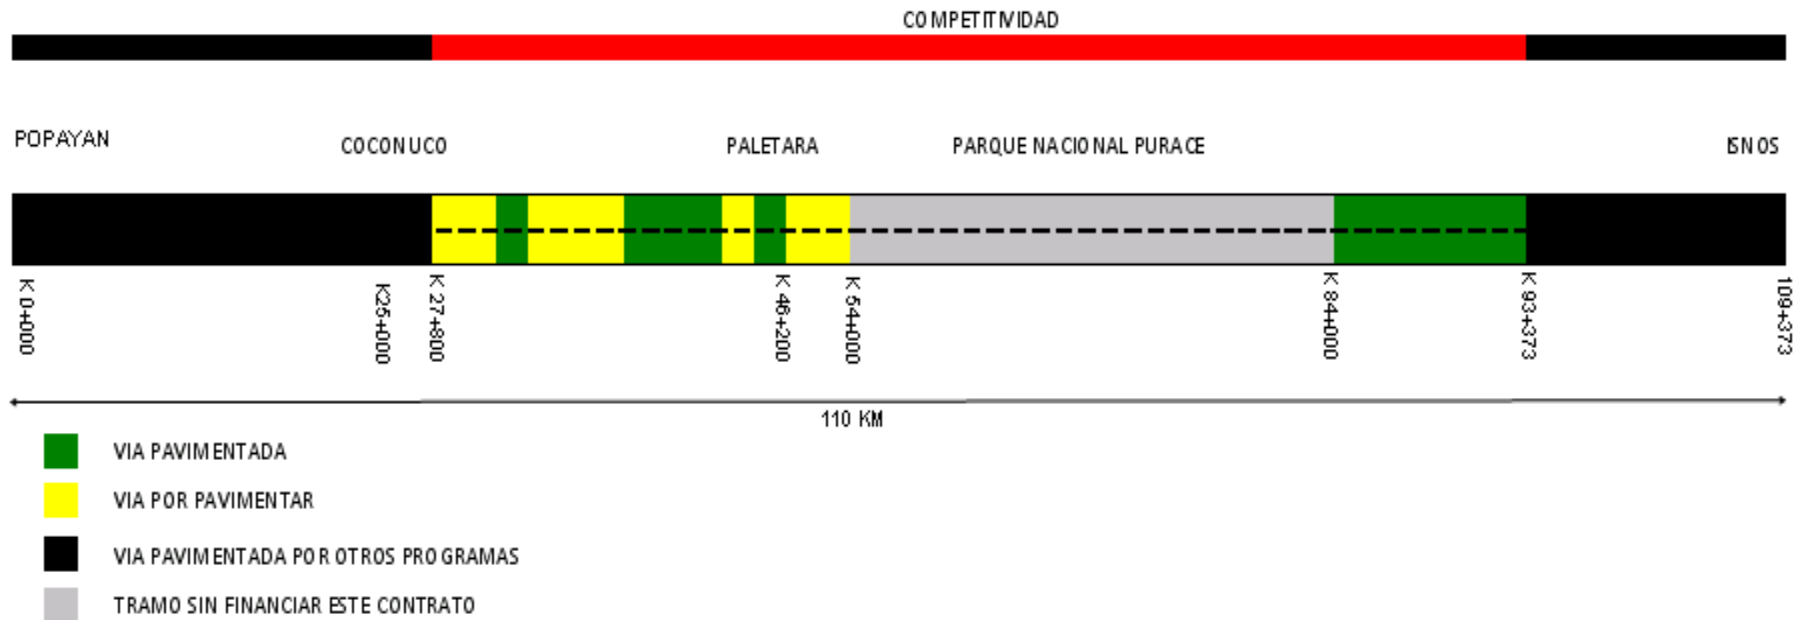

El contrato actual requiere una adición de \$ 12.500.000.000,00 para pavimentar 4 Km., con el fin de terminar la meta física estimada de 35 Km

Para la terminación total del corredor se requiere una licitación pública para los 30 Km. del Parque Nacional del Purace por un valor de \$ 90.000.000,000,00

CORREDOR DEL PALETARA

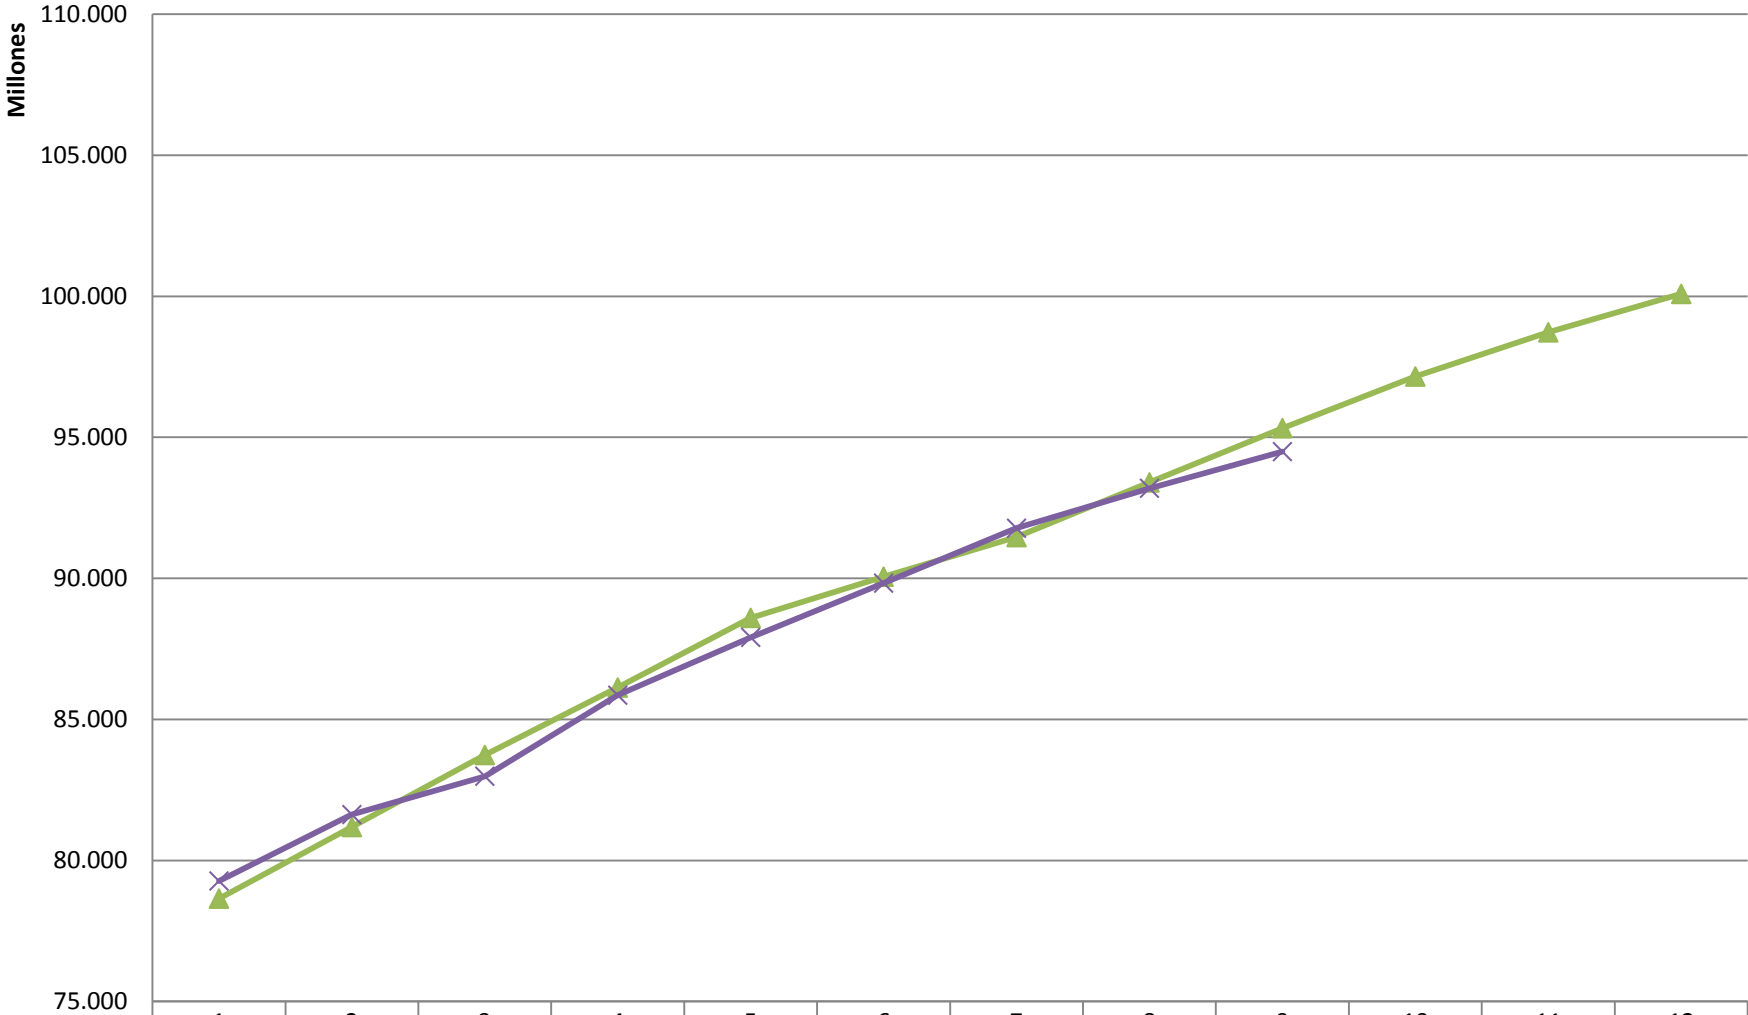


|         | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Series1 | 2.403.55 | 2.539.29 | 2.552.67 | 2.391.925 | 2.468.776 | 1.459.810 | 1.403.816 | 1.938.000 | 1.923.000 | 1.832.000 | 1.567.000 | 1.361.000 |
| Series2 | 2.575.27 | 2.352.68 | 1.359.52 | 2.872.378 | 2.050.088 | 1.922.68  | 1.946.946 | 1.416.425 | 1.300.00  |           |           |           |
| Series3 | 78.646.4 | 81.185.7 | 83.738.4 | 86.130.3  | 88.599.13 | 90.058.94 | 91.462.76 | 93.400.76 | 95.323.76 | 97.155.76 | 98.722.76 | 100.083.7 |
| Series4 | 79.272.4 | 81.625.1 | 82.984.6 | 85.857.0  | 87.907.1  | 89.829.8  | 91.776.79 | 93.193.22 | 94.493.22 |           |           |           |

## CORREDOR DEL PALETARA (POPAYAN –COCONUCO-PALETARA ISNOS)



## TRONCAL NORTE DE NARIÑO: EL EMPATE – LA UNION - HIGUERONES

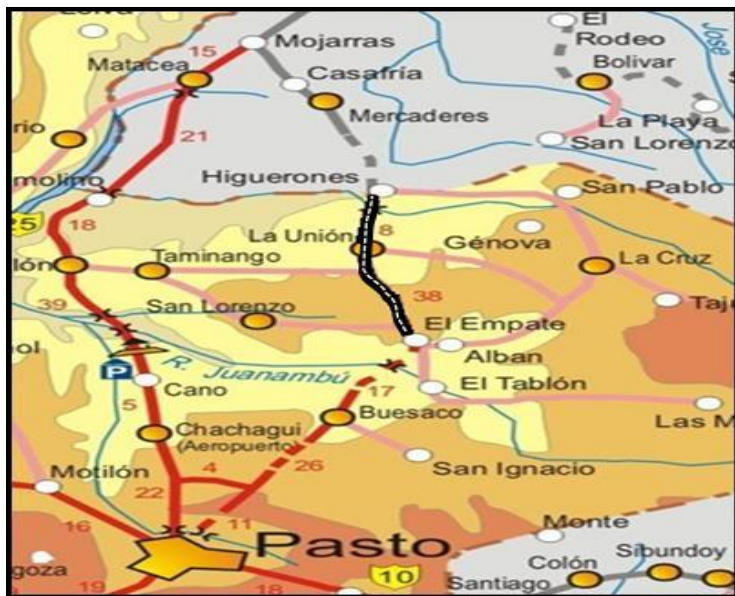


|                              |                                             |     |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>     | <b>No. 653 de 2009</b>                      |     |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CONSORCIO CORREDORES DE COMPETITIVIDAD 2010 |     |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | Procopal S.A.                               | 55% |
|                              | Ingeniería de Vías S.A.                     | 20% |
|                              | Meyan S.A..                                 | 25% |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | PEDRO CONTECHA CARRILLO                     |     |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | \$ 88,073,967,951                           |     |
| <b>VIGENCIA 2013</b>         | \$ 23,113,081,322                           |     |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>       | 51,5 MESES                                  |     |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 17 de SEPTIEMBRE de 2009                    |     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 31 de Diciembre de 2013                     |     |

|                               |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| <b>VALOR CONTRATO:</b>        | \$ 88,073,967,951 | Metas |
| VIGENCIA 2009                 | \$ 7.773.040.675  | 0,5   |
| VIGENCIA 2010                 | \$ 13.776.161.338 | 3,5   |
| VIGENCIA 2011                 | \$ 14.743.475.498 | 7     |
| VIGENCIA 2012                 | \$ 28.668.211.127 | 11    |
| VIGENCIA 2013                 | \$ 23.113.081.322 | 10    |
| META SIN FINANCIAR            |                   | 6     |
| TOTALES                       | \$ 88,073,967,951 | 38    |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | \$ 68.870.000.000 | 27    |


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ITEM                          | TOTAL  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):       | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS (Km)          | 26,5   |
| KM REHABILITADOS Y MANTENIDOS | 9      |
| KM FALTANTES                  | 10.5   |
| PUENTES CONSTRUIDOS (Un)      | 1      |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1458-2009</b> |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | CONSORCIO RYU ID     |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | ALEJANDRO RESTREPO   |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>            | \$3,558,909,868      |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 51,5 MESES           |

## ALCANCE TRONCAL NORTE DE NARIÑO

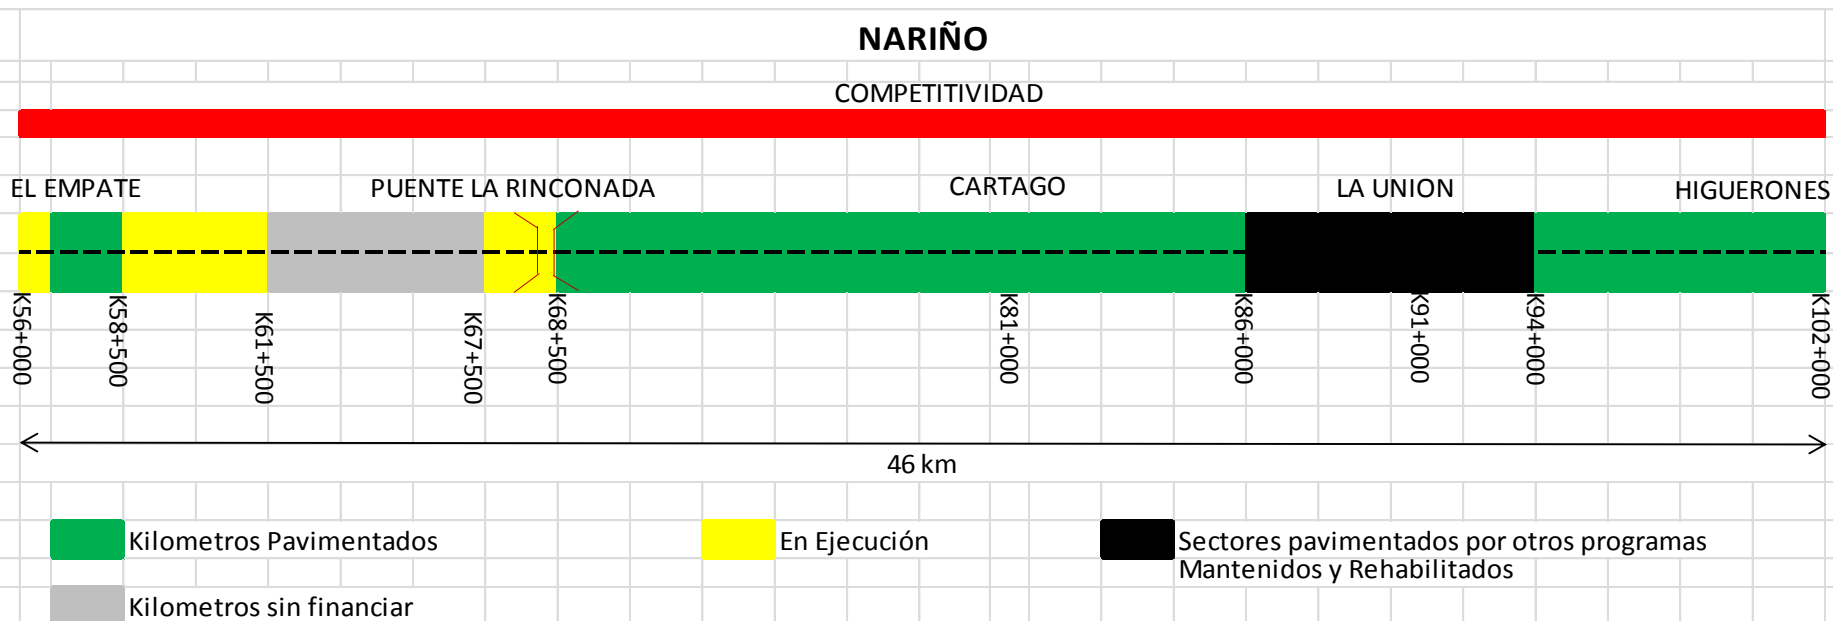

# TRONCAL NORTE DE NARIÑO

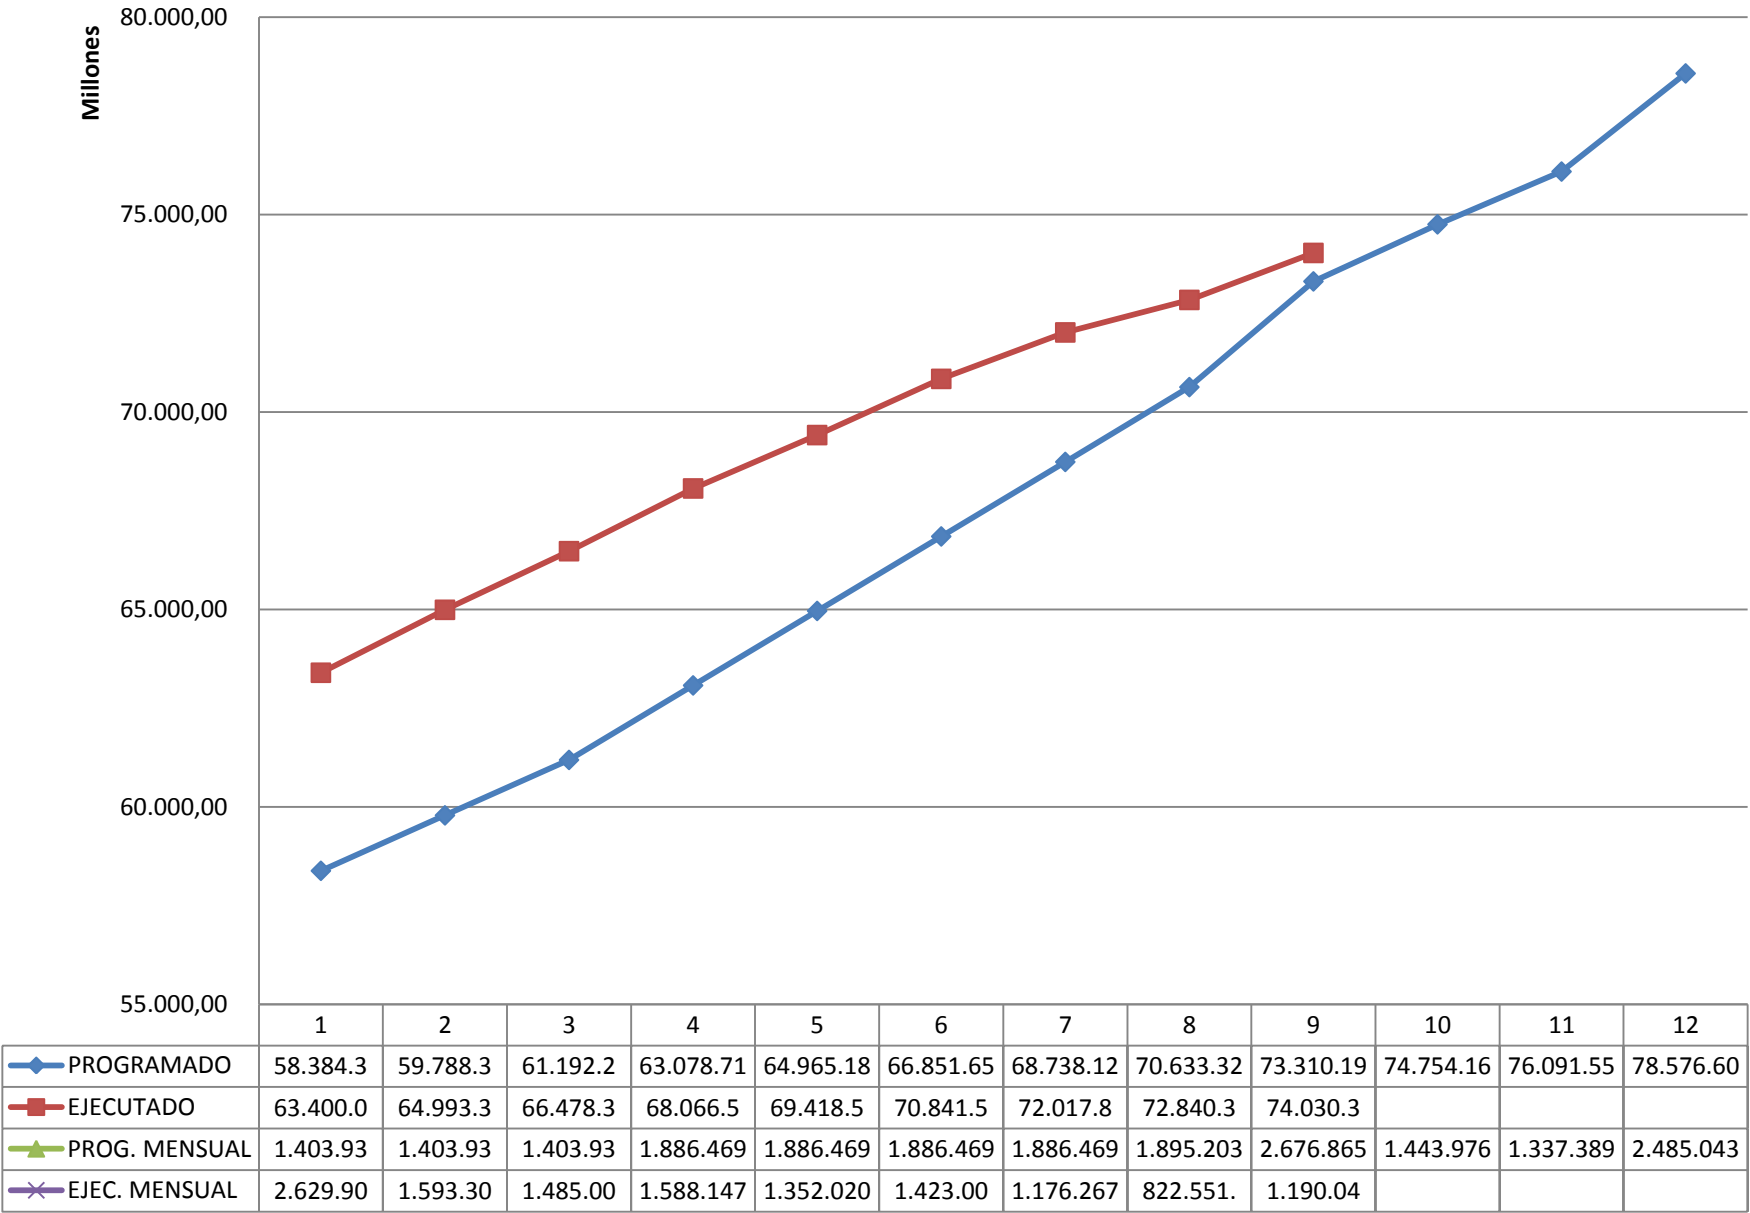

# REGISTRO FOTOGRAFICO TRONCAL NORTE DE NARIÑO FASE 1

## FOTOS FASE 1



## ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO




|                               |                      |       |         |
|-------------------------------|----------------------|-------|---------|
| <b>VALOR CONTRATO:</b>        | \$ 120.111.800.487   | Metas | Puentes |
| VIGENCIA 2009                 | \$ 6.469.856.412,00  | 0,3   |         |
| VIGENCIA 2010                 | \$18.478.532.212,00  | 4,7   |         |
| VIGENCIA 2011                 | \$ 25.281.524.502,00 | 8     |         |
| VIGENCIA 2012                 | \$ 33.137.703.991,00 | 12    | 1       |
| VIGENCIA 2013                 | \$ 36.744.183.370,00 | 16    | 1       |
| TOTALES                       | \$ 120.111.800.487   | 41    |         |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | \$ 87.745.000.000    | 36    | 2       |

| ITEM                          | TOTAL  |
|-------------------------------|--------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):       | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS (Km)          | 33     |
| KM REHABILITADOS Y MANTENIDOS | 6      |
| KM FALTANTES                  | 7      |
| PUNTES CONSTRUIDOS (Un)       | 1      |


|                              |                                                                                                                                                                 |               |     |                         |     |             |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|-----|-------------|-----|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>     | <b>No. 653 de 2009</b>                                                                                                                                          |               |     |                         |     |             |     |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CONSORCIO CORREDORES DE COMPETITIVIDAD 2010                                                                                                                     |               |     |                         |     |             |     |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | <table> <tr> <td>Procopal S.A.</td><td>55%</td></tr> <tr> <td>Ingeniería de Vías S.A.</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>Meyan S.A..</td><td>25%</td></tr> </table> | Procopal S.A. | 55% | Ingeniería de Vías S.A. | 20% | Meyan S.A.. | 25% |
| Procopal S.A.                | 55%                                                                                                                                                             |               |     |                         |     |             |     |
| Ingeniería de Vías S.A.      | 20%                                                                                                                                                             |               |     |                         |     |             |     |
| Meyan S.A..                  | 25%                                                                                                                                                             |               |     |                         |     |             |     |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | PEDRO CONTECHA CARRILLO                                                                                                                                         |               |     |                         |     |             |     |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | \$ 120,111,800,487                                                                                                                                              |               |     |                         |     |             |     |
| <b>VIGENCIA 2013</b>         | \$ 36,744,183,370                                                                                                                                               |               |     |                         |     |             |     |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>       | 51,5 MESES                                                                                                                                                      |               |     |                         |     |             |     |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 17 de SEPTIEMBRE de 2009                                                                                                                                        |               |     |                         |     |             |     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 31 de Diciembre de 2013                                                                                                                                         |               |     |                         |     |             |     |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1458-2009</b> |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | CONSORCIO RYU ID     |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | ALEJANDRO RESTREPO   |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>            | \$6,059,765,451      |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 51,5 MESES           |

VIA: ROSAS – LA SIERRA - SAN MIGUEL; BOLIVAR – LA LUPA (DEPARTAMENTO DEL CAUCA) LONGITUD DEL CORREDOR 91 Km

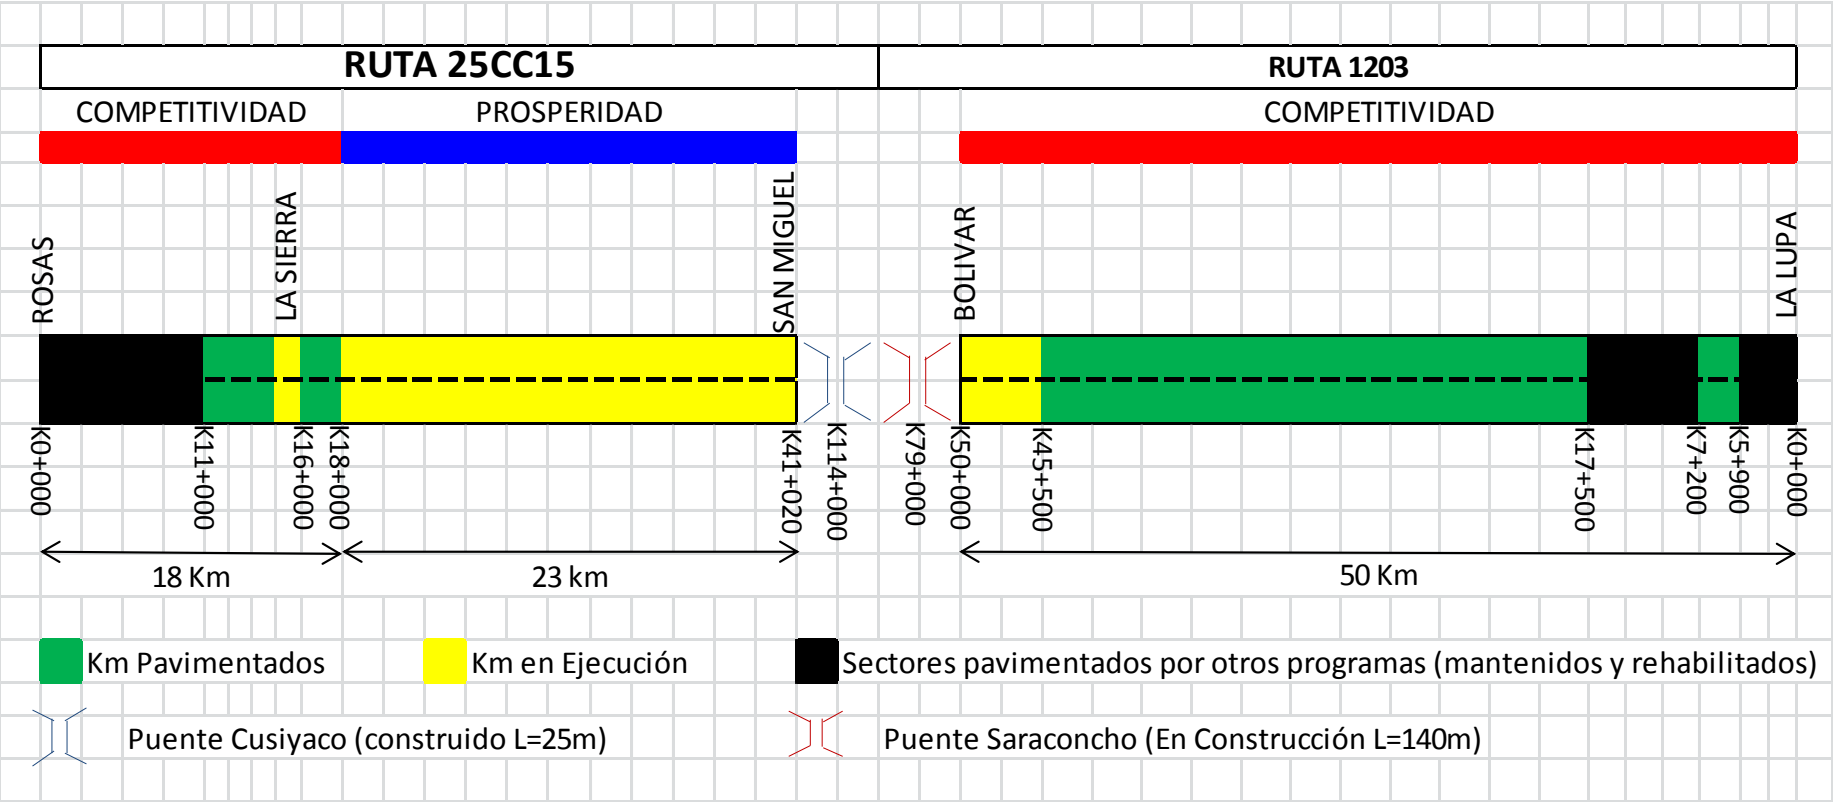


# ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

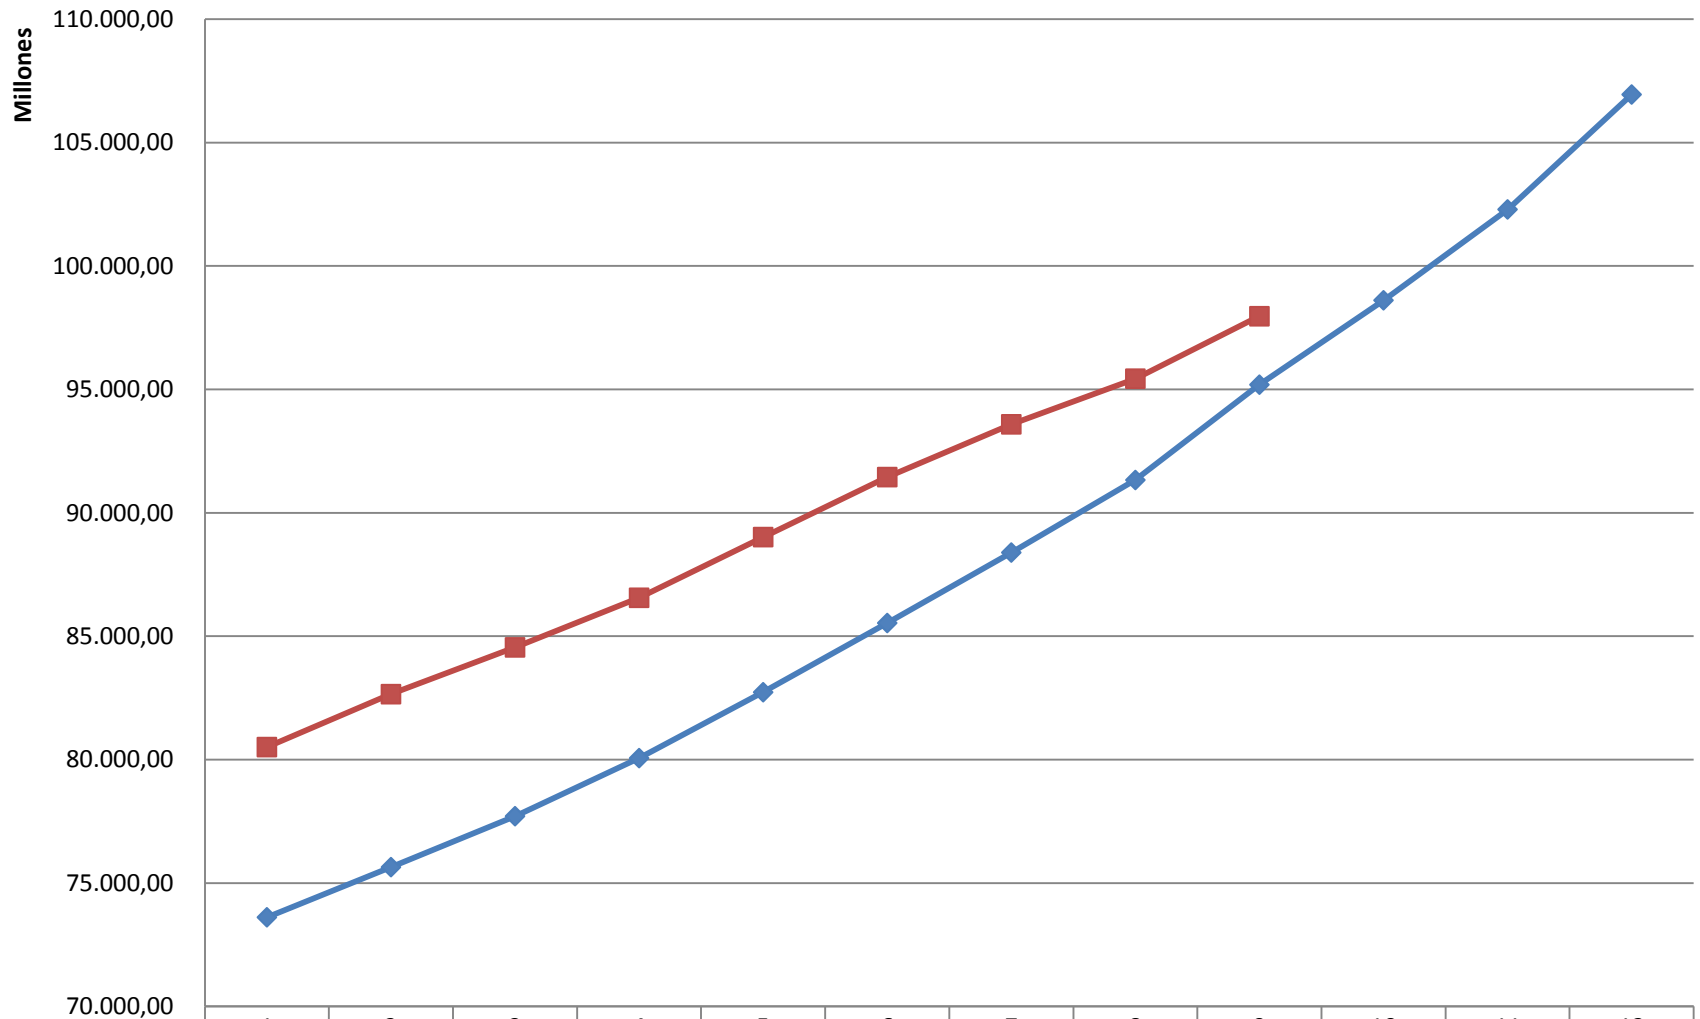

|               |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAMADO    | 73.613.4 | 75.644.9 | 77.708.8 | 80.062.73 | 82.731.49 | 85.535.19 | 88.391.37 | 91.330.01 | 95.192.80 | 98.611.21 | 102.292.7 | 106.948.1 |
| EJECUTADO     | 80.508.1 | 82.652.7 | 84.548.1 | 86.557.7  | 89.016.7  | 91.447.7  | 93.586.3  | 95.435.0  | 97.965.0  |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 1.956.59 | 2.031.55 | 2.063.84 | 2.353.910 | 2.668.764 | 2.803.701 | 2.856.177 | 2.938.639 | 3.862.786 | 3.418.417 | 3.681.545 | 4.655.384 |
| EJEC. MENSUAL | 2.826.74 | 2.144.60 | 1.895.43 | 2.009.597 | 2.459.012 | 2.431.00  | 2.138.593 | 1.848.67  | 2.530.00  |           |           |           |


# REGISTRO FOTOGRAFICO ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO FASE 1

## FOTOS FASE 1

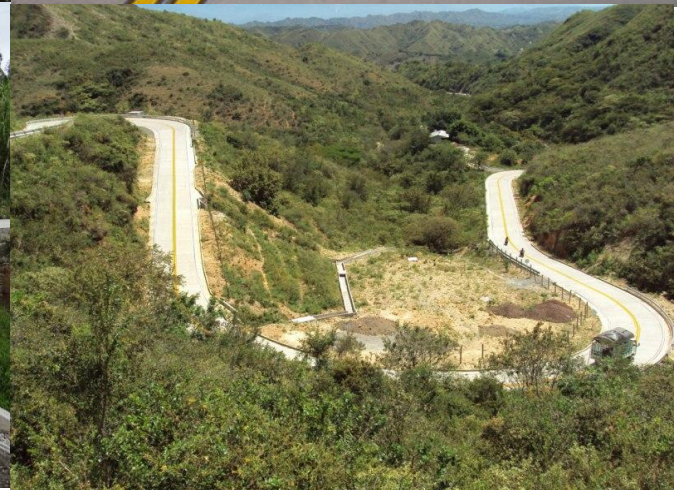

# CONTRATO INVIAS 853-09

## TRONCAL DEL NORDESTE. ANTIOQUIA

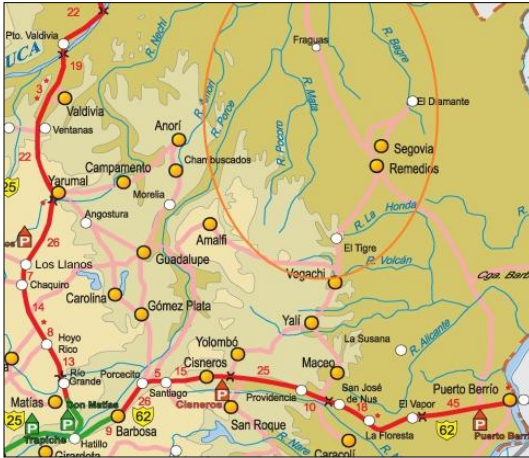

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA:</b>     | <b>No. 853 de 2009</b>              |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | Unión Temporal ICESGA               |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | ICEIN S.A.S 60%<br>ESGAMO S.A.S 40% |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ         |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | \$ 116.692.114.175,80               |
| <b>VIGENCIA 2013</b>         | \$ 20.636.229.765,00                |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>       | 48 meses                            |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 16 de Septiembre de 2009            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 15 de Septiembre de 2013            |


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | <b>No. 1464-2009</b>   |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | RESTREPO Y URIBE S.A.S |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | GERMAN GOMEZ TURRIAGO  |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>            | \$ 4.963.770.198,00    |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>            | 49 MESES               |

| <b>VALOR CONTRATO:</b> | \$ 116.692.114.175,8         | Metas totales del proyecto: |          |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                        |                              | Km<br>pavimentados          | puentes  |
| 2009                   | \$ 11.789.000.000,00         | 1                           |          |
| 2010                   | \$ 20.733.774.254,80         | 1.5                         |          |
| 2011                   | \$ 27.651.000.000,00         | 11.5                        |          |
| 2012                   | \$ 35.882.110.156,00         | 13                          | 1        |
| 2013                   | \$ 20.636.229.765,00         | 2.0                         | 1        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 116.692.114.175,80</b> | <b>29.5</b>                 | <b>2</b> |


| ITEM                          | TOTAL |
|-------------------------------|-------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):       | 100%  |
| KM PAVIMENTADOS (Km)          | 27    |
| KM REHABILITADOS Y MANTENIDOS | 38,6  |
| KM FALTANTES                  | 2,5   |

# CONTRATO INVIAS 853-09

## TRONCAL DEL NORDESTE. ANTIOQUIA

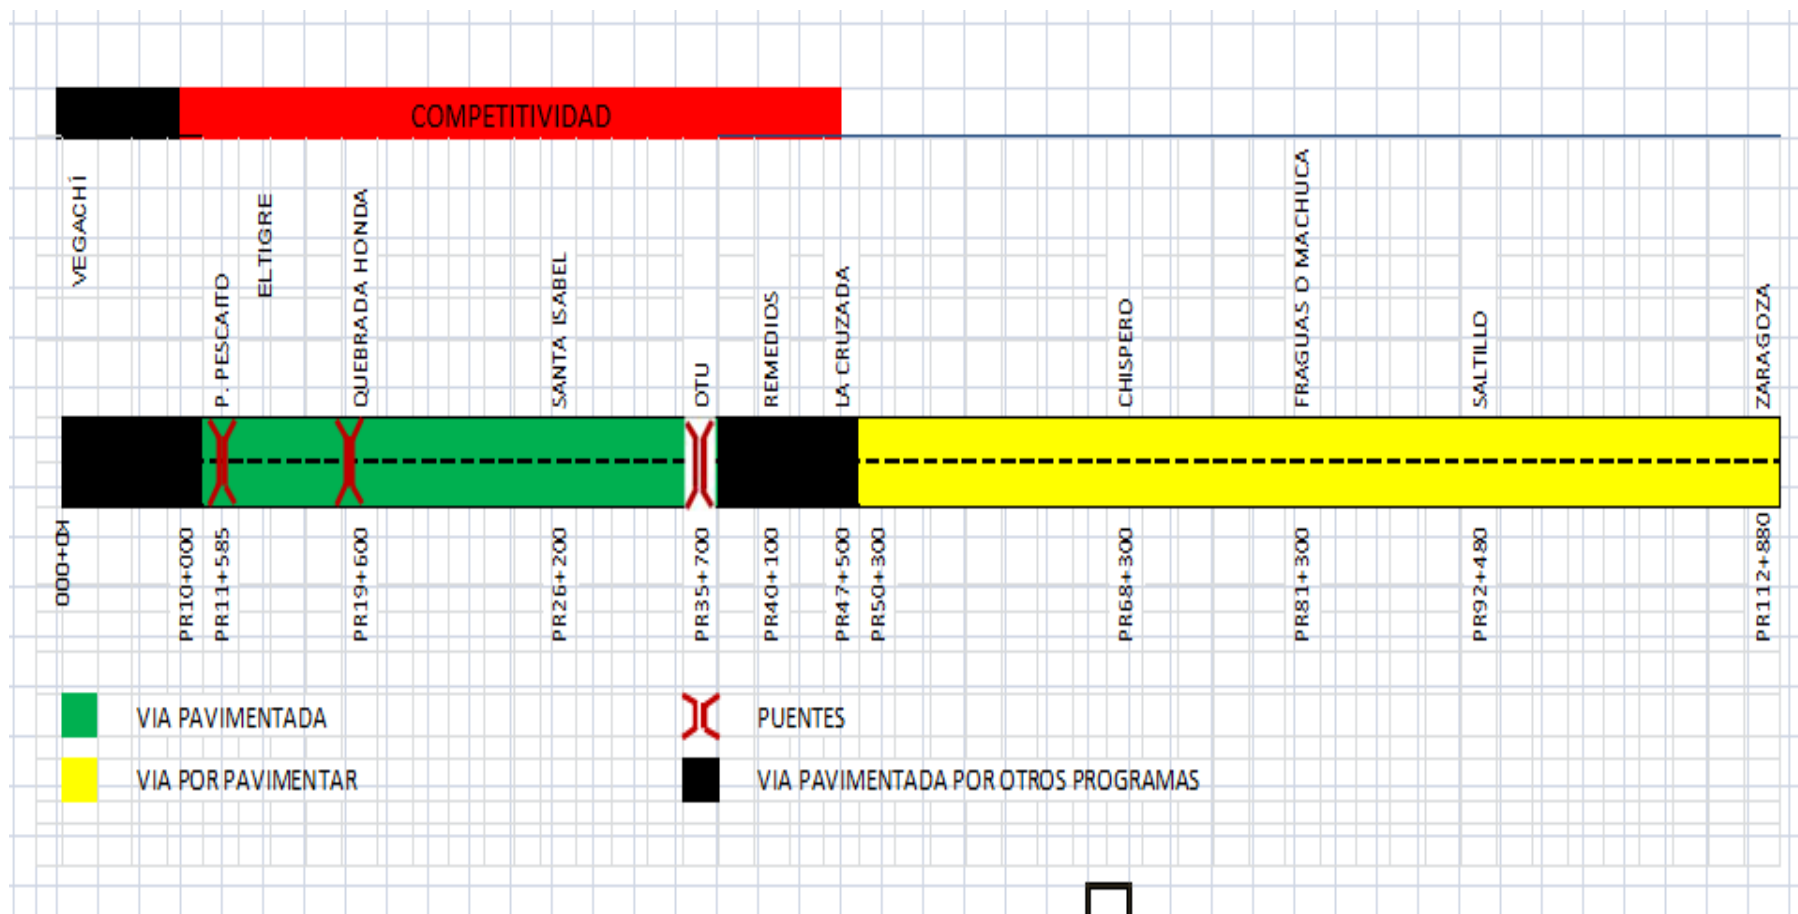

# TRONCAL DEL NORDESTE

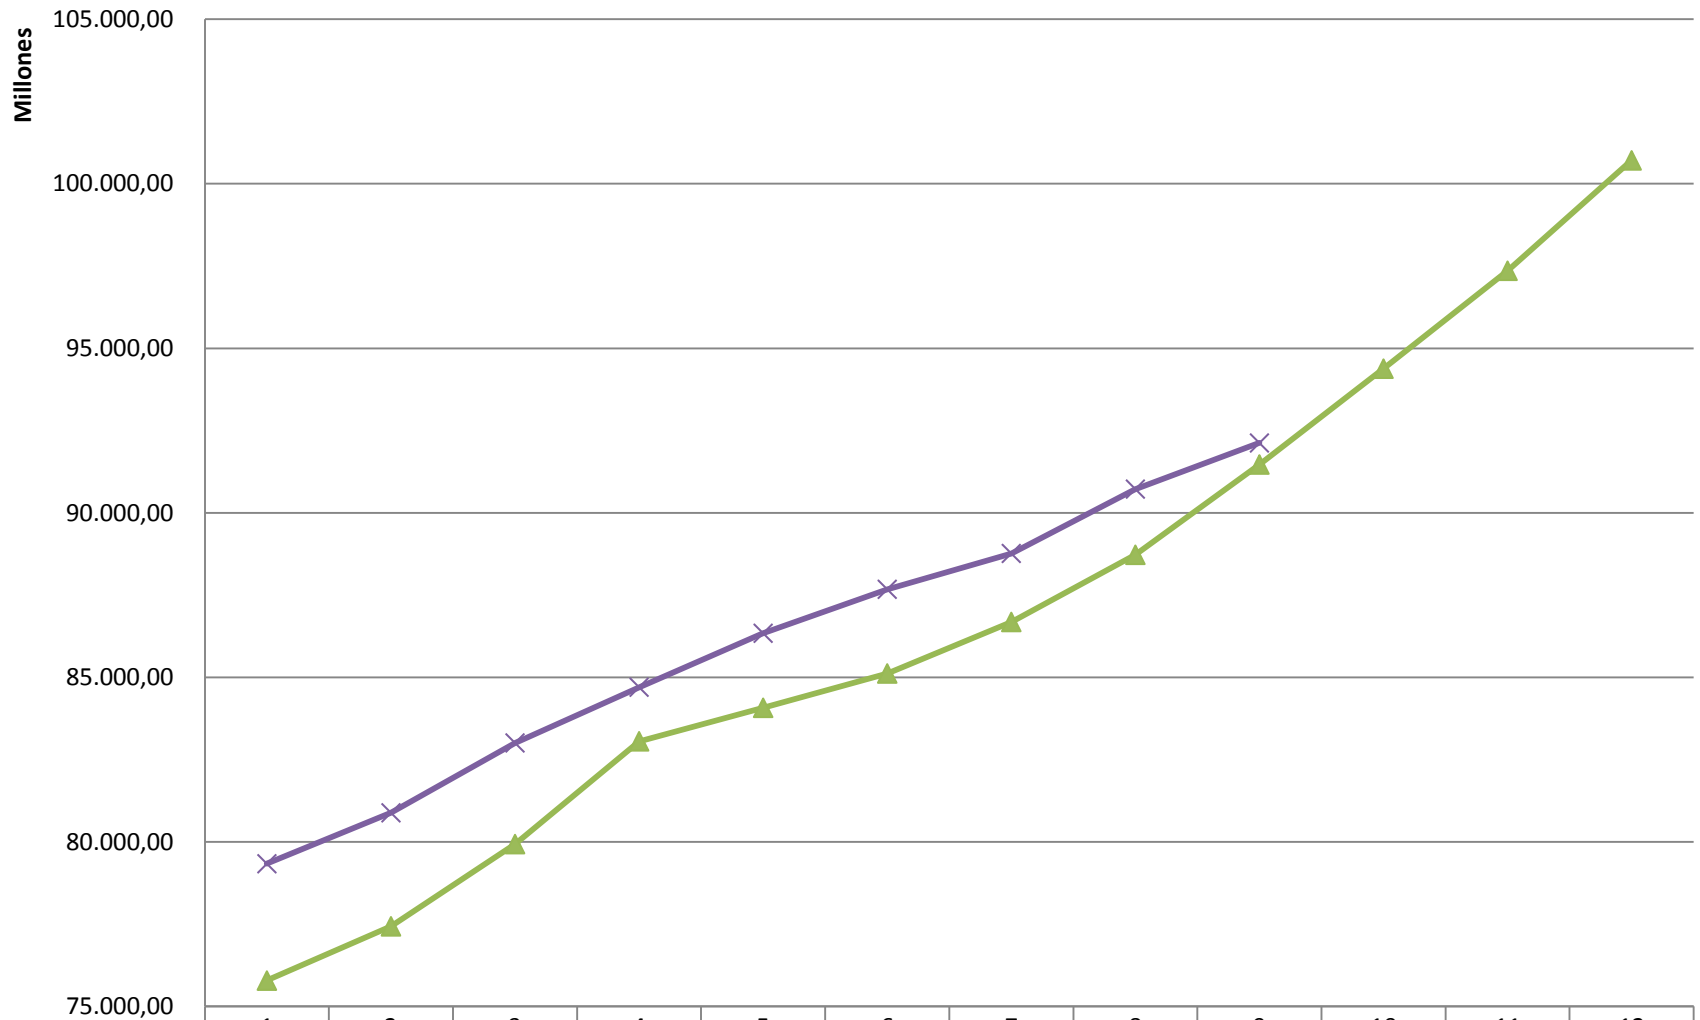

|               | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6        | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROGRAMADO    | 470.167. | 1.648.80 | 2.498.97 | 3.123.714 | 1.017.622 | 1.043.38 | 1.565.077 | 2.041.685 | 2.743.525 | 2.911.173 | 2.975.579 | 3.353.682 |
| EJECUTADO     | 725.648. | 1.547.95 | 2.123.09 | 1.692.866 | 1.638.536 | 1.336.45 | 1.090.085 | 1.955.46  | 1.400.84  |           |           |           |
| PROG. MENSUAL | 75.786.4 | 77.435.2 | 79.934.2 | 83.057.9  | 84.075.58 | 85.118.9 | 86.684.04 | 88.725.73 | 91.469.25 | 94.380.43 | 97.356.01 | 100.709.6 |
| EJEC. MENSUAL | 79.336.9 | 80.884.8 | 83.007.9 | 84.700.8  | 86.339.3  | 87.675.8 | 88.765.91 | 90.721.38 | 92.122.23 |           |           |           |

## REGISTRO AVANCE TRONCAL DEL NORDESTE




PR 30+676



Pavimento Hidráulico Frente de Obra N° 2



## VIA: SISGA – EL SECRETO (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BOYACA) PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA

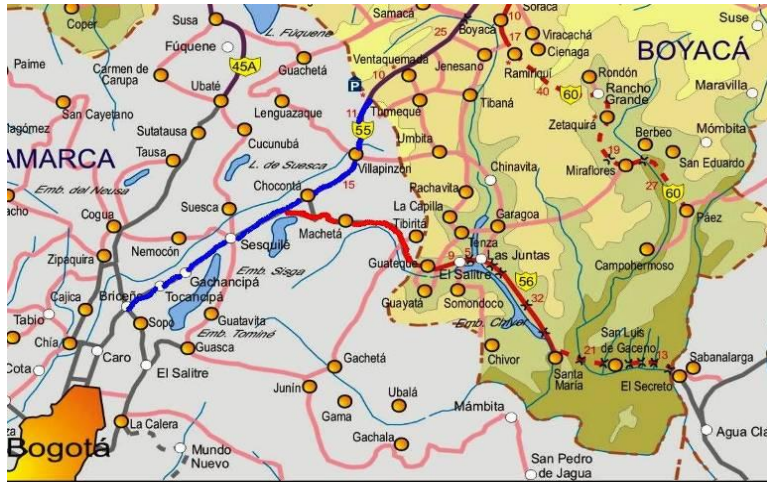

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENIO:</b>                                    | <b>No. 1154 de 2009</b>                                               |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA<br>CONSECCIONARIO SOLARTE SOLARTE |
| <b>VALOR CONTRATO<br/>ACTUALIZADO:</b>              | \$ 79.998.000.000                                                     |
| <b>VIGENCIA 2013</b>                                | \$ 16.800 millones                                                    |
| <b>PLAZO EN MESES:</b>                              | 72 MESES + 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO                                    |
| <b>FECHA DE ENTREGA DE<br/>LA VIA A LA AGENCIA:</b> | 17 DE MARZO DE 2010                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                        | 31 DE DICIEMBRE DE 2013 + 3 AÑOS DE<br>MANTENIMIENTO                  |

| CONVENIO 1154-09 | VALOR                 | RECURSOS GIRADOS      | KM<br>MEJORAMIENTO |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| VIGENCIA 2009    | 4.899.870.061         | 63.197.473.330        |                    |
| VIGENCIA 2010    | 15.877.229.218        |                       |                    |
| VIGENCIA 2011    | 22.314.042.720        |                       |                    |
| VIGENCIA 2012    | 20.106.331.331        |                       |                    |
| VIGENCIA 2013    | 16.800.526.670        | 16.800.526.670        | 12                 |
| <b>TOTAL</b>     | <b>79.998.000.000</b> | <b>63.197.473.330</b> | <b>12</b>          |

El INCO ejerce la Gerencia Integral del convenio proporcionando la asesoría técnica, jurídica, de coordinación, de control, supervisión, estructuración, coordinación y realización de todos los actos necesarios para la ejecución del Convenio.

## VIA: SISGA – GUATEQUE . PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA

### MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALZADA EXISTENTE



Avance mejoramiento calzada existente: 5 KM

## REGISTRO AVANCE TRANSVERSAL DEL SISGA




### GUATEQUE – SANTA MARIA



## TRANSVERSAL DE LA MACARENA

### TRANVERSAL DE LA MACARENA

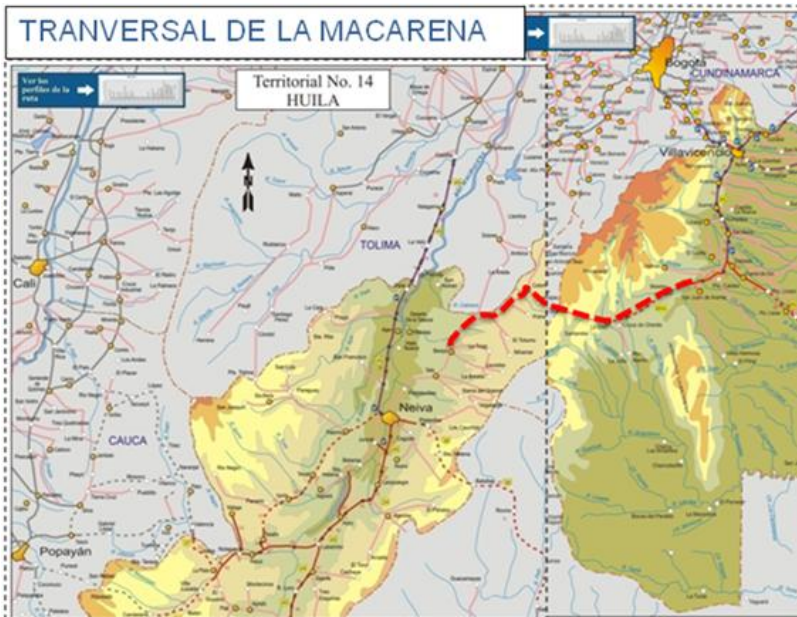


|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENIO:</b>             | 200925                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                                                                                                             |
| <b>COMPOSICIÓN:</b>          | GERENCIAR, PROMOCIONAR, EJECUTAR Y FINANCIAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS “CARRETERA DE LA SOBERANÍA” Y “TRANSVERSAL DE LA MACARENA” CORREDORES ARTERIALES DE COMPETITIVIDAD. |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>       | \$ 171.793.490.000                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO:</b>                | Cincuenta y Cinco (55) Meses                                                                                                                                               |
| <b>ORDEN DE INICIO:</b>      | 17 de Junio de 2009                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 31 de Diciembre de 2013                                                                                                                                                    |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>VIGENCIAS:</b> | 2009: \$ 22.343.000.000 |
|                   | 2010: \$ 37.493.000.000 |
|                   | 2011:                   |
|                   | 2012: \$ 51.595.490.000 |
|                   | 2013: \$ 60.362.000.000 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b> | 2093018              |
| <b>INTERVENTOR:</b>               | CONSORCIO INTARCOL   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>       | MARIA EUGENIA ORTIZ  |
| <b>VALOR ADJUDICADO:</b>          | \$ 7.629.031.024     |
| <b>PLAZO:</b>                     | Cincuenta (50) Meses |

# ALCANCE TRANSVERSAL DE LA MACARENA

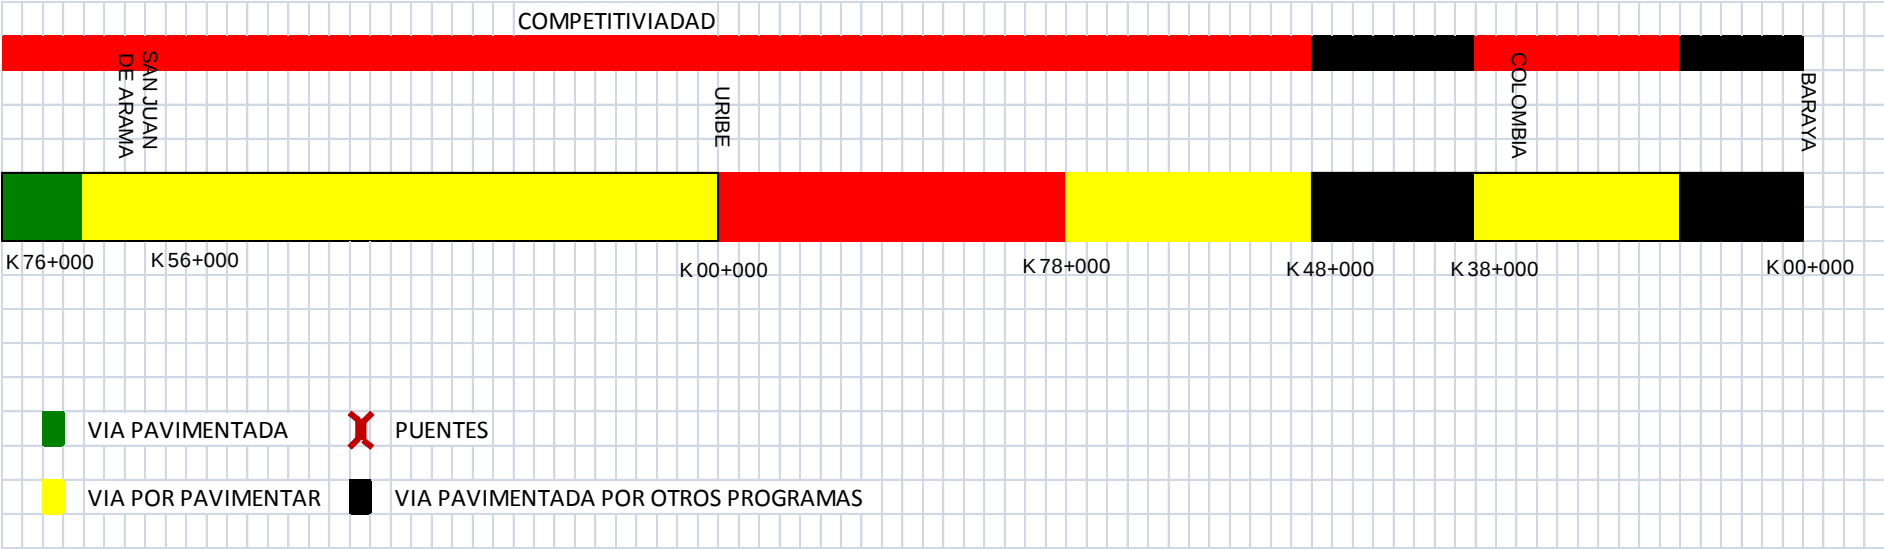


# REGISTRO AVANCE TRANSVERSAL DE LA MACARENA





## CARRETERA DE LA SOBERANÍA

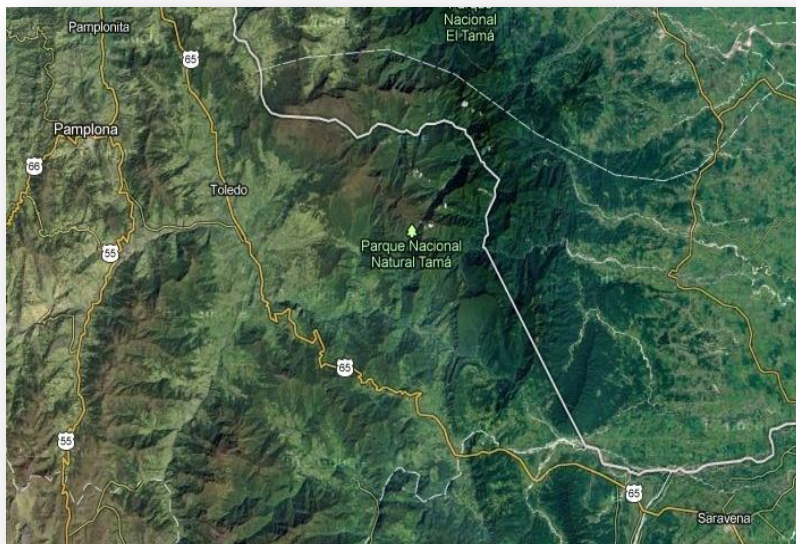


|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO:             | 200925                                                                                                                                                                     |
| CONTRATISTA:          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                                                                                                             |
| COMPOSICIÓN:          | GERENCIAR, PROMOCIONAR, EJECUTAR Y FINANCIAR LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CARRETERA DE LA SOBERANÍA" Y "TRANSVERSAL DE LA MACARENA" CORREDORES ARTERIALES DE COMPETITIVIDAD. |
| VALOR CONTRATO:       | \$116.398.000.000                                                                                                                                                          |
| PLAZO:                | Cincuenta y Cinco (55) Meses                                                                                                                                               |
| ORDEN DE INICIO:      | 17 de Junio de 2009                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de Diciembre de 2013                                                                                                                                                    |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| VIGENCIAS: | 2009: 16.152.000.000 |
|            | 2010: 27.123.000.000 |
|            | 2011: 13.000.000.000 |
|            | 2012: 29.468.000.000 |
|            | 2013: 30.655.000.000 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | 2093022                          |
| INTERVENTOR:               | CONSORCIO CORREDORES VIALES 2009 |
| REPRESENTANTE LEGAL:       | OMAR BARRAZA CORONEL             |
| VALOR ADJUDICADO:          | \$ 7.300.269.934                 |
| PLAZO:                     | Cincuenta (50) Meses             |

# ALCANCE CARRETERA DE LA SOBERANÍA

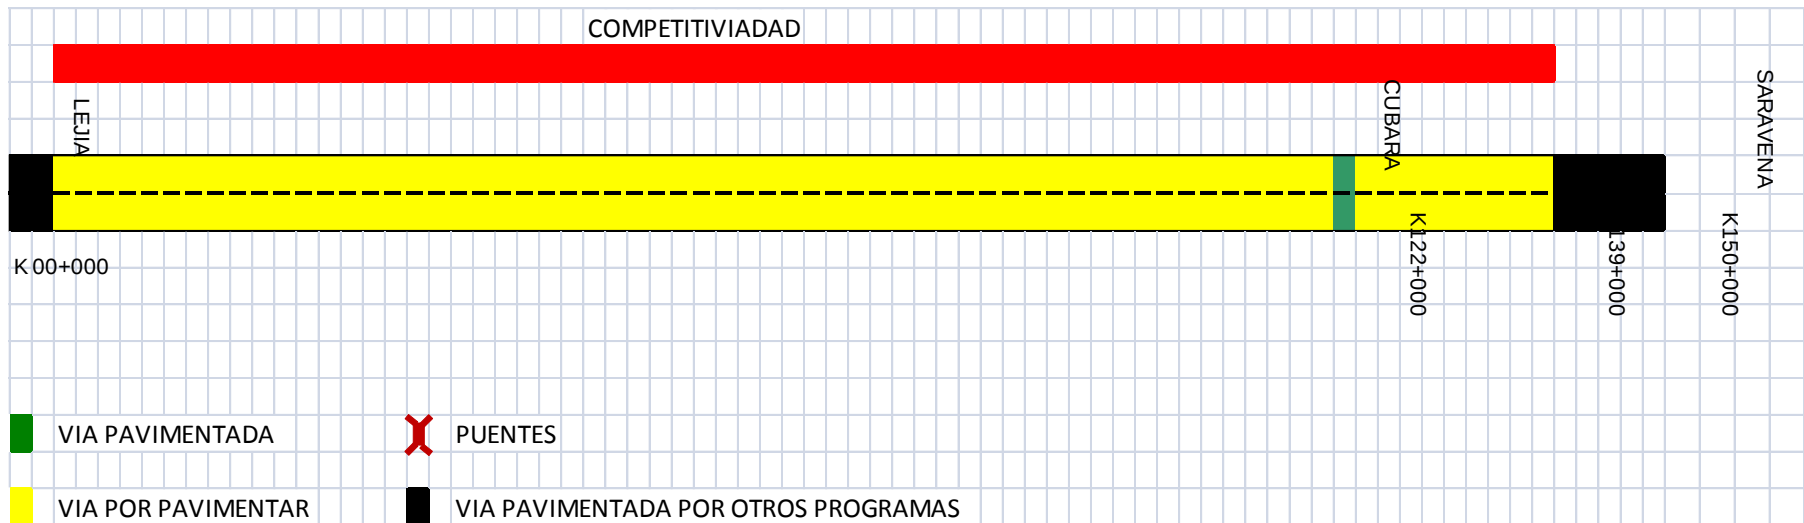

## REGISTRO AVANCE CARRETERA DE LA SOBERANIA



PAVIMENTACION PASO NACIONAL POR CUBARA

