




**Enero 27 de 2016**



## 1.2. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS CORREDOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

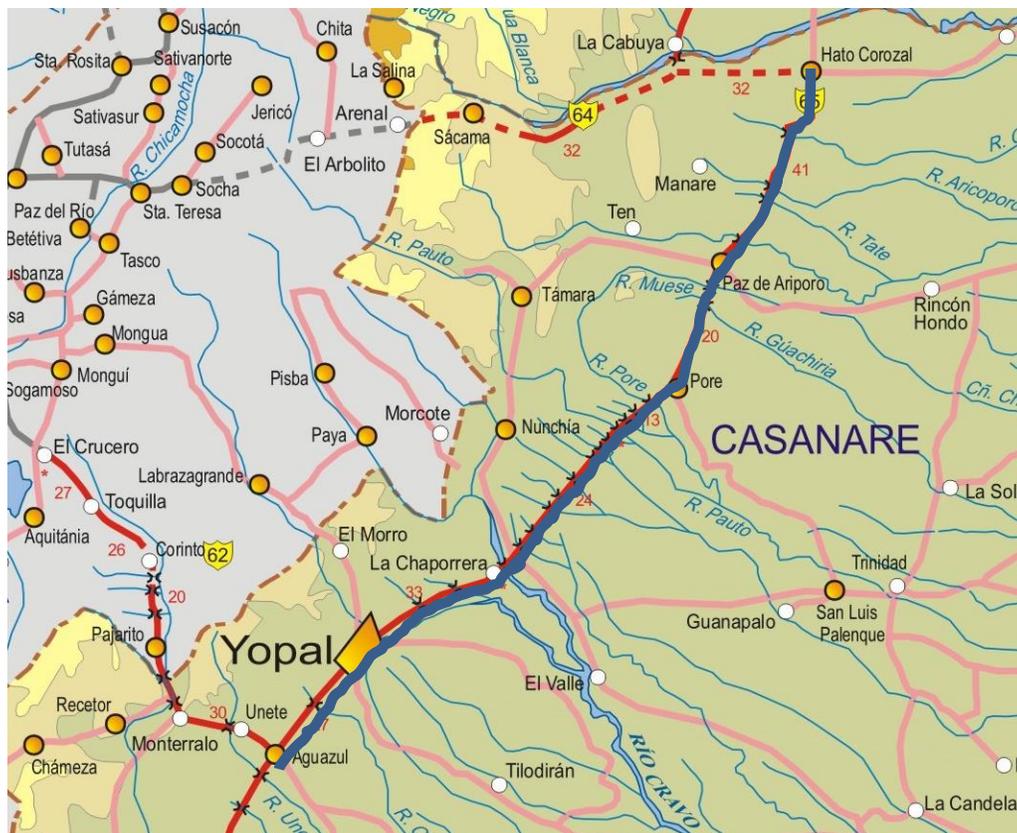

### Aguazul – Yopal – Hato Corozal

<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	<b>No. 2031 de 2012</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PROSPERIDAD 024
<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 68.392 millones
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	Diciembre de 2012
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	Marzo de 2016

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 2377-2012</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO SANTANDER 2013
<b>VALOR ADJUDICADO:</b>	\$5.252 millones

METAS FÍSICAS		
Rehabilitación (Km)	Mantenimiento Periódico (Km)	Sitios Críticos
40	41	1

<b>Avance:</b>	<b>93%</b>
----------------	------------



## 1.2. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

### OTRAS INVERSIONES - Puentes

Tota Inversiones: \$ millones

INTERVENCIÓN Y SU LOCALIZACIÓN	TOTAL	ESTADO
REHABILITACION DE PUENTES: Puente Ariporo de la carretera Paz de Ariporo - La Cabuya	\$1.115	EN EJECUCIÓN 80% TERMINACIÓN FEB16
<b>TOTAL</b>		

\*CIFRAS EN MILLONES



### 1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

#### OTRAS INVERSIONES – RED NACIONAL DE CARRETERAS

INTERVENCIÓN Y SU LOCALIZACIÓN	AVANCE	INICIO / TERMINACIÓN	VALOR
<b>PUENTE CRAVO SUR (LA CABUYA) EN LA CARRETERA YOPAL - ARIPORO</b> <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO IPV (INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS 40% OMAR AUGUSTO CARDOZO 30% RENAN CARDOZO 30%) <b>INTERVENTORÍA:</b> CONSORCIO PUENTES LA CABUYA 2015 (HACE INGENIEROS SAS 50% INFRAING SAS 50%)	TERMINADO	21/AGO/2015 30/DIC/2015	OBRA \$1.096 INTERV. \$220
<b>YOPAL-HATO COROZAL</b>	APROPIACIÓN DISPONIBLE 2016 - LICITACIÓN		\$2.500

\*CIFRAS EN MILLONES



## 1.2. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN—INVIAS

### CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

**Tota Inversiones 2010-2014: \$ 35.637 millones**

Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a \$35.637 millones. A continuación se detallan los recursos:

Año	Valor	No. De Convenios	Municipios
2010	\$1.850	2	3
2011	\$ 1.635	7	7
2012	\$ 10.509	9	11
2013	21.642	8	9



Antes



Después

### MT-BANCO DE MAQUINARIA

**Tota Inversiones: \$ 4.371 millones**

El Gobierno Nacional asignó al departamento de Casanare recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional. Esta inversión se representa en 17 de las siguientes máquinas:

- 4 volquetas sencillas
- 2 moto niveladoras
- 2 retroexcavadora de Orugas
- 1 retroexcavadora de llantas
- 2 vibro compactador de 7 Ton
- 1 cama baja con cabezote
- 1 bulldozer
- 4 carro tanque de agua

Fecha de Entrega al departamento: Noviembre 2013 y Abril 2014



## 3.1. MODO PORTUARIO Y FLUVIAL

### MUELLE

Total Inversiones en el departamento: \$ 3.575 millones

Intervención y Localización	VALOR \$millones
Construcción muelle La Poyata Municipio de Maní.(*)	3.575
<b>Total</b>	<b>3.575</b>

(\*) Fecha de inicio: Febrero 2014  
Fecha de terminación: Agosto 21/2015  
Avance: **TERMINADO**



**Enero 27 de 2016**
