




MinTransporte
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD
PARA TODOS

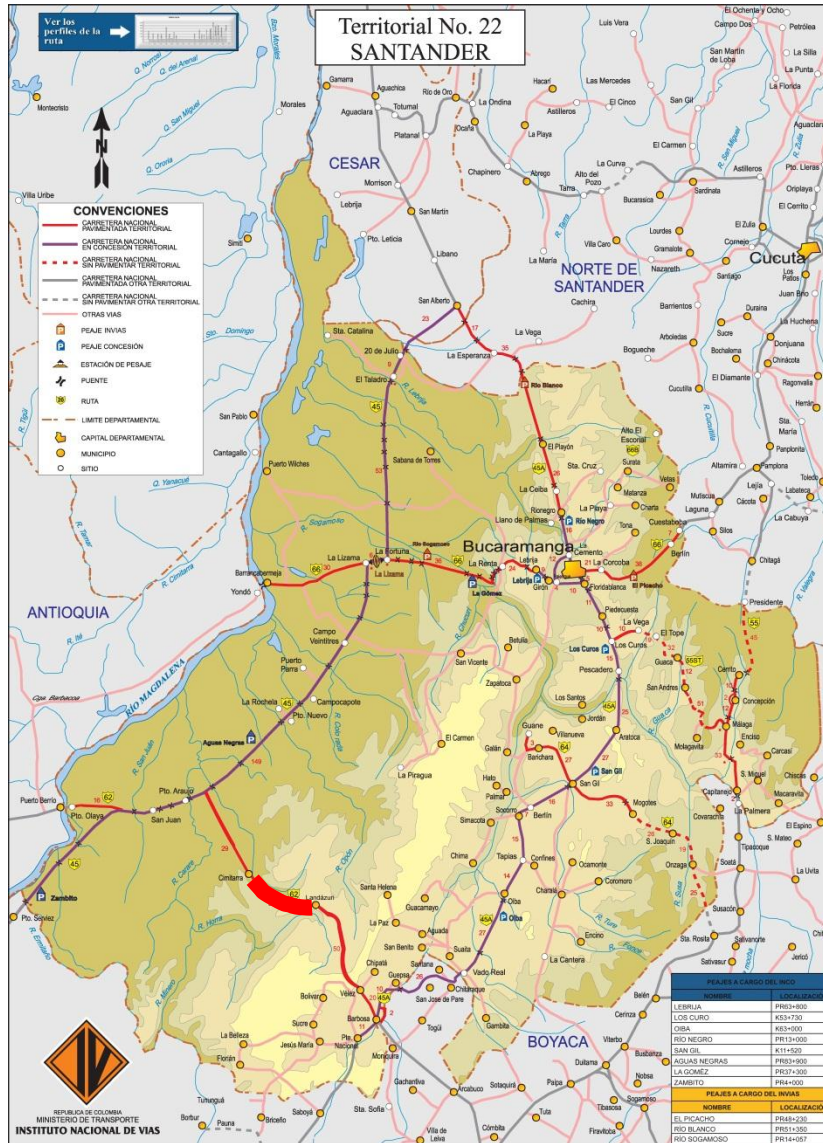

**VIA: CIMITARRA – LANDAZURI
(DEPARTAMENTO DE SANTANDER)
TRANSVERSAL DEL CARARE
LONGITUD DEL CORREDOR 28,7 Km.**



**EJECUTAR
ES NUESTRA RUTA**



VIA: CIMITARRA – LANDAZURI (DEPARTAMENTO DE SANTANDER) TRANSVERSAL DEL CARARE FASE 2



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| CONTRATO DE OBRA: | No. 526 de 2012 |
| CONTRATISTA: | MARIO HUERTAS COTES |
| VALOR CONTRATO: | \$ 76.512.941.430,00 |
| PLAZO EN MESES: | 27 MESES |
| ORDEN DE INICIO: | 31 de Julio de 2012 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 de Octubre de 2014 |
| EJECUCION A LA FECHA | \$ 17.084.553.321 |

| VALOR CONTRATO: | 76.512.941.430 | METAS | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| | | Km Pavimentados | N° Puentes |
| VIGENCIA 2012 | \$ 12.130.719.207 | 0 | |
| VIGENCIA 2013 | \$ 15.075.555.556 | 4 | |
| VIGENCIA 2014 | \$ 49.306.666.667 | 7 | 1 |
| TOTAL | \$ 76.512.941.430 | 11 | 1 |


| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | No. 624-2012 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VIAS PRIORITARIAS |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$2.079.943.885.00 |
| PLAZO EN MESES: | 28 MESES |

| AVANCE DEL CONTRATO | |
|-----------------------------------|--------------|
| ITEM | TOTAL |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): | 100,00 |
| KM PAVIMENTADOS | 0,20 |
| KM MANTENIMIENTO PERIODICO | 11,10 |
| KM DE EXPLANACION | 5 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| ANTICIPAR VIGENCIA 2014 | 20.320.000.000 |
| Km previstos a intervenir | 4 |



ALCANCE DE INTERVENCIÓN TRANSVERSAL DEL CARARE CIMITARRA – LANDAZURI LONGITUD DEL CORREDOR 28,7

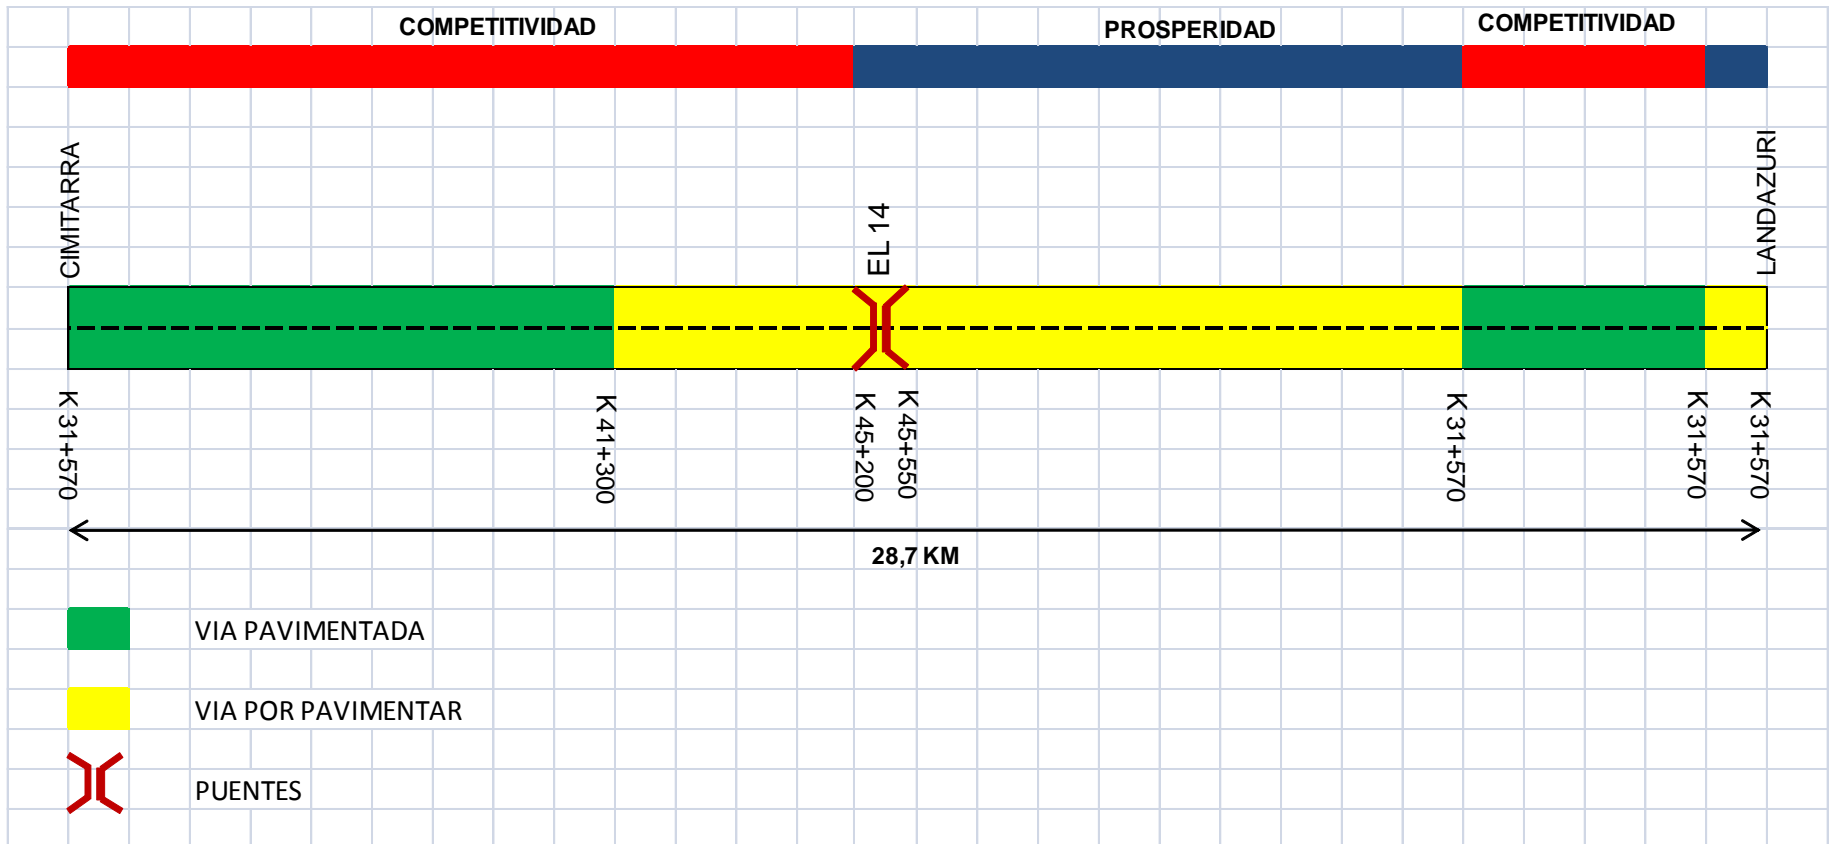

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE FASE 2

