




# VIA: LOS ALMENDROS – PUERTO CONCORDIA - PUENTE NOWEN SAN JOSE DEL GUAVIARE (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE) LONGITUD DEL CORREDOR 65 Km.



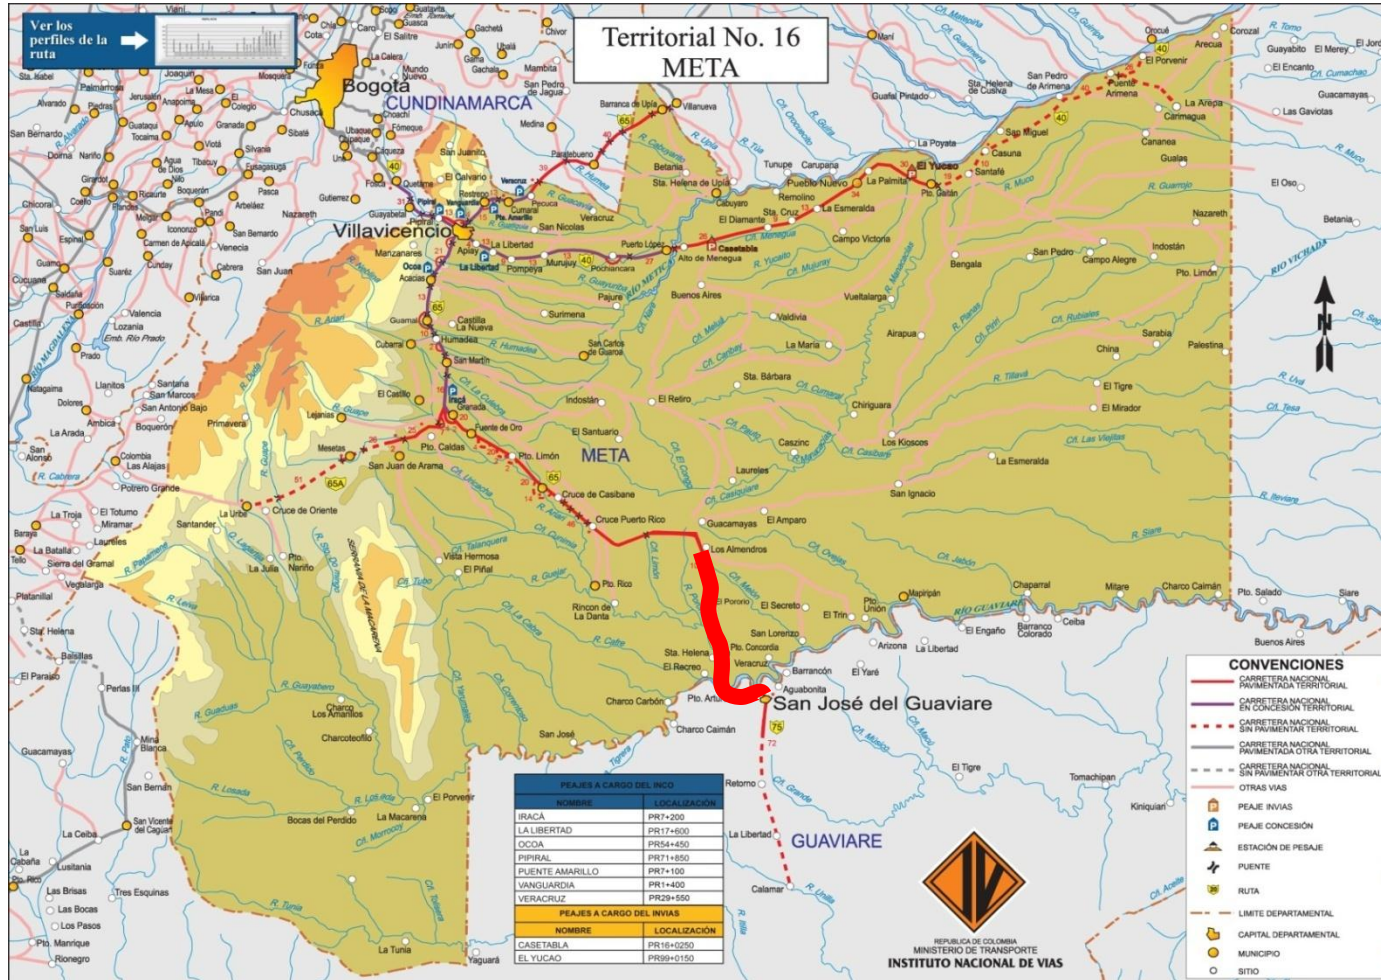

## VIA: SAN JOSE DEL GUAVIARE – PUENTE NOWEN (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE) CORREDOR DE LAS PALMERAS FASE 2



<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	<b>No. 582 de 2012</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL CORREDOR PALMERA 2012
<b>COMPOSICIÓN:</b>	HIFO S.A., AULI FERNANDO VELANDIA, CONSTRUCTORA FG S.A.
<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 22.153.882.234
<b>PLAZO EN MESES:</b>	15 MESES
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	21 de SEPTIEMBRE de 2012
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	22 de diciembre de 2013
<b>EJECUCION ACTUAL</b>	16.688.797.000

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 635-2012</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	DIEGO IGNACIO ARENAS
<b>VALOR ADJUDICADO:</b>	\$1.123.000.000
<b>PLAZO EN MESES:</b>	16 MESES


VALOR CONTRATO:	22.153.882.234,00	Metas totales del proyecto:	
		Km pavimentados	puentes
<b>VIGENCIA 2012</b>	\$ 12.827.682.234	0	0
<b>VIGENCIA 2013</b>	\$ 9.326.200.000	5.5	0
<b>VIGENCIA 2014</b>			0
<b>TOTAL</b>	\$ 22.153.882.234	5.5	0

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	3.5
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	7
KM DE EXPLANACION	4.5



# VIA: LOS ALMENDROS – PUERTO CONCORDIA - PUENTE NOWEN SAN JOSE DEL GUAVIARE (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE)

LONGITUD DEL CORREDOR 65 Km.

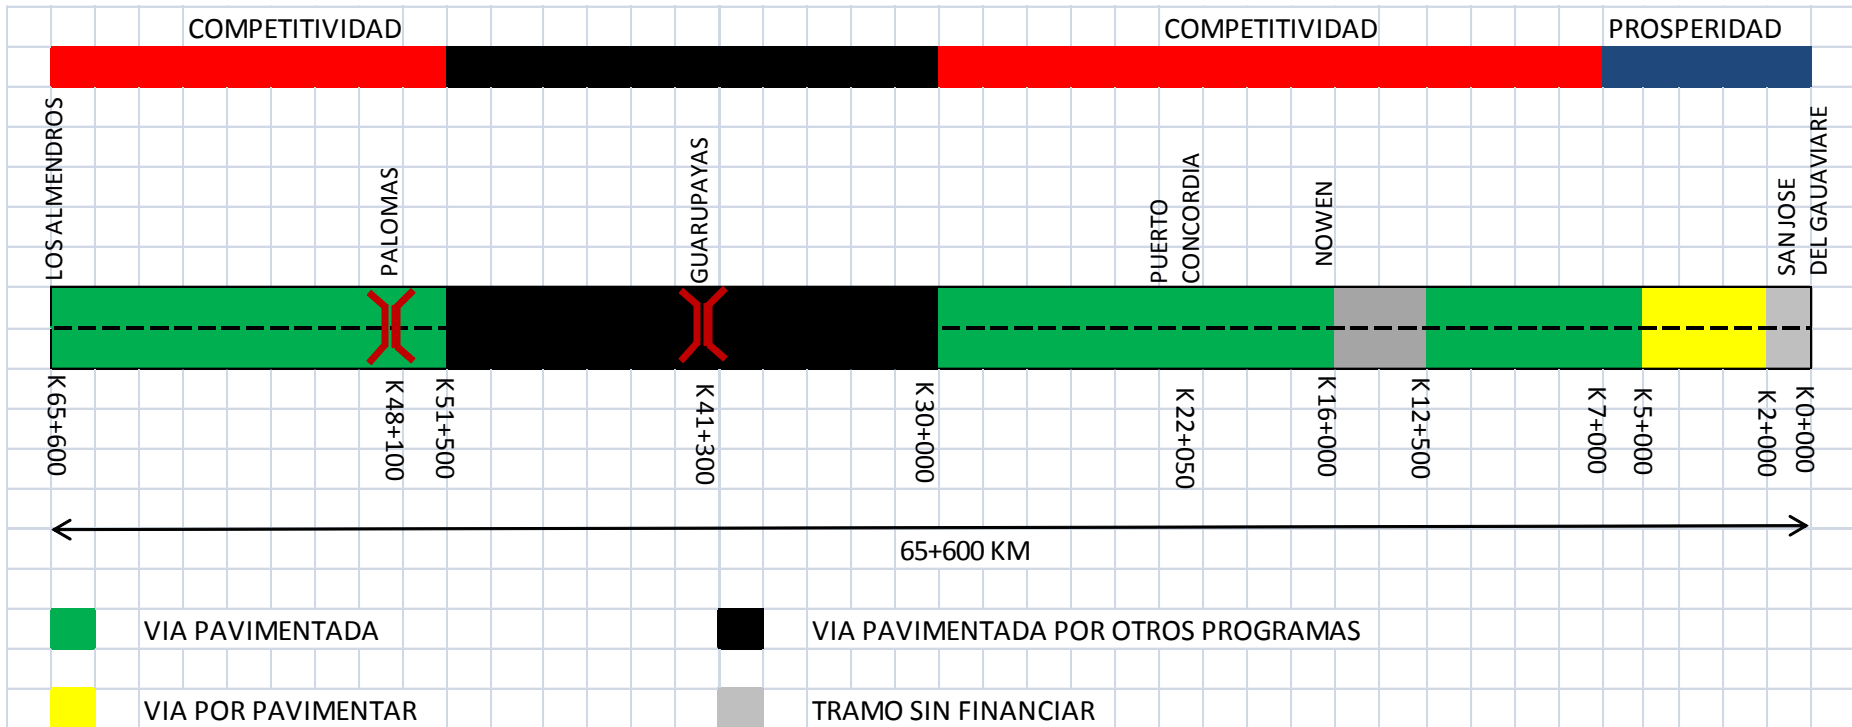

## VIA: LOS ALMENDROS – PUERTO CONCORDIA - PUENTE NOWEN SAN JOSE DEL GUAVIARE (DEPARTAMENTO DE META - GUAVIARE)

