




La movilidad
es de todos

Mintransporte

ATLÁNTICO

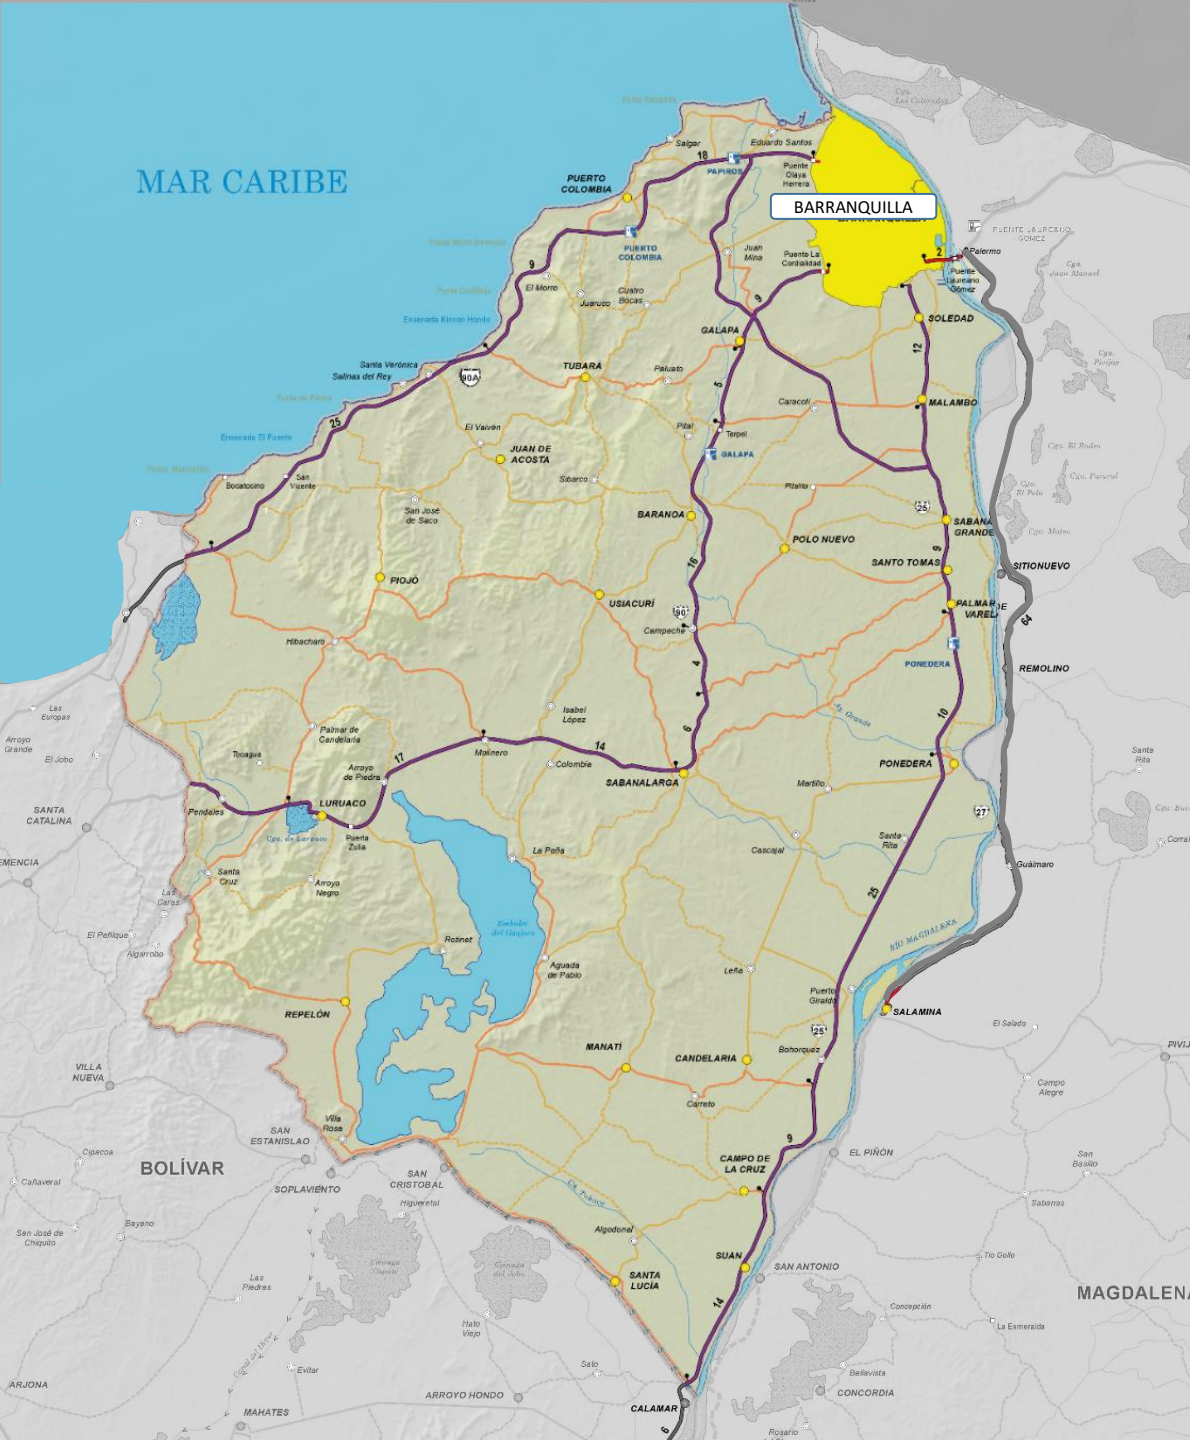

\$ 2,5 Billones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

23



Km. Vías intervenidas

223



EMPLEOS ACTUALES

1.502



NUEVOS EMPLEOS

4.323

1. RED NACIONAL:

\$ 2.417.638

Proyectos generales

2.414.039

Mantenimientos

3.599

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$82.349

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$13.820

4. MARÍTIMA Y FLUVIAL

\$7.078

1. RED NACIONAL



\$ 2,4
Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	10	1 FIRMADO 1 ADJUDICADO 3 EJECUCIÓN 5 TERMINADOS	49	\$ 2.414.039
2	MANTENIMIENTOS	1	1 EN EJECUCIÓN	73	\$ 3.599
TOTAL		11		122	\$ 2.417.638

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 2,4
Billones



49 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						48,8		\$ 2.414.039
1	CARTAGENA, BARRANQUILLA	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA CARTAGENA - BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA: 1674-2015 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1738-2015	ene-16	jul-22	10,4 KM CONTRUCCIÓN 6 PUENTES VEHICULARES 2 PUENTES PEATONALES	99%	\$ 140.990
2	CIÉNAGA, BARRANQUILLA	CONEXIÓN CIÉNAGA - BARRANQUILLA (VÍADUCTOS)	CONTRATODE OBRA: 981-2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 977-2022	mar-22	dic-25	9	ADJUDICADO	\$ 648.007
3	CIÉNAGA, BARRANQUILLA	ATENCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA Y PUNTOS CRÍTICOS	CONTRATO DE OBRA: 1119-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1129-2021	jun-21	jul-22	1,5	85%	\$ 18.000
4	BARRANQUILLA, PUERTO COLOMBIA	VÍA BARRANQUILLA - PUERTO COLOMBIA	CONVENIO DE OBRA: 2018-2021	-	-	4 KM VÍA CONSTRUIDA	FIRMADO	\$ 102.205
5	PALERMO-SITIONUEVO-REMOLINO-GUAIRAMO	VÍA LA PROSPERIDAD	CONTRATO DE OBRA: 649-2013 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3795-2013	may-13	dic-20	52 KM MEJORAMIENTO 52 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 485.050
6		CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PUENTE PUMAREJO.	CONVENIO DE OBRA: 1884-2021	nov-21	jul-22	-	70%	\$ 3.214
7	BARRANQUILLA, SITIO NUEVO \$669 mil millones	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO BARRIO LA CHINITA - VÍA BARRANQUILLA - SANTA MARTA (PUENTE PUMAREJO)	CONTRATO DE OBRA: 1385-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1431-2020	oct-20	dic-21	0,6	TERMINADO	\$ 9.321
8		CONSTRUCCIÓN PUENTE PUMAREJO	CONTRATO DE OBRA: 642-2015 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 644-2015	may-15	mar-20	3,2	TERMINADO	\$ 801.169
9	BARRANQUILLA \$206 mil millones	MEJORAMIENTO DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (CARRERA 38)	CONTRATO DE OBRA: 1676-2015 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1745-2015	ene-16	jun-20	1	TERMINADO	\$ 106.083
10		MALECÓN VERDE Y AVENIDA DEL RIO BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA: 1280-2019	jul-19	dic-19	2	TERMINADO	\$ 100.000

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 3.599
Millones



73 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					73		\$ 3.599
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2215-2019, 2522-2019	dic-19	jul-22	73	95%	\$ 3.599

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



\$ 82.348
Millones



19 Municipios

105 Km

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	30	28 EN EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	\$ 55.016	18
2	CONVENIOS ESPECIALES	2	2 EN EJECUCIÓN	\$ 17.425	2
3	OCAD PAZ	1	1 EN EJECUCIÓN	\$ 9.907	1
TOTAL		33		\$ 82.348	19

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 55.016
Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	CANDELARIA	JUANA PABLA	CONVENIO: 2577-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1268-2020	nov-20	dic-21	6,35	0,67 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 6,35KM DE MANTENIMIENTO 6,25 KM DE MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.111
2	GALAPA	GALAPA PETRONITAS - ALPES DE SEVILLA	CONVENIO: 2589-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1268-2020	nov-20	dic-21	8,6	0,35 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 8,6 KM DE MANTENIMIENTO 8,2 KM DE MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 900
3	BARANOA	VIA RIOMAR - VIA A USIACURÍ SECTOR VEREDA LAS PALMITAS	CONVENIO: 1716-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	6,9	0,56 KM DE PLACA HUELLA 6,9 KM DE MANTENIMIENTO 6,7 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 744
4	CAMPO DE LA CRUZ	VIA TRONCO QUEMAO	CONVENIO: 1715-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	2,29	0,38 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 2,29 KM DE MANTENIMIENTO 2,1 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 659
5	PALMAR DE VARELA	VIA BURRUSCO	CONVENIO: 1678-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	2,8	0,61 KM DE PLACA HUELLA 2,8 KM DE MANTENIMIENTO 2,3 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 659
6	PONEDERA	CAMINO BREMEN CASTRO	CONVENIO: 1683-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	3,63	0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3,63 KM DE MANTENIMIENTO 3,4 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 864
7	PUERTO COLOMBIA	PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO	CONVENIO: 1718-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	3,72	0,26 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 3,72 KM DE MANTENIMIENTO 3,4 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 427
8	SANTA LUCÍA	RUTA SANTA LUCIA , MANATI, EL LIMON	CONVENIO: 1717-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	14	0,41 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 14 KM DE MANTENIMIENTO 13 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 788
9	POLONUEVO	VÍA POLONUEVO CAMINO LA MONTAÑA LA BATEA	CONVENIO: 1895-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	3,6	0,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3,6 KM DE MANTENIMIENTO 3,2 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 868
10	SUAN	SUAN - PUNTA GORDA	CONVENIO: 1938-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	5,4	0,39 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 5,4 KM DE MANTENIMIENTO 5,1 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 748
11	USIACURÍ	USIACURI - CORREGIMIENTO DE VILLA LATA. PIOJÓ	CONVENIO: 2031-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1400-2021	ene-22	dic-22	5,8	0,74 KM DE PLACA HUELLA 5,8 KM DE MANTENIMIENTO 5,4 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 908
12	BARANOA	VÍA CAMPECHE	CONVENIO: 837-2021	ene-22	dic-22		-	EJECUCIÓN	\$ 3.284

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	BARANOVA	ANTIGUA VÍA BARANOVA – PUEBLO NUEVO	CONVENIO: 934-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 3.745
14	CAMPO DE LA CRUZ	VÍA PASABARRO	CONVENIO: 832-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 3.112
15	GALAPA	VÍA CUATRO BOCAS	CONVENIO: 836-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 3.066
16	POLONUEVO	VÍA POLONUEVO - CAMPECHE	CONVENIO: 833-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 3.666
17	SABANALARGA	MEJORAMIENTO EN PLACA HIELLA VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE	CONVENIO: 1974-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	3,70 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 4.770
18	PUERTO COLOMBIA	MANTENIMIENTO VIA LAS PERDICES	CONVENIO: 1877-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 4.500
19	PIOJÓ	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA EL CERRITO- RESERVA	CONVENIO: 1879-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	2,48 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 3.746
20	POLONUEVO	MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - MALAMBO, MUNICIPIO DE	CONVENIO: 1885-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	1,30 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 3.330
21	CANDELARIA	VIA EL BLANCO	CONVENIO: 1740-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	0,70 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 1.800
22	PONEDERA	VIA LA OLIMPICA	CONVENIO: 1745-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	0,70 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 1.800
23	PALMAR DE VARELA	VIA LOS MANGUITOS	CONVENIO: 1744-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	1,26 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 1.800
24	SABANALARGA	VIA CASERIO PATILLA	CONVENIO: 1746-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	1,45 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 1.800

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
25	LURUACO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN JUAN DE TOCAGUA - MARIA JACINTA - PALMAR DE CANDELARIA	CONVENIO: 2071-2021 PROCESO INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-196-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 1.800
26	LURUACO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LURUACO-MATEO-BARRIGÓN	CONVENIO: 1315-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2155-2021	ene-22	dic-22	6,8	0,57 KM DE PLACA HUELLA 6,8 KM DE MANTENIMIENTO 6,4 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 915
27	MANATÍ	MANATI - MALABET	CONVENIO: 1278-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2155-2021	ene-22	dic-22	8,6	0,57 KM DE PLACA HUELLA 8,6 KM DE MANTENIMIENTO 8,4 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 881
28	SABANAGRANDE	VIA SAN MARTIN	CONVENIO: 1279-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2155-2021	ene-22	dic-22	7,3	0,54 KM DE PLACA HUELLA 7,3 KM DE MANTENIMIENTO 7,1 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 765
29	SABANALARGA	VIA RANCHO ALEGRE - MIRADOR- GALLEGO - CARRETERA A MANATI	CONVENIO: 1326-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2155-2021	ene-22	dic-22	12,8	0,47 KM DE PLACA HUELLA 12,8 KM DE MANTENIMIENTO 12,3 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 905
30	SANTO TOMÁS	VIA BONIZA - GUAZIMAL	CONVENIO: 1324-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2155-2021	ene-22	dic-22	6,5	0,41 KM DE PLACA HUELLA 6,5 KM DE MANTENIMIENTO 6,2 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 655

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 17.425
Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	REPELON	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO DE LA VIA BANCO-TOTUMO-BIJIBANA DEL MUNICIPIO DE REPELON	-	-	6,25 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 11.300
2	SANTO TOMÁS	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE CONDUCEN A LOS CORREGIMIENTOS DE ANDREA Y EL PELÚ EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	-	-	3,14 KM KM DE PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 6.125

2.3. OCAD PAZ



\$ 9.907
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	LURUACO	VÍA SANTA CRUZ - SOCAVONES - PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD)	nov-20	jul-22	5,8 KM PAVIMENTO	EJECUCIÓN	\$ 9.907

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



\$ 13.820
Millones



18 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						18		\$ 13.820
1	BARRANQUILLA, PALERMO, TASAJERA, LA VIRGEN	VIADUCTOS PR 19 Y PR28 VÍA CIÉNAGA - BARRANQUILLA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2752-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2754-2019	feb-20	mar-22	8	TERMINADO	\$ 7.881
2	BARRANQUILLA	COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE PUMAREJO	CONTRATO DE CONSULTORIA: 1801-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1805-2020	mar-21	jun-22	1 unidad	77%	\$ 5.393
3	SALAMINA, PUERTO GIRALDO	CONEXIÓN SALAMINA - PUERTO GIRALDO (PUENTE LA HERMANDAD)	CONTRATO DE OBRA: 2454-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2715-2019	mar-20	ene-21	10	TERMINADO	\$ 546

4. MARÍTIMA Y FLUVIAL



\$ 7.078
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMERO CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						1		\$ 7.078
1	BARRANQUILLA	MEJORAMIENTO DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA: 828-2017 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 919-2017	sep-17	mar-20	1	TERMINADO	\$ 7.078
