




La movilidad  
es de todos

Mintransporte

# BOLÍVAR

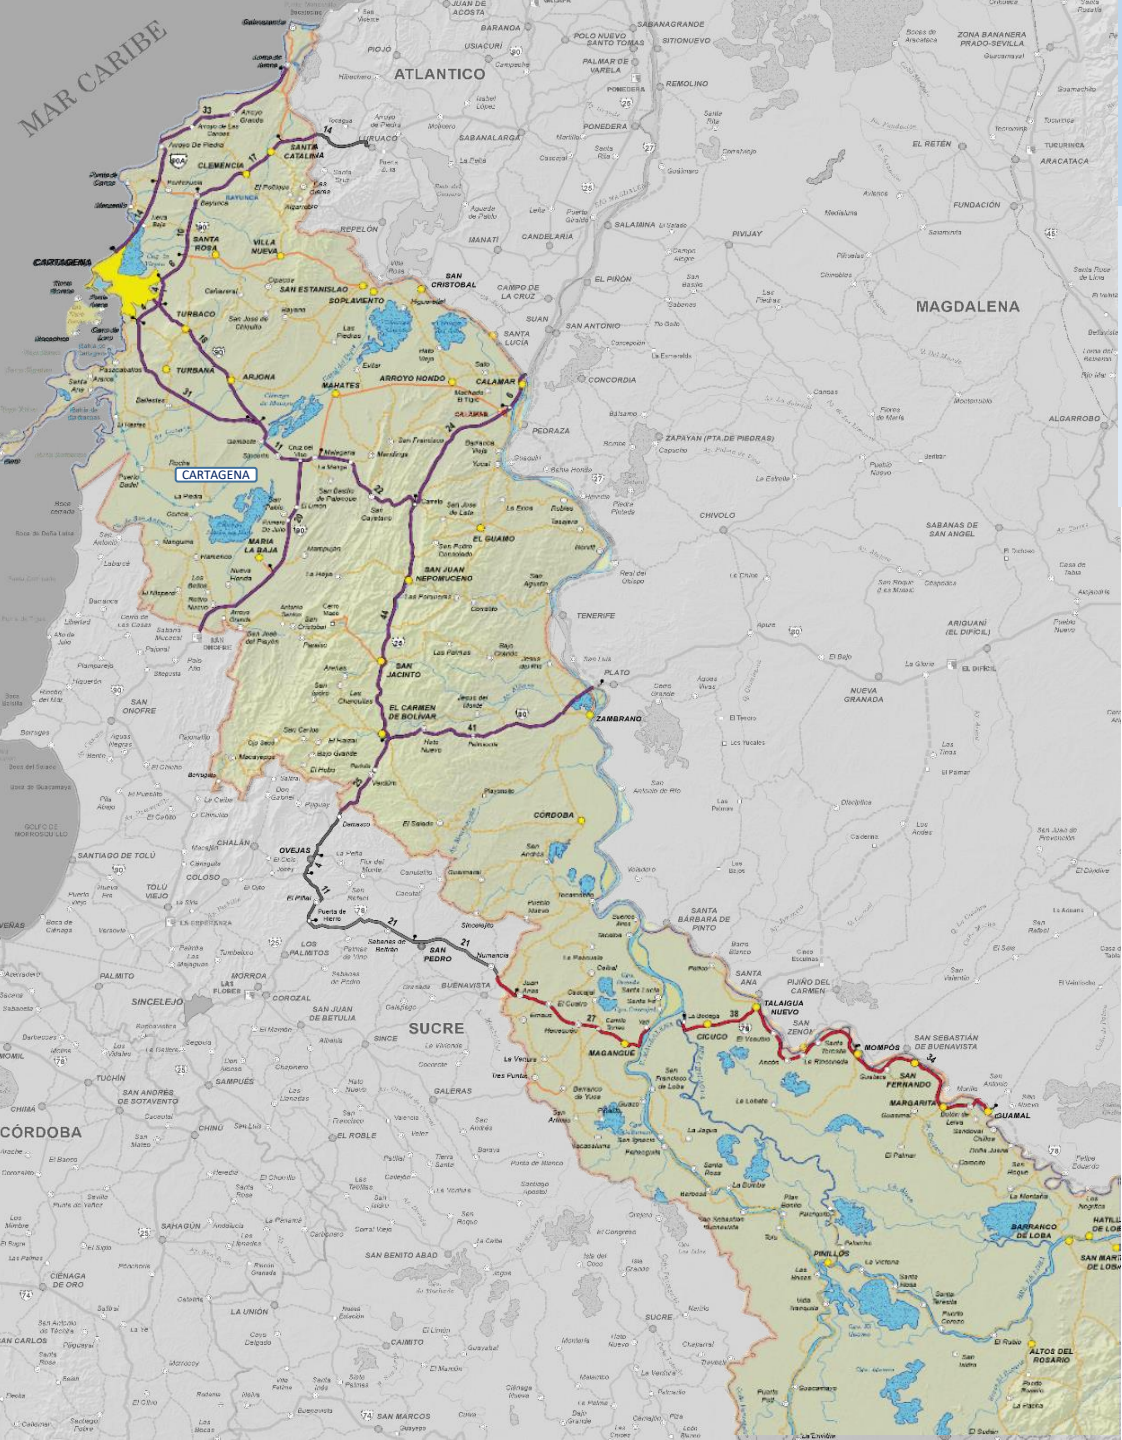

**\$ 841.319 Millones**  
INVERSIÓN



MUNICIPIOS  
**45**



Km. Vías intervenidas  
**997**



EMPLEOS ACTUALES  
**4.801**



NUEVOS EMPLEOS  
**492**

### 1. RED NACIONAL:

Proyectos generales  
Mantenimientos

**\$ 571.709**  
\$564.565  
\$7.144

### 2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

**\$261.686**

### 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

**\$3.820**

### 4. COLOMBIA FLUVIAL

**\$4.105**

# 1. RED NACIONAL



**\$ 571.709**  
**Millones**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	5	1 FIRMADO 3 EJECUCIÓN 1 TERMINADO	293	\$ 564.565
2	MANTENIMIENTOS	1	2 EN EJECUCIÓN 3 TERMINADOS	156,4	\$ 7.144
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>		<b>450</b>	<b>\$ 571.709</b>

# 1.1. PROYECTOS GENERALES

 **\$ 564.565**  
Millones

 **293 Km**

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	
RED NACIONAL						293		\$ 564.565	
1	PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - MOMPOX - GUAMAL - EL BANCO - EL BURRO \$306 mil millones	CONEXIÓN INTEGRAL TRANSVERSAL MOMPOSINA PUENTE YATI- VARIANTE MAGANGUE	CONTRATO DE OBRA: 2257-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2373-2021	mar-22	jul-30	12,8 KM CONSTRUCCIÓN VARIANTE 222 KM DE MANTENIMIENTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA	\$ 231.033	
2		MEJORAMIENTO YATI - BODEGA - MOMPOX - GUAMAL - EL BANCO - EL BURRO Y EL BANCO - ARJONA - CUATROVIENTOS	CONTRATO DE OBRA: 1581-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1546-2021	oct-21	jul-22	14 KM MANTENIMIENTO 1 KM REHABILITACIÓN	48%	\$ 52.862	
3		<b>MEJORAMIENTO PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - MOMPOX - GUAMAL - EL BANCO</b>	<b>CONTRATO DE OBRA: 1179-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1229-2020</b>	<b>oct-20</b>	<b>ago-21</b>	<b>14 KM MANTENIMIENTO 1 KM REHABILITACIÓN</b>	<b>TERMINADO</b>	<b>\$ 21.454</b>	
4		CARTAGENA - BARRANQUILLA	MEJORAMIENTO SEGUNDA CALZADA CARTAGENA - BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA: 1674-2015 CONTRATO DE INTERVENTORÍA:1738-2015	ene-16	jul-22	10,4 KM CONSTRUCCIÓN DE VÍA 6 PUENTES VEHICULARES 2 PUENTES PEATONALES	99%	\$ 140.990
5		GUARANDA - TIQUISIO - REGIDOR	TRANSVERSAL DEL SUR DE BOLÍVAR	CONVENIO: 2045-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1030-2022	-	-	33	FIRMADO	\$ 118.226

## 1.2. MANTENIMIENTOS



Millones  
\$ 7.144



156,4 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					156,4		\$ 7.144
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEPARTAMENTO	CONTRATO: 2142-2019, 2143-2019, 2150-2019, 2611-2019, 2612-2019	dic-19	jul-22	156,4	90%	\$ 7.144

# 2. VIAS RURALES Y REGIONALES



**\$ 261.686**  
**Millones**



**44 Municipios**



**547 Km**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	51	9 CONTRATACIÓN 27 EJECUCIÓN 15 TERMINADOS	\$ 60.989	42
2	CONVENIOS ESPECIALES	7	7 CONTRATACIÓN	\$ 111.892	5
3	OCAD PAZ	3	2 TERMINADOS 1 EJECUCIÓN	\$ 88.699	5
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>		<b>\$ 261.686</b>	<b>44</b>

## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 60.989  
Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	MARGARITA	PUENTE CHUVIJO - CANTERA	CONVENIO: 2483 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1500 - 2020	dic-20	dic-21	1,08 KM PLACA HUELLA 42 KM	TERMINADO	\$ 1.102
2	ALTOS DEL ROSARIO	PUERTO ROSARIO Y LA VÍA BARRANCO DE LOBA	CONVENIO: 2037-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	feb-21	dic-22	0,77 KM PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 896
3	ARENAL	MUNICIPIO DE ARENAL - VEREDA LA SABANA - PUENTE JESUS SOLANO - VEREDA SOYA -CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO - CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN	CONVENIO: 2467 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1288 -2020	dic-20	dic-21	0,635 KM PLACA HUELLA 38 KM MANTENIMIENTO 32 KM MEJORAMIENTO 1 ALCANTARILLA	TERMINADO	\$ 1.132
4	ARJONA	CARRETEABLE ARJONA - ROCHA	CONVENIO: 2047-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	feb-21	dic-22	0,44 KM PLACA HUELLA 17 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.214
5	ARROYOHONDO	CORREDOR SATO	CONVENIO: 1830-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	feb-21	dic-22	0,73 KM PLACA HUELLA 11 KM MANTENIMIENTO 9,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 884
6	BARRANCO DE LOBA	CORREDOR DESDE EL CASCO URBANO BARRANCO DE LOBA	CONVENIO: 2464 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1500-2020	dic-20	dic-21	0,9 KM PLACA HUELLA 11 KM MANTENIMIENTO 9,5 KM MEJORAMIENTO 2 BOX COULVERT	TERMINADO	\$ 1.102
7	CALAMAR	CALAMAR - HATO VIEJO	CONVENIO: 1644-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	dic-20	dic-22	0,54 KM PLACA HUELLA 19 KM MANTENIMIENTO 15 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 904
8	CANTAGALLO	DIAMANTE -MIRALINDO	CONVENIO: 1836-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	feb-21	dic-22	0,78 KM PLACA HUELLA 14 KM MANTENIMIENTO 12,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.086
9	CARMEN DE BOLIVAR	VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1408-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 760
10	CICUCO	CORREDOR PRODUCTIVO LA PEÑA-SAN FRANCISCO DE	CONVENIO: 1980-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	feb-21	dic-22	0,88 KM PLACA HUELLA 16 KM MANTENIMIENTO 13 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 986
11	CICUCO	CORREDOR CICUCO - SAN JAVIER	CONVENIO: 2685 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1500-2020	dic-20	dic-21	0,78 KM PLACA HUELLA 20 KM MANTENIMIENTO 13 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 932
12	CLEMENCIA	PIÑIQUE LAS CARAS	CONVENIO 1775-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.170



## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	CÓRDOBA	VIA MONTAÑAS DE ALONSO	CONVENIO: 1841-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	ene-22	dic-22	1,05 KM PLACA HUELLA 17 KM MANTENIMIENTO 13,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.014
14	CÓRDOBA	GUAYMARAL - SAN ANDRÉS	CONVENIO: 533 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	feb-20	dic-21	1,05 KM PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.192
15	EL CARMEN DE BOLÍVAR	ROMA-MATACABALLO-COCUELO	CONVENIO: 1985 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1479-2021	feb-21	dic-22	1 KM PLACA HUELLA 11 KM MANTENIMIENTO 9,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.084
16	EL CARMEN DE BOLÍVAR	EL CARMEN - EL BLEDO	CONVENIO: 668 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	may-20	dic-21	1,12 KM PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.192
17	EL GUAMO	YEE ENEA - ROBLES	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	13 KM MANTENIMIENTO 9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.056
	ACHÍ	ALGARROBO-TACUYALTA	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	16 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.012
	MARÍA LA BAJA	TRONCAL DEL CARIBE-COLU-NUEVA FLORIDA	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	3,5 KM MANTENIMIENTO 2,4 KM	EJECUCIÓN	\$ 1.067
	SANTA ROSA DE LIMA	TABACAL AHOGAGATO	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	5 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 941
	SAN PABLO	PATIO BONITO-VIRGENCITA	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	10 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.095
	ZAMBRANO	VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAPACA Y FLORIDA; MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLÍVAR	CONVENIO: 862-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2126-2021	ene-22	dic-22	7 KM MANTENIMIENTO 5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079
18	EL GUAMO	EL GUAMO - LATA	CONVENIO: 533 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	feb-20	dic-21	0,85 KM PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.707
19	EL PEÑÓN	CORREDOR PRODUCTIVO CORREGIMIENTO DE	CONVENIO: 2092-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	feb-21	dic-22	0,768 KM PLACA HUELLA 22 KM MANTENIMIENTO 17 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 886



## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
20	MARÍA LA BAJA	TRONCAL - RETIRO NUEVO - FLAMENCO - ÑANGUMA (INCLUYE	CONVENIO: 586-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	may-20	dic-21	0,93 KM PLACA HUELLA 22 KM	TERMINADO	\$ 1.192
21	MOMPOS	GUATACA - PUEBLO NUEVO	CONVENIO: 2043-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	feb-21	dic-22	0,57 KM PLACA HUELLA 11 KM 14 KM	EJECUCIÓN	\$ 786
22	MORALES	VIA LA ARCADIA - MICOAHUMADO	CONVENIO: 2309-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2021	ene-22	dic-22	MANTENIMIENTO 12,4 KM	EJECUCIÓN	\$ 1.076
23	NOROSÍ	VIA VEREDA POLVILLO - CORREGIMIENTOS DE MINA BRISA Y CASA DE	CONVENIO: 2044-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2021	ene-22	dic-22	MANTENIMIENTO 23 KM 21 KM	EJECUCIÓN	\$ 786
24	MAHATES	VIA MAHATES - MANDINGA	CONVENIO: 1895-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	dic-20	dic-22	0,71 KM PLACA HUELLA 10 KM MANTENIMIENTO 9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 804
25	PINILLOS	PINILLOS- CORREGIMIENTO DE PALOMINO	CONVENIO: 1331-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2239-2021	-	-	CIÓN EMERGENC	CONTRATACIÓN	\$ 708
26	REGIDOR	REGIDOR-SANTA TERESA	CONVENIO: 1905-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,96 KM PLACA HUELLA 15 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.005
27	SAN CRISTOBAL	HATO VIEJO- HUIGUERETAL	CONVENIO 1976-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.040
28	SAN CRISTOBAL	HATO VIEJO- HUIGUERETAL	CONVENIO: 2688-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1500-2020	dic-20	dic-21	0,57 KM PLACA HUELLA 20 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.699
29	SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO - LA GRANJA	CONVENIO: 1919-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1497-2021	ene-22	dic-22	0,67 KM PLACA HUELLA 12 KM MANTENIMIENTO 10,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 884
30	SAN FERNANDO	VÍA EL GATO - GUASIMAL	CONVENIO: 2063-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,64 KM PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO 12,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 946
31	SAN JACINTO	ARENAS - LAS CHARQUITAS	CONVENIO: 2048-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1497-2021	ene-22	dic-22	0,9 KM PLACA HUELLA 7 KM MANTENIMIENTO 6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.084
32	SAN JACINTO	SAN JACINTO - ARENAS	CONVENIO: 631 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	mar-20	dic-21	1,17 KM PLACA HUELLA 7 KM MANTENIMIENTO 6 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.192

## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
33	SAN JACINTO DEL CAUCA	SAN JACINTO DEL CAUCA - SANTA ANITA	CONVENIO: 2034-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,94 KM PLACA HUELLA 20 KM MANTENIMIENTO 19 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.086
34	SAN JUAN NEPOMUCENO	CASO URBANO - CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑÓN	CONVENIO: 1778-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.630
35	SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN CAYETANO - TORO	CONVENIO: 1924-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1497-2021	ene-22	dic-22	0,74 KM PLACA HUELLA 14 KM MANTENIMIENTO 12,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.084
36	SAN JUAN NEPOMUCENO	TRONCAL - SAN JUAN - SAN JOSE DEL PEÑÓN	CONVENIO: 549-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	nov-20	dic-21	1,21 KM PLACA HUELLA 14 KM MANTENIMIENTO 12 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.289
37	SAN MARTÍN DE LOBA	CORREDOR VIAL SAN MARTIN DE LOBA, MAURICIO	CONVENIO: 2692-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1500-2020	dic-20	dic-21	0,82 KM PLACA HUELLA 12 KM MANTENIMIENTO 10 KM MEJORAMIENTO 2 BOX COULVERT	TERMINADO	\$ 1.102
38	SAN PABLO	LOMA FRESCA - CARMEN DEL CUCU, VIRGENCITA - PATIO	CONVENIO: 632-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	mar-20	dic-21	0,55 KM PLACA HUELLA 43 KM MANTENIMIENTO 36 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.192
39	SANTA CATALINA	INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL - LOMA ARENA - GALERAZAMBA-	CONVENIO: 1767-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.670
40	SANTA CATALINA	VIA SANTA CATALINA PIÑIQUE	CONVENIO: 2581-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1500-2020	dic-20	dic-21	1,18 KM PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO 1 BOX COULVERT	TERMINADO	\$ 1.089
41	SANTA ROSA DEL SUR	SANTA ROSA - CORREGIMIENTO DE SAN LUCAS	CONVENIO: 1938-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,82 KM PLACA HUELLA 21 KM MANTENIMIENTO 17,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.086
42	MAHATES	SAN BASILIO DE PALENQUE - LA BONGA	CONVENIO: 1503-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1722-2020	dic-20	abr-22	TERMINACIÓN EMERGENC	EJECUCIÓN	\$ 1.100
43	HATILLO DE LOBA	VÍA LA VICTORIA - SAN MIGUEL	CONVENIO 1750-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	dic-20	dic-22	0,92 KM PLACA HUELLA 16 KM MANTENIMIENTO 13 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 916

## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
44	SANTA ROSA DEL SUR	CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE ARRAYANES	CONVENIO 1775-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.900
45	SIMITÍ	VEREDA SANTA INES A CORREGIMIENTO LAS BRISAS	CONVENIO: 2079-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,82 KM PLACA HUELLA 21 KM MANTENIMIENTO 16,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.086
46	SOPLAVIENTO	VIA SOPLAVIENTO - SAN CRISTOBAL	CONVENIO 1721-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1497-2021	ene-22	dic-22	5 KM DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 804
47	TALAIGUA NUEVO	VIA TALAIGUA NUEVO - PATICO	CONVENIO: 2082-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1543-2021	ene-22	dic-22	0,57 KM PLACA HUELLA 16 KM MANTENIMIENTO 13 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 706
48	TURBANÁ	VIA TURBANA-LOMAS DE MATUNILLA.	CONVENIO: 2098-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1497-2021	feb-21	dic-22	0,76 KM PLACA HUELLA 9 KM MANTENIMIENTO 8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 854
49	VILLANUEVA	CORREGIMIENTO DE ALGARROBO	CONVENIO: 1759-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.230
50	SANTA ROSA	VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO	CONVENIO 2023-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.280
51	ZAMBRANO	ZAMBRANO - CACHIPAY	CONVENIO: 630-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 722-2020	nov-20	dic-21	1,38 KM PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.192

## 2.2. CONVENIOS ESPECIALES



**\$ 111.892**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	ACHÍ	VIA NISPEROS-CINSERIN	CONVENIO: 1895-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 8.379
2	CARMEN DE BOLÍVAR	CORREGIMIENTO DEL SALADO	CONVENIO: 1444-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 6.791
3	MAGANGUÉ	BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA	CONVENIO: 1091-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 34.821
4	MAGANGUE 1	CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL-CEIBAL-LA PASCUALA	CONVENIO: 1897-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 23.174
5	MAGANGUE 2	SAN RAFAEL DE CORTINA CON MAGANGUE	CONVENIO: 1898-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 12.583
6	MARIA LA BAJA	VÍA PUERTO SANTANDER	CONVENIO: 2070-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 14.680
7	NEPOMUCE NO	SAN JUAN DE NEPOMUCENO - CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN	CONVENIO: 1891-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 11.466

## 2.3. OCAD PAZ



**\$ 88.699**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE
1	RIO VIEJO – REGIDOR	CONSTRUCCIÓN DE	CONTRATO DE OBRA: 2483-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA	sep-18	ago-20	10,1 KM DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO	TERMINADO	100%
2	SAN JACINTO DEL CAUCA	MEJORA MIENTO VÍAS	CONTRATO DE OBRA: 4087-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA	dic-18	mar-21	8 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	100%
3	MONTECRISTO-ACHÍ	MEJORA MIENTO VÍAS	CONTRATO DE OBRA: 2458-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA	oct-18	dic-22	33 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	75%

# 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



**\$ 3.820**  
**Millones**

**25 Km**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
					25,04		\$ 3.820
1	MAGANGUÉ, ACHÍ, SAN JACINTO DEL CAUCA	CONECTIVIDAD VIAL SECTOR LA MOJANA	feb-20	may-21	500.000 Ha	TERMINADO	\$ 1.439
2	MAGANGUÉ	EIA VARIANTE MAGANGUÉ	feb-21	mar-22	13	TERMINADO	\$ 1.294
3	MAGANGUÉ	VARIANTE MAGANGUÉ	sep-19	jun-20	12,04	TERMINADO	\$ 1.087

# 4. MARÍTIMA Y FLUVIAL



**\$ 4.105**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						7		\$ 4.105
1	CARTAGENA	CONVENIO CONSULTA PREVIA AMPLIACIÓN CANAL DE ACCESO A CARTAGENA	CONVENIO: 1269-2019	dic-19	nov-21	1	TERMINADO	\$ 2.069
2	CARTAGENA	PROFUNDIZACIÓN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA CAÑO DE ORO	CONTRATO DE OBRA: 2651-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2769-2019	ago-20	dic-20	1	TERMINADO	\$ 1.295
3	SOPLAVIENTO	MANTENIMIENTO DEL FERRY DE SOPLAVIENTO	CONTRATO DE OBRA: 1692-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1691-2019	sep-21	ene-20	1	TERMINADO	\$ 160
4	CARTAGENA	MONITOREOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS BOLÍVAR, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, VALLE, NARIÑO, ANTIOQUIA	CONTRATO DE OBRA: 896-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 999-2021	jul-21	nov-21	1	TERMINADO	\$ 60
5	MORALES	MANTENIMIENTO DEL FERRY PIAMONTE, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CONTRATO DE OBRA: 805-2018	jul-18	oct-18	1	TERMINADO	\$ 116
6	CARTAGENA	MONITOREO EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, CARTAGENA - BOLÍVAR	CONTRATO DE OBRA: 829-2019	jun-18	ago-18	1	TERMINADO	\$ 162
7	SOPLAVIENTO	MANTENIMIENTO DEL FERRY DE SOPLAVIENTO ETAPA II	CONTRATO DE OBRA: 654-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 757-2020	jul-20	sep-20	1	TERMINADO	\$ 76
8	CARTAGENA	MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE CARTAGENA, BOCAS DE ATRATO, BUENAVENTURA, ESTERO SAN ANTONIO Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ANTIOQUIA, VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO.	CONTRATO DE OBRA: 1571-2019	sep-19	dic-19	1	TERMINADO	\$ 50
9	MORALES	MANTENIMIENTO DEL FERRY PIAMONTE, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CONTRATO OBRA: 805-2018	may-18	oct-18	1	TERMINADO	\$ 116
