




La movilidad
es de todos

Mintransporte

QUINDÍO

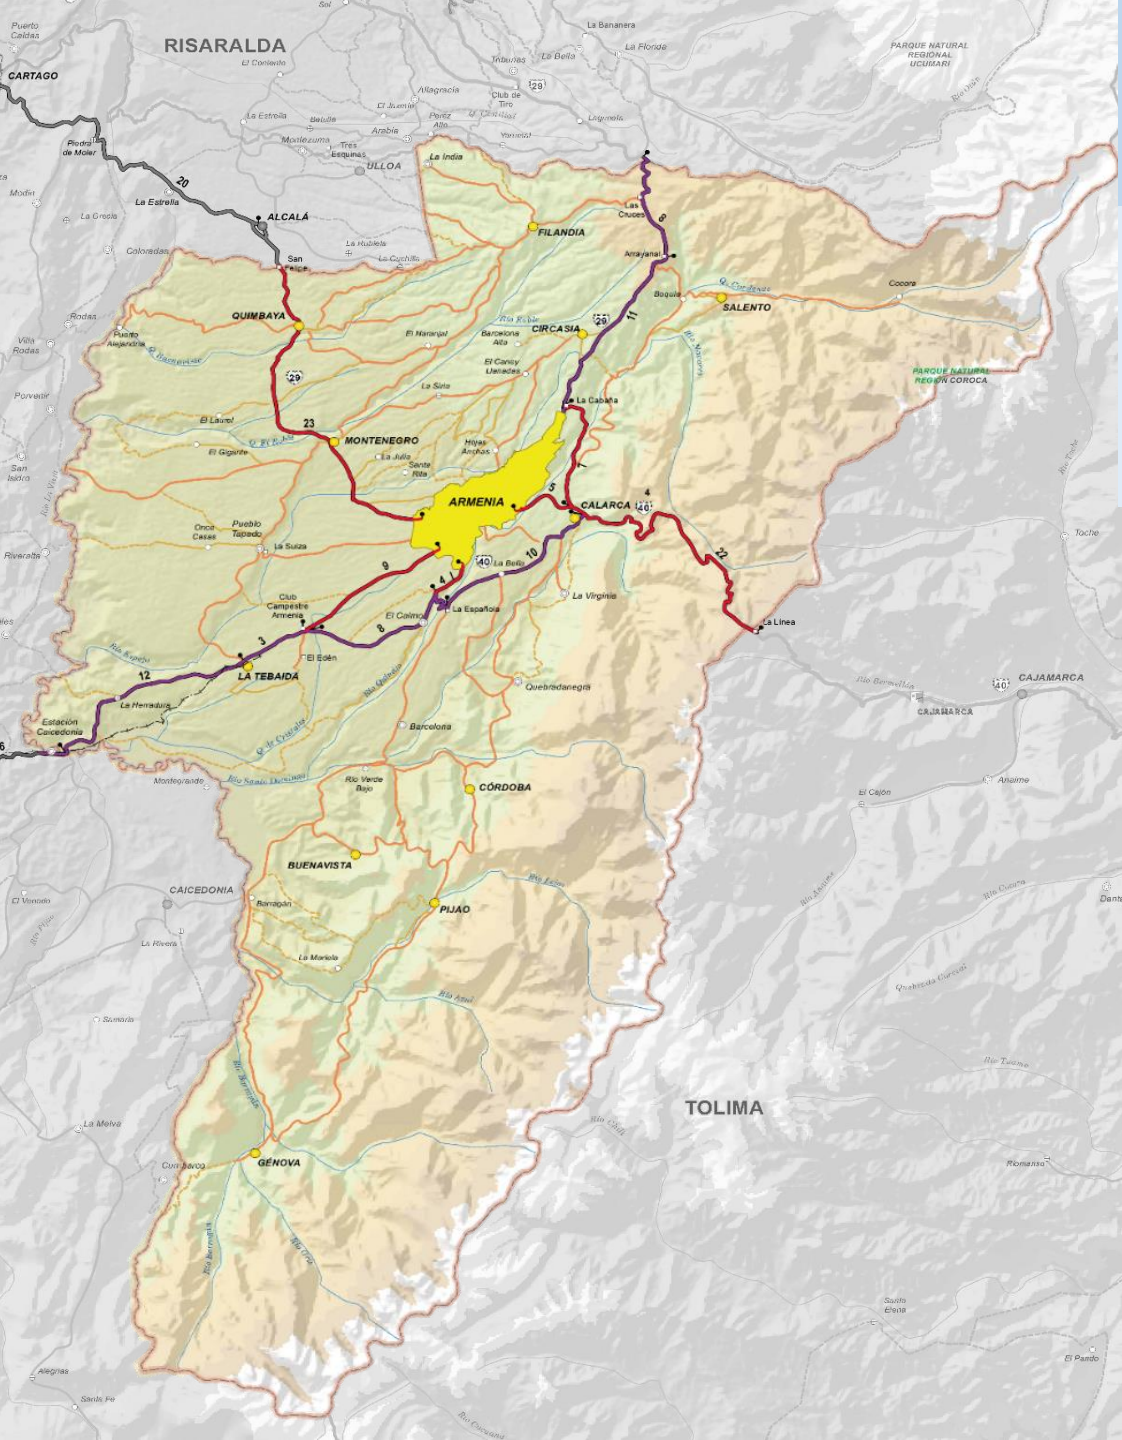

\$ 1,99 Billones

INVERSIÓN



MUNICIPIOS

12



**Km Vías
Intervenidas**

441



**EMPLEOS
ACTUALES**

2.305



**NUEVOS
EMPLEOS**

1.507

1. RED NACIONAL:

Proyectos generales

Mantenimientos

\$ 1.894.881

\$1.888.764

\$6.117

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$29.833

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$9.557

4. RED FÉRREA:

\$55.002

1. RED NACIONAL



\$ 1,89
Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	15	1 FIRMADO 2 CONTRATACIÓN 3 EJECUCIÓN 1 SUSPENDIDO 8 TERMINADOS	322	\$ 1.888.764
2	MANTENIMIENTOS	2	1 EJECUCIÓN 1 TERMINADO	68	\$ 6.117
TOTAL		17		389	\$ 1.894.881

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 1.89
Billones



322 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
		RED NACIONAL				322		\$ 1,888,764
1	LA TEBAIDA, MONTENEGRO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA TEBAIDA, MONTENEGRO	CONTRATO DE OBRA: 1573-2015 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1755-2015	ene-16	oct-21	17	TERMINADO	\$ 60,175
2	CALARCÁ, CAJAMARCA	GVI ARMENIA - CAJAMARCA	CONTRATO DE OBRA: 1101-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1114-2020	sep-20	jul-21	50	TERMINADO	\$ 19,412
3	ARMENIA	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA ARMENIA - AEROPUERTO	CONTRATO DE OBRA: 1559-2015 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1732-2015	ene-16	dic-20	8	TERMINADO	\$ 101,647
4	CLUB CAMPESTRE, ARMENIA \$17.756 Millones	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SECTOR UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DE LA VÍA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA RUTA 4002 DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.	CONTRATO DE OBRA: 1599-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1722-2020	feb-21	ago-22	1 PUENTE	SUSPENDIDO 63%	\$ 2,512
5		- TERMINACIÓN CICLO RUTA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA - VARIANTE CALARCÁ CIRCASIA (INTERCAMBIADOR DE CHAGUALA) - REHABILITACIÓN CALZADA DERECHA CORREDOR MALIBÚ- TRES ESQUINAS	CONTRATO DE OBRA: 1780-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1727-2021	dic-21	jul-22	-	28%	\$ 15,244
6	SALENTO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EJE CAFETERO- SALENTO	CONVENIO DE OBRA: 1645-2021 N° PROCESO INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-005-2022	-	-	3	CONTRATACIÓ N	\$ 4,192
7	DOBLE CALZADA CALARCÁ - ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO \$426.897 Millones	SEGUNDA CALZADA ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA QUIMBAYA	CONTRATO DE OBRA: 1904-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1913-2020	mar-21	dic-22	KILÓMETROS A REHABILITAR: 47,8 KM KILÓMETROS A	10%	\$ 111,033
8		MEJORAMIENTO VÍA CARTAGO - ALCALÁ - MONTENEGRO - ARMENIA	CONVENIO DE OBRA: 2059-2021	-	-	-	CONTRATACIÓ N	\$ 20,000
9		DOBLE CALZADA MONTENEGRO - CARTAGO	CONVENIO DE OBRA: 2177-2021	abr-22	OBRAS 2026 MANTENIMIE NTO 2030	19	FIRMADO	\$ 295,447
10	CAJAMARCA, CALARCÁ (\$1,25 billones)	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO	CONTRATO DE OBRA: 1175-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1173-2021	jun-21	jun-22	50	73%	\$ 146,030
11		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS DEL PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	CONTRATO DE OBRA: 1759-2015 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1763-2015	feb-16	nov-21	25	TERMINADO	\$ 407,106
12		TERMINACIÓN DOBLE CALZADA - CRUCE CORDILLERA CENTRAL TRAMO QUINDIO	CONTRATO DE OBRA: 885-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 883-2019	feb-16	nov-21	5	TERMINADO	\$ 258,445
13		TERMINACIÓN TÚNEL DE LA LÍNEA	CONTRATO DE OBRA: 806-2017 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 853-2017	jul-17	nov-19	30	TERMINADO	\$ 365,304
14		TRATAMIENTO FALLA LA SOLEDAD	CONTRATO DE OBRA: 1305-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1306-2019	jul-19	mar-20	0.2	TERMINADO	\$ 36,782
15		GVI ARMENIA CAJAMARCA INCLUYE VARIANTE CALARCÁ CIRCASIA	CONTRATO DE OBRA: 1593-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1603-2019	ago-19	ago-20	57	TERMINADO	\$ 45,435

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 6.117
Millones



68 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
	RED NACIONAL				67,6		\$ 6.117
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2103-2019, 2104-2019, 2418-2019	dic-19	jul-22	66	95%	\$ 4.440
2	MANTENIMIENTO CARTAGO - ARMENIA	CONTRATO DE OBRA: 969-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 945-2020	ago-20	nov-20	1,6	TERMINADO	\$ 1.677

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



\$ 29.833
Millones

10 Municipios

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	8	7 CONTRATACIÓN 1 TERMINADO	\$ 4.675	9
2	CONVENIOS ESPECIALES	1	1 EJECUCIÓN	\$ 14.000	3
3	OCAD PAZ	2	1 EJECUCIÓN 1 TERMINADO	\$ 11.158	2
TOTAL		11		\$ 29.833	10

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 4.675 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	SALENTO	TRAMO VIA SALENTO A NAVARCO-CANAAN	ene-21	jun-22	0,402 KM PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 745
2	BUENAVISTA	C.I LA PICOLTA - LOS JUANES	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 690
3	CIRCASIA	CIRCASIA-AGUADEÑAS-VIGILANTE	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 610
4	CÓRDOBA	CORREDOR RIO VERDE ALTO - MEDIA CARA	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 610
5	MONTENEGRO	TAPAO-LA MONTAÑA-LA CEIBA-LA GUATEMALA-SAN JOSÉ-SAN PABLO	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 550
6	FILANDIA	CORREGIMIENTO LA INDIA	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 510
7	GENOVA	VIA GRIS	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 550
8	CALARCÁ	CORREDOR TURISTICO DE LA PAZ	-	-	5	CONTRATACIÓN	\$ 410

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 14.000
Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	BATALLÓN FRANCISCO JAVIER CISNEROS	CIRCASIA - EL JALON - VILLARAZO	dic-20	jun-22	50 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 14.000

2.3. OCAD PAZ



\$ 11.158
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	PIJAO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Pijao, Quindío	oct-19	jun-22	0,28 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 5.061
2	GÉNOVA, PIJAO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Terciarias en el Departamento de Quindío	ago-18	nov-19	2,46 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 6.097

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS


\$ 9.557
Millones

138 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						138		\$ 9.557
1	CALARCÁ, ARMENIA, LA PAILA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DOBLE CALZADA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2753-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2714-2019	feb-20	ago-22	74	99%	\$ 5.607
2	ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA, CARTAGO, CALARCÁ, CLUB CAMPESTRE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONECTIVIDAD ARMENIA CARTAGO-CALARCÁ CLUB CAMPESTRE	CONTRATO DE CONSULTORIA: 1505-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1463-2020	nov-20	jun-22	53	TERMINADO	\$ 3.021
3	ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA, CARTAGO, CALARCÁ, CLUB CAMPESTRE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VARIANTE ARMENIA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2197-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2238-2021	feb-22	ago-22	11	SUSPENDIDO	\$ 929

4. VÍAS VERDES



\$ 55.002
Millones

47 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						47		\$ 55.002
1	SALENTO	CORREDOR FERREO SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA - VÍAS VERDES	CONTRATO DE OBRA: 2068-2021 PROCESO DE INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-199-2021	dic-21	dic-30	47	EJECUCIÓN	\$ 55.002
