




La movilidad  
es de todos

Mintransporte

# RISARALDA

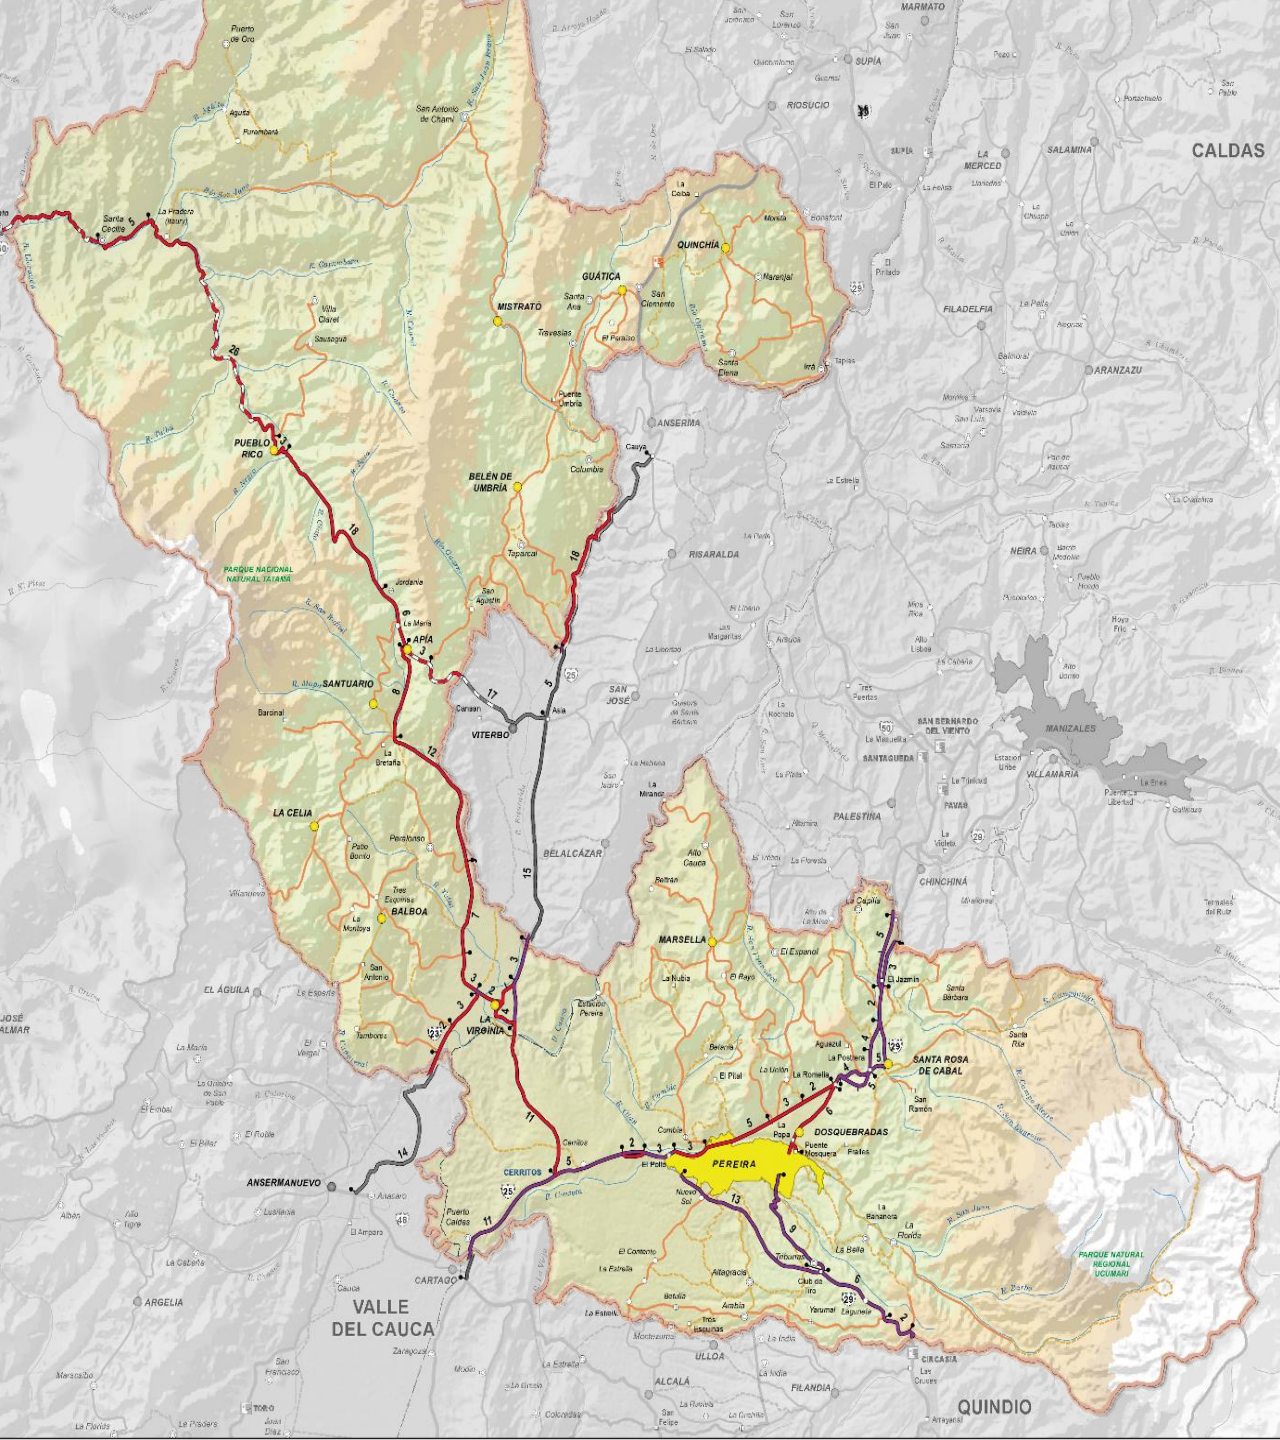

**\$ 1.78 Billones**  
INVERSIÓN



MUNICIPIOS **14**



**801**  
Km Vías Interventidas



EMPLEOS  
ACTUALES  
**2,217**



NUEVOS  
EMPLEOS  
**748**

**1. RED NACIONAL:**

Proyectos generales  
Mantenimientos

**\$ 1,674,435**

\$1,651,686  
\$22,749

**2. VIAS RURALES Y REGIONALES:**

**\$105,006**

**3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**\$2,568**

# 1. RED NACIONAL



**\$ 1.67**  
**Billones**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	9	2 CONTRATACIÓN 1 SUSPENDIDO 6 EJECUCIÓN	456	\$ 1,651,686
2	MANTENIMIENTOS	4	2 EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	221	\$ 22,749
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>		<b>677</b>	<b>\$ 1,674,435</b>

# 1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 1.65  
Billones



456 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						456		\$ 1,651,686
1	PEREIRA, CERRITOS, CARTAGO, LA VICTORIA, LA VIRGINIA	VÍAS DEL SAMÁN	CONVENIO: 1594 - 2021	feb-22	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	REHABILITACION 42 KM SEGUNDA CALZADA 43 KM 4 CONSTRUCCIÓN INTERSECCIONES 17 MEJORAMIENTO RETORNOS	8%	\$ 1,203,330
2	TRANSVERSALES DEL PACÍFICO (QUIBDÓ - PEREIRA)	TRANSVERSALES DEL PACÍFICO (QUIBDÓ - PEREIRA) SECTOR EL TAVOR - GUARATO	CONTRATO DE OBRA: 1433-2017 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1442-2017	dic-17	sep-22	13,19 KM (2 VIADUCTOS Y 7 SEMIVIADUCTO) 15 KM PAVIMENTO NUEVO (1 SEMIVIADUCTO) 8 KM DE REHABILITACIÓN DE CALZADA EXISTENTE 12,83 KM PAVIMENTO RIGIDO 220 KM MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL (CONCLUIR Y CONCLUIR)	77%	\$ 351,603
3		TRANSVERSALES DEL PACÍFICO (QUIBDÓ - PEREIRA) - MÓDULO 1	CONTRATO DE OBRA: 1757-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1832-2020 (MÓDULO 1)					
4		TRANSVERSALES DEL PACÍFICO (QUIBDÓ - PEREIRA) - MÓDULO 2	CONTRATO DE OBRA: 1019-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1172-2020					
5	PEREIRA, CERRITOS, LA VICTORIA, CERRITOS CAUYA, LA FELIZA, Y EL POLLO LA ROMELIA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL RISARALDA, CALDAS Y VALLE DEL CAUCA	CONTRATO DE OBRA: 948-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 964-2020	ago-20	sep-22	52,6 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 12,25 KM MANTENIMIENTO PERIODICO	92%	\$ 38,639
6	PEREIRA	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INTERCAMBIADOR VIAL DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO QUE SIRVE DE ACCESO AL AEROPUERTO MATECAÑA	CONVENIO: 817-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1450-2021	abr-21	jun-23	CALZADA MIXTA NORTE Y CARRIL DE MEGABÚS EN PASO A DESNIVEL: 0,32 KM CALZADA MIXTA SUR Y CARRIL DE MEGABÚS: 0,30 KM MUROS EN CONCRETO: 1240 M3 PUENTES DE CONCRETO: 2 UND	34%	\$ 22,598
7	PEREIRA, MARSELLA (35.517 millones)	CIRCUITO ECOTURISTICO RESERVA BARBAS BREMEN K0+00 AL K12+600	CONVENIO: 1120-2021	-	dic-23	12,6 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 19,215
8		SEGUNDA CALZADA EN LA VÍA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA		-	dic-23	1,24 KM SEGUNDA CALZADA	CONTRATACIÓN	\$ 12,500
9		CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO VÍA PEREIRA - MARSELLA		sep-21	jun-22	0,5 KM OBRAS DRENAJE, PAVIMENTACIÓN	85.3%	\$ 3,801

## 1.2. MANTENIMIENTOS



**\$ 22,749**  
**Millones**



**221 Km**

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					220.74		\$ 22,749
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONVENIO: 2282-2019, 2281-2019, 2283-2019, 2280-2019, 2332-2019, 2279-2019, 2286-2019, 2440-2019,	dic-19	jul-22	218	95%	\$ 13,295
2	MANTENIMIENTO APIA - VITERBO - ASIA	CONVENIO: 1383-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1615-2021	Nov-21	jun-22	1,46 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 0,56 KM REHABILITACIÓN	27%	\$ 5,555
3	MANTENIMIENTO CARRETERA CERRITOS - LA VIRGINIA - ASIA CAUYA - SUPIA - LA PINTADA SEC	CONVENIO: 1870-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2174-2019	dic-19	ago-20	2.74	TERMINADO	\$ 2,960
4	MANTENIMIENTO CARRETERA APIA- LA VIRGINIA, ENTRE LOS PR 0+0000 AL PR 32+0443, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONVENIO: 1942-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1936-2019	nov-19	feb-20	-	TERMINADO	\$ 940

# 2. VIAS RURALES Y REGIONALES



**\$ 105.006**  
**Millones**

**12 Municipios**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	6	3 ADJUDICADO 3 TERMINADOS	\$ 5.784	6
2	CONVENIOS ESPECIALES	4	2 CONTRATACIÓN 2 EJECUCIÓN	\$ 55.727	9
3	OBRAS POR IMPUESTOS	1	1 EJECUCIÓN	\$ 4.774	1
4	OCAD PAZ	8	3 EJECUCIÓN 5 TERMINADOS	\$ 38.721	7
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>		<b>\$ 105.006</b>	<b>12</b>

## 2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 5.784 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	BELÉN DE UMBRÍA	TUMURRAMA - ALTURAS EL ROBLAL	CONVENIO: 2472-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1315-2020	dic-20	mar-22	0,103 KM PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 2 BOX COULVERT 1 MURO	TERMINADO	\$ 814
2	MISTRATÓ	JARDINCITO - ALTO PUEBLO RICO-MISTRATO	CONVENIO: 2632-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1315-2020	dic-20	mar-22	0,344 KM DE PLACA HUELLA 7 ALCANTARILLAS	TERMINADO	\$ 938
3	GUÁTICA	EL CARMELO-SANTA ANA; TARQUI-SUAIBA-BUENOS AIRES	CONVENIO: 2469-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1315-2020	dic-20	mar-22	0,286 KM DE PLACA HUELLA 9 ALCANTARILLAS 1 MURO	TERMINADO	\$ 1.116
4	LA CELIA	LA CELIA - CAIMALITO	CONVENIO: 1864-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1508-2021	-	-	0,42 KM PLACA HUELLA 7,38 KM MANTENIMIENTO 5,166 KM MEJORAMIENTO	ADJUDICADO	\$ 849
5	PEREIRA	UTP MUNDO NUEVO - LA BELLA	CONVENIO: 2315-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1508-2021	-	-	0.53 KM PLACA HUELLA 2,06 KM MANTENIMIENTO 1,442 KM MEJORAMIENTO	ADJUDICADO	\$ 1.059
6	LA VIRGINIA	LA PALMA - EL NORTE	CONTRATO DE OBRA: 2010-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1508-2021	-	-	0.5 KM PLACA HUELLA 11,3 KM MANTENIMIENTO 7,91 KM MEJORAMIENTO	ADJUDICADO	\$ 1.009

## 2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 55.727

Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	IRRÁ, QUINCHÍA, GUÁTICA, PUENTE UMBRÍA	IRRÁ - QUINCHÍA CXC	CONVENIO: 1927-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1921-2020	mar-21	jul-22	3,38 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 1,6 KM PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	\$ 28.727
2		GUÁTICA - PUENTE UMBRÍA CXC				3,98 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 0,20 KM PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN	
3	DEPARTAMENTO	APÍA, DOSQUEBRADAS, LA CELIA, MISTRATÓ,	CONVENIO: 2054-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 18.000
4	SANTUARIO, PEREIRA, BELEN DE UMBRIA, APÍA, PUEBLO RICO, GUÁTICA, BALBOA	VIA LA BAMBÁ - PUEBLO VANO, VIA EL TOPACIO - PUEBLO VANO - LA MARINA, VÍA SANTUARIO - LA BAMBÁ.	CONVENIO: 2055-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 9.000



## 2.3. OCAD PAZ



**\$ 38.721 Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	QUINCHÍA, PUEBLO RICO	TOTUI - GRANATAL LLANO GRANDE - AGUACATAL MISTRATÓ - ALTO PUEBLO RICO - JARDINCITO	may-18	nov-19	1,89 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.775	100%
2	GUÁTICA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA	jun-19	ago-20	2,4 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 3.268	100%
3	APIA	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APIA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	oct-19	jun-22	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN 18,7 KM	EJECUCIÓN	\$ 16.251	70%
4	MISTRATÓ	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ	oct-19	jun-22	2 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 3.131	57%
5	LA VIRGINIA	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS	nov-19	jun-22	4,13 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 5.078	95%
6	BALBOA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA	nov-19	nov-20	1,6 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 2.388	100%
7	GUÁTICA	VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA BENDECIDA, LAS LOMAS, ALTURAS Y TAIJARA	jun-20	ene-21	0,8 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 1.568	100%
8	BALBOA	VÍAS EN LAS VEREDAS GUAIMARAL Y LA MANCHA	jun-20	ene-21	1,3 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 2.262	100%

## 2.4. OBRAS POR IMPUESTOS



**\$ 4.774 Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	BALBOA	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio Balboa, Risaralda	oct-20	dic-22	2,1 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 4.774
2							\$ 0

# 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



**\$ 2.568**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						13,1		\$ 2.568
1	PEREIRA	EYD DOBLE CALZADA LA ROMELIA - EL POLLO	CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1263-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1289-2020	nov-20	abr-22	13,1	TERMINADO	\$ 2.288
2	APIA, VITERBO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA APIA - VITERBO EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y CALDAS.	CONTRATO DE CONSULTORÍA: 793-2017	ago-17	mar-18	-	TERMINADO	\$ 280
