



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TRANSFORMANDO A COLOMBIA

SEGUIMIENTO
INVIAS



MINTRANSPORTE



JUNIO 30 DE 2017

PAZ

EQUIDAD

EDUCACIÓN

III. VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS ROSAS-SANTIAGO Y BOLÍVAR-SANTIAGO

CAUCA



Longitud de Proyecto 117 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$5.097
Total Contrato Interventoría	\$1.180
Total Vigencias de la consultoría	
Vigencia 2015 = \$1.320	
Vigencia 2016 = \$2.700	\$5.097
Vigencia 2017 = \$1.078	
Total Inversión	\$6.277

* Cifras en millones a diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha de Adjudicación	23/10/2015
Fecha de Firma de Contrato	12/11/2015
Acta de Inicio	18/01/2016
Plazo	18/07/2017
Fase del Proyecto (Avance)	82 %

ALCANCE		
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
ROSAS – SANTIAGO - BOLÍVAR	117 KM	Estudios y Diseños


CONTRATO CONSULTORÍA 1584 DE 12/11/2015		
CONSORCIO CONSULTORES VIALES 093		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
SAITEC S.A.	60	ESPAÑA - SUC. COLOMBIA
INCOPLAN S.A.	20	COLOMBIA
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES	20	COLOMBIA

CONTRATO CONSULTORÍA 1650 DE 12/11/2015		
CONSORCIO LAS ROSAS 2015		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
VELNEC SA.	60	COLOMBIA
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES	40	COLOMBIA

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN

HUILA-CAQUETÁ

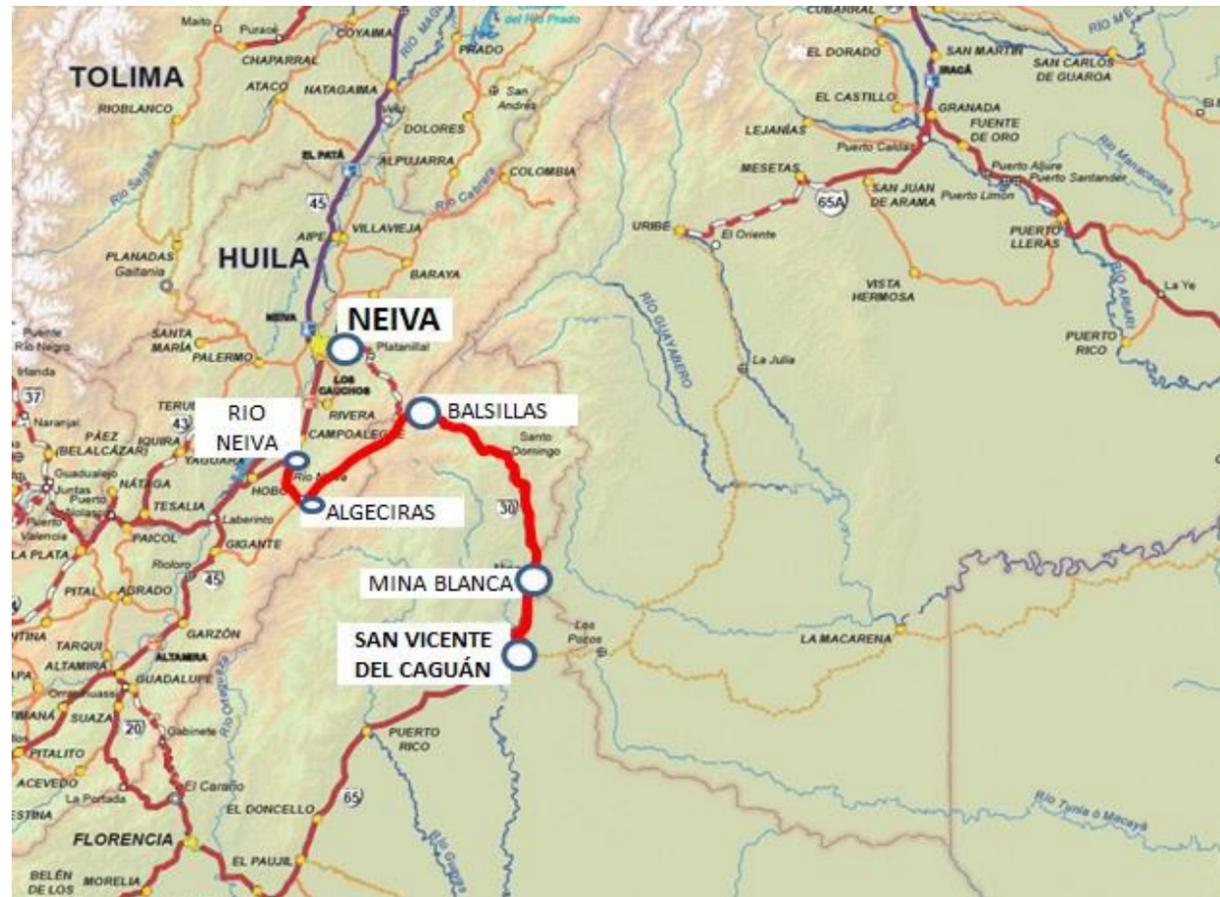

Longitud de Proyecto 219 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$6.864
Total Contrato Interventoría	\$1.557
Total Vigencias de la consultoría	\$6.864
Vigencia 2015 = \$1.040	
Vigencia 2016 = \$3.539	
Vigencia 2017 = \$2.285	
Total Inversión	\$8.421
Inversión estimada Huila	\$6.319
Inversión estimada Caquetá	\$2.102

* Cifras en millones a diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	03/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	17/11/2015
Acta de Inicio	01/12/2015
Plazo	01/01/2018
Fase del Proyecto (Avance)	78 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
NEIVA - BALSILLAS	39 KM	Estudios y Diseños
ALGECIRAS – BALSILLAS	39 KM	Estudios y Diseños
BALSILLAS – SANTO DOMINGO	58 KM	Estudios y Diseños
SANTO DOMINGO – MINA BLANCA	54 KM	Estudios y Diseños
MINA BLANCA – SAN VICENTE	29 KM	Estudios y Diseños

CONTRATO CONSULTORÍA 1593 DE 17/11/2015

CONSORCIO SIP		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
SAITEC S.A.	60	ESPAÑA - SUC. COLOMBIA
INCOPLAN S.A.	20	COLOMBIA
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS	20	COLOMBIA


INTERVENTORÍA 1646 DE 30/11/2015

GEICOL S.A.		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
GEICOL S.A.	100	COLOMBIA

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS CARTAGO - NÓVITA

VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ

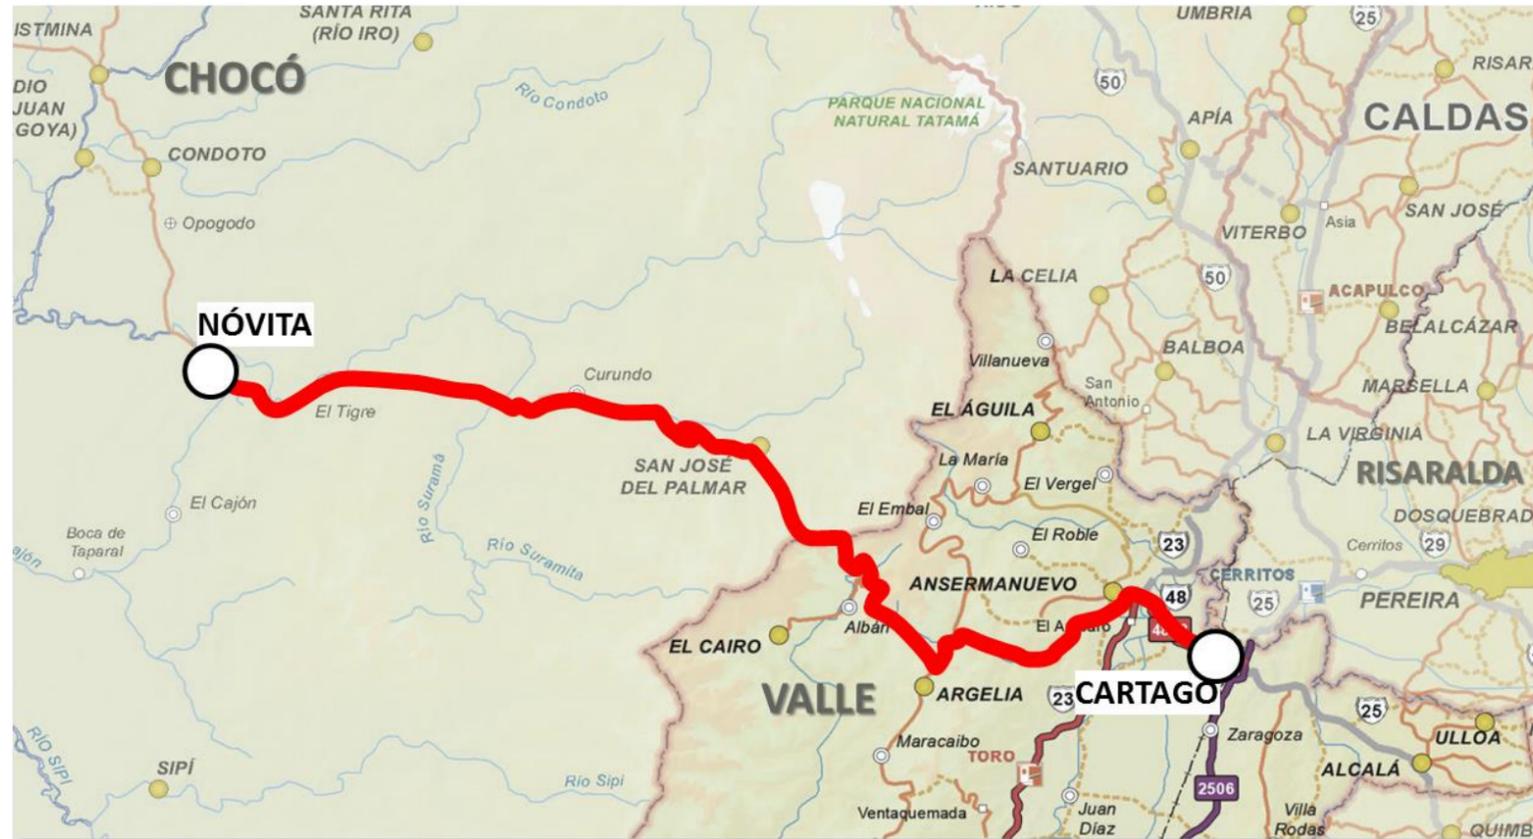

Longitud de Proyecto 108 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$5.082
Total Contrato Interventoría	\$1.146
Total Vigencias de la consultoría	
Vigencia 2015= \$820	
Vigencia 2016= \$2.700	\$5.082
Vigencia 2017= \$1.562	
Total Inversión	\$6.228
Inversión estimada Valle del Cauca	\$1.248
Inversión estimada Chocó	\$4.980

AVANCE

SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO, LO CUAL HA LLEVADO ATRASOS EN LA EJECUCIÓN. SE HA SOLICITADO ACOMPAÑAMIENTO DEL EJÉRCITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, SIN EMBARGO ESTE ACOMPAÑAMIENTO SOLO SE DA DE LUNES A VIERNES. LA SMA REALIZÓ REVISIÓN DEL DOCUMENTO DAA, DE LO CUAL SE HAN GENERADO OBSERVACIONES QUE HAN SIDO REMITIDAS AL CONSULTOR.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	12/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	01/12/2015
Acta de Inicio	30/12/2015
Plazo	30/12/2017
Fase del Proyecto (Avance)	39 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
CURUNDÓ - NÓVITA	54 KM	Estudios y Diseños
CRUCE EL CAIRO – CURUNDÓ	54 KM	Estudios y Diseños

CONTRATO CONSULTORÍA 1666 DE 01/12/2015

CONSORCIO SCLV

INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA VIALIDAD LTDA	40	COLOMBIA
SILVA & ASOCIADOS S.A.S	60	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1631 DE 25/11/2015

JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS

INTEGRANTES	%	ORIGEN
JAM S.A.S	100	COLOMBIA

* Cifras en millones a diciembre de 2015

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS URIBIA - NAZARETH

GUAJIRA



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	10/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	25/11/2015
Acta de Inicio	15/01/2016
Plazo	15/08/2017
Fase del Proyecto (Avance)	52 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
URIBIA - NAZAREH	157 KM	Estudios y Diseños

CONTRATO CONSULTORÍA 1630 DE 25/11/2015

CONSORCIO DESARROLLO VIAL GUAJIRA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
ECNOCONSULTAS S.A.S.	60	COLOMBIA
GINPROSA COLOMBIA S.A.S.	20	COLOMBIA
IVIICSA S.A.S.	20	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1649 DE 30/11/2015

INGENIERIA, CONSULORIA Y PLAEACION (INCOPLAN S.A.)		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
INGENIERIA, CONSULORIA Y PLAEACION (INCOPLAN S.A.)	100	COLOMBIA

Longitud de Proyecto 157 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$4.863
Total Contrato Interventoría	\$1.116
Total Vigencias de la consultoría	
Vigencia 2015= \$940	
Vigencia 2016= \$2.550	\$4.863
Vigencia 2017= \$1.374	
Total Inversión	\$5.979

* Cifras en millones a diciembre de 2015

AVANCE

SE ENCUENTRAN PENDIENTES LAS SOCIALIZACIONES CON 2 DE LAS 67 COMUNIDADES INDÍGENAS; EN DONDE NO HA SIDO POSIBLE LA ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD, SE AVANZA EN CARACTERIZACIÓN SOCIAL EN DONDE SE HAN IDENTIFICADO SECTORES DONDE SE DEBE HACER REPLANTEAMIENTO AL DISEÑO GEOMÉTRICO, YA QUE EL TRAZADO INICIAL CRUZA POR ALGUNAS UNIDADES AGRÍCOLAS FAMILIARES Y CEMENTERIOS. SE REALIZARÁ VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO EN CONJUNTO CON CORPOGUAJIRA, PENDIENTE POR EMITIR RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA LA VISITA.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRACCIÓN – LA FLORIDA

GUAJIRA



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	10/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	24/11/2015
Acta de Inicio	15/01/2016
Plazo	16/09/2017
Fase del Proyecto (Avance)	26 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
DISTRACCIÓN - TOMARRAZÓN	35 KM	Estudios y Diseños
TOMARRAZÓN – LA FLORIDA	13 KM	Estudios y Diseños

CONTRATO CONSULTORÍA 1620 DE 24/11/2015

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS PCH 098		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
CONSULTORÍA COLOMBIANA SA	60	COLOMBIA
HMV SUPERVISIÓN SAS	20	COLOMBIA
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES	20	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1594 DE 17/11/2015

DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS SAS		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS SAS	100	COLOMBIA

Longitud de Proyecto 48 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$4.800
Total Contrato Interventoría	\$1.199
Total Vigencias de la consultoría	
Vigencia 2015= \$700	
Vigencia 2016= \$2.779	\$4.800
Vigencia 2017= \$1.321	
Total Inversión	\$5.999

AVANCE


TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD EFECTUADA POR CORPOGUAJIRA, EL CONSULTOR ADELANTA ACTIVIDADES DE DAA EN EL SECTOR 2 (APROXIMADAMENTE 20 KMS) PARA LO CUAL SE REVISAN DIFERENTES ALTERNATIVAS DE TRAZADO TENIENDO EN CUENTA LAS RESTRICCIONES AMBIENTALES EXISTENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO. SE DEBERÁ ESPERAR PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE FASE II DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

* Cifras en millones a diciembre de 2015

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE ARIMENA – PUERTO CARREÑO

META-VICHADA

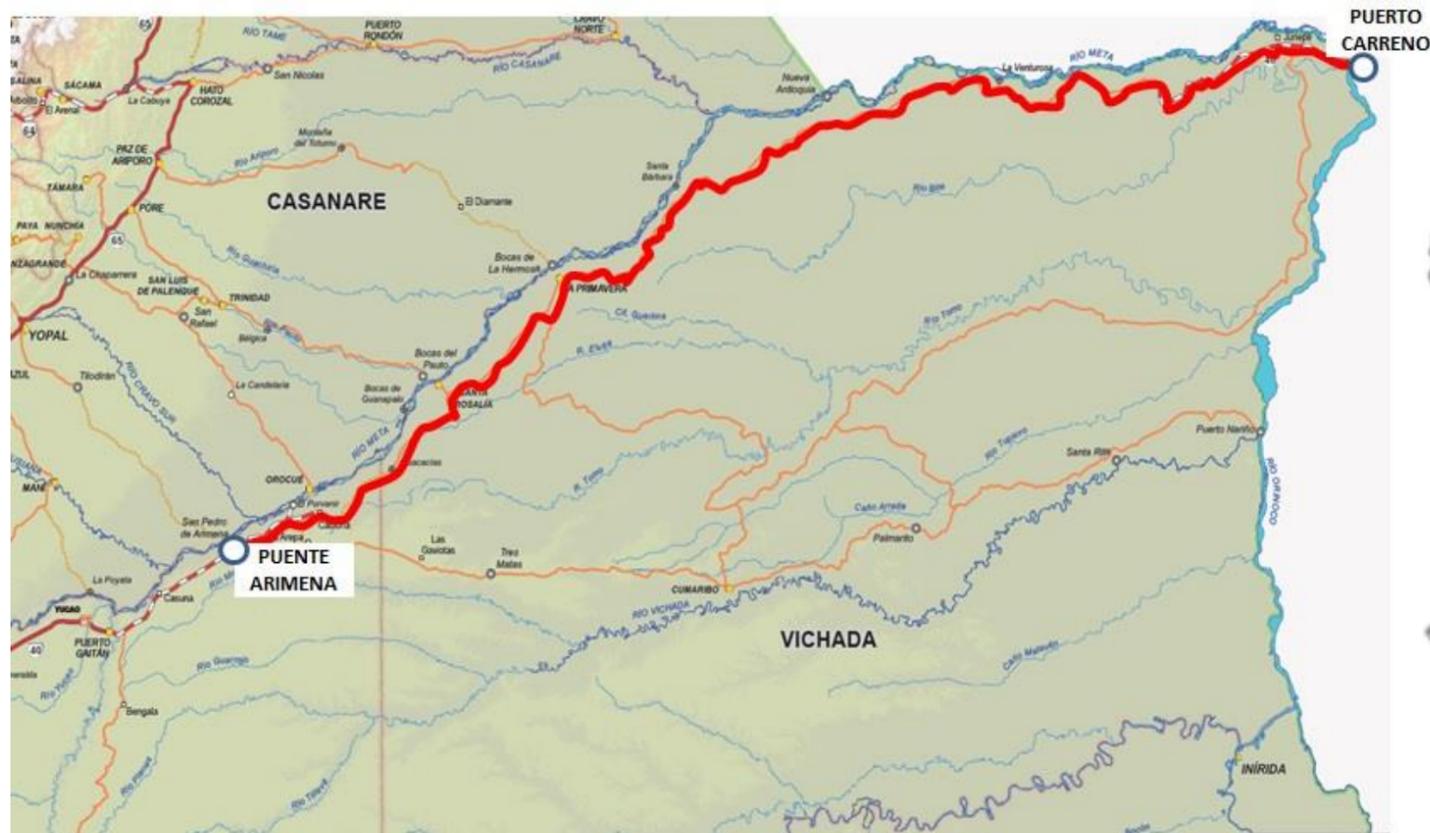

Longitud de Proyecto 650 Km

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Consultoría	\$22.399
Total Contrato Interventoría	\$5.596
Total Vigencias de la consultoría	
Vigencia 2015= \$6.750	
Vigencia 2016= \$304	\$22.399
Vigencia 2017= \$15.346	
Total Inversión	\$27.995
Inversión estimada Meta	\$5.747
Inversión estimada Vichada	\$22.247

AVANCE

EL CONSULTOR PRESENTÓ PROPUESTA ECONÓMICA AJUSTADA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA), PARA LOS TRAMOS 2, 3 Y 4; SE TIENE PREVISTO INICIO DE ESTE ALCANCE EL PRÓXIMO 1 DE JULIO – 17. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. SE AVAZA EN EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS 1 Y 5.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	20/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	22/12/2015
Acta de Inicio	01/02/2016
Plazo	31/12/2017
Fase del Proyecto (Avance)	22 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
PUENTE ARIMENA – PUERTO CARREÑO	650 KM	Estudios y Diseños

CONTRATO CONSULTORÍA 1734 DE 22/12/2015

CONSORCIO PUERTO CARREÑO

INTEGRANTES	%	ORIGEN
E.D.L. S.A.S.	60	COLOMBIA
DIS S.A.S.	20	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1797 DE 30/12/2015

CONSORCIO INTERVENTORÍA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA


INTEGRANTES	%	ORIGEN
GEOCONTROL S.A.	60	ESPAÑA - SUC. COLOMBIA
HMV CONSULTORÍA S.A.S.	20	COLOMBIA
CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.	20	COLOMBIA

* Cifras en millones a diciembre de 2015

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA

VALLE - TOLIMA - HUILA

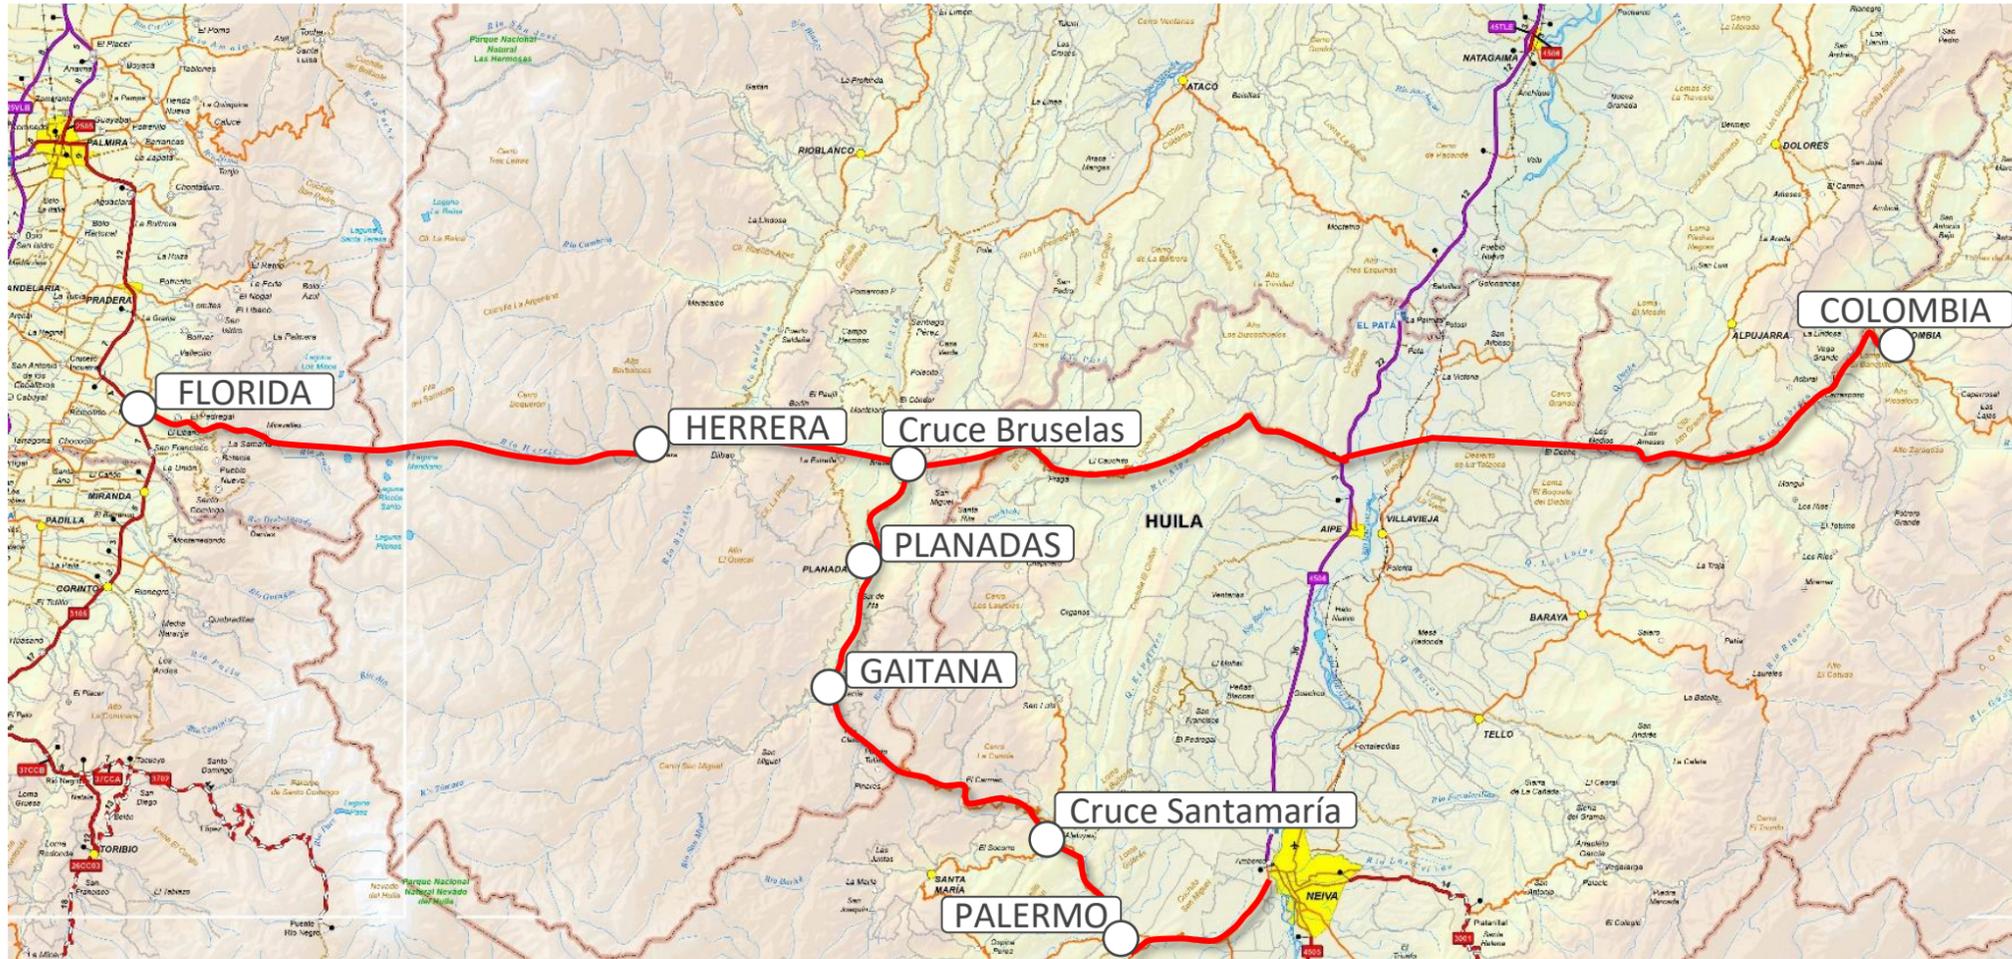

LONGITUD APROX. DEL CORREDOR ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN FASE I: 270 KM

LONGITUD APROX. DEL CORREDOR ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II: 184 KM

INVERSIONES (Millones)	
Total Contrato Consultoría	\$16.383
Total Contrato Interventoría	\$4.094
Total Vigencias de la consultoría	\$16.383
Vigencia 2015 = \$8.845	
Vigencia 2016 = \$3.686	
Vigencia 2017 = \$3.852	
Total Inversión	\$20.477

Longitud de Proyecto 270 Km

Inversión estimada Valle	\$3.891
Inversión estimada Tolima	\$9.829
Inversión estimada Huila	\$6.757

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	27/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	22/12/2015
Acta de Inicio	01/02/2016
Plazo	31/12/2017
Fase del Proyecto (Avance)	31 %

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
PALMIRA – LAS CRUCES - COLOMBIA	270 KM	Complementación Estudios Fase I
FLORIDA – CRUCE SANTA MARIA	184 KM	Estudios y Diseños Fase II

CONTRATO CONSULTORÍA 1735 DE 22/12/2015

ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL SAS

INTEGRANTES	%	ORIGEN
ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL SAS	100	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1781 DE 30/12/2015

CONSORCIO SMA – TEC 4

INTEGRANTES	%	ORIGEN
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA	60	COLOMBIA
TEC CUATRO SA	40	ESPAÑA - SUC. COLOMBIA

AVANCE

SE RADICÓ A LA ANLA EL DAA, CON EL ESTUDIO DE 4 ALTERNATIVAS, 2 QUE INCLUYEN TÚNELES FÉRREOS Y 2 TÚNELES CARRETEROS. LA CONSULTORÍA RECOMIENDÓ COMO MEJOR ALTERNATIVA PARA EL CRUCE DE LA CORDILLERA, EL TÚNEL FÉRREO DE APROXIMADAMENTE 40 KM. PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO DE LA ANLA PARA CONTINUAR LOS ESTUDIOS A FASE II DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

* Cifras en millones a diciembre de 2015



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TRANSFORMANDO A COLOMBIA
