



El Ministerio de Transporte en coordinación con sus Entidades adscritas, ha dispuesto de todos sus recursos técnicos y operativos para la atención de los eventos o situaciones que han afectado nuestra infraestructura vial nacional a cargo de INVIAS y de la ANI.

Reporte Emergencias

1. Vigencia 2022 - 2023

En lo que va corrido del 2023 con corte al 19 de mayo de 2023, se han registrado **365** emergencias viales, **256** en la red no concesionada y **109** eventos en las vías nacionales concesionadas.

Durante el periodo de este Gobierno se han registrado **649 emergencias** en las carreteras a cargo del INVIAS. Actualmente tenemos **5 corredores** con cierre total y **102 cierres parciales** en la red a cargo de INVIAS; **1 cierre total** y **0 cierres parciales** en las vías concesionadas administradas por la ANI.

2. Reportes durante el 19 de mayo de 2023

2.1. INVIAS

Al momento del reporte se presentan cierres totales por emergencias (derrumbes, deslizamientos y/o pérdidas de banca) de la red vial primaria nacional no concesionada.

DT: Santander

Departamento: Santander

Tipo de cierre: Cierre total

Localización:

Código Tramo: 6403

Nombre Ruta: Transversal Guane - San Gil - Mogotes - La Rosita

Sector: Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga

PR inicial: 72+0510

PR final: 72+0600

Tipo de evento: Inundación



Descripción del Evento: Cierre total de la vía por inundación de la Quebrada Tierra Azul, inundando la vía en aproximadamente una longitud de 100 m.

Estado: Cierre total en atención.

Rutas Alternas: Ninguna.

Plan de Acción:

- ✓ Atención con Cooperativa de Mantenimiento Rutinario.
- ✓ En el sitio se encuentra la pajarita de la alcaldía de Onzaga realizando labores de remoción y adecuación de la vía.

Fecha Estimada de Apertura:

- ✓ En evaluación por parte del personal técnico.

Al momento del reporte NO se presentan cierres parciales por emergencias (derrumbes, deslizamientos y/o pérdidas de banca) de la red vial primaria nacional no concesionada.



2.2. ANI

Al momento del reporte NO se presentan cierres totales por emergencias (derrumbes, deslizamientos y/o pérdidas de banca) de la red vial primaria nacional concesionada.

Al momento del reporte NO se presentan cierres parciales por emergencias (derrumbes, deslizamientos y/o pérdidas de banca) de la red vial primaria nacional concesionada.

2.3. INFORMACIÓN AEROPORTUARIA

Con el fin de conocer la información relacionada al estado del clima de los aeropuertos, se puede consultar dicha información a través del visor meteorológico de la Aeronáutica Civil:

Enlace: http://meteorologia.aerocivil.gov.co/obs_map

2.4. INFORMACIÓN PORTUARIA

Con el fin de conocer la información relacionada al estado del clima de los PUERTOS, se puede consultar dicha información a través del Geoportal CLIMARES del INVEMAR donde se puede consultar y visualizar la información cartográfica de estudios realizados en materia de cambio climático para las zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano:

Enlace:

https://experience.arcgis.com/experience/22872ced6b2c4f2d882d1982a52a9c4e/pag_e/SECCIÓN-GENERAL/

Adicionalmente, a través de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteorología Marina (REDMPOMM) de la Dirección General Marítima (DIMAR), los Centros de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y del Pacífico elaboran el estado del tiempo y del mar, y alertas tempranas por ocurrencia de eventos extremos de origen marino para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes. Dicha información se puede consultar a través del siguiente enlace:

Enlace:

<https://dimar.maps.arcgis.com/apps/dashboards/48d2c76148af428789abae6b3a8789de>



Emergencias Red Vial No Concesionada 2023 CORTE 19 de Mayo 2023

EMERGENCIAS

4

No. Emergencias generadas día del reporte [19-Mayo-2023]

- DT BOY. Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche. PR 75+0850. Vía 6006. Deslizamiento. Cierre total (Habilitado).
- DT SAN. Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga. PR 61+0800. Vía 6403. Inundación. Cierre total (En atención).
- DT SAN. Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga. PR 59+0820. Vía 6403. Inundación. Cierre total (En atención).
- DT SAN. Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga. PR 72+0510. Vía 6403. Inundación. Cierre total (En atención).

5

No. Cierres Totales por Resolución

- DT Cauca. Mojarras – Popayán. Res. 00064.
- DT Cauca. Puente Río Negro - El Palo, Ruta Nacional. Res. 04731.
- DT Cundinamarca. Dindal – La Aguada. Res. 04582.
- DT Cundinamarca. Zipaquirá – Ubaté. Res. 00173.
- DT Norte de Santander. La Ondina – Convención. Res. 03482.

102

No. Cierres Parciales activos a la fecha


256

No. Total Emergencias registradas 2023

- 134 Cierres totales 2023
- 122 Cierres parciales 2023



EMERGENCIAS REPORTADAS POR TERRITORIAL - 2023

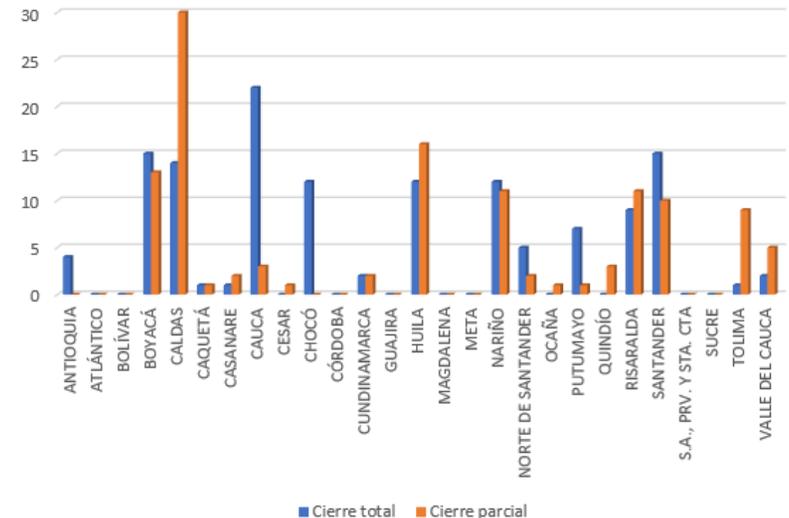

■ Cierre total ■ Cierre parcial

Cierres parciales en:

- Antioquia
- Boyacá
- Caldas
- Córdoba
- Huila
- Meta
- Nariño
- N. de Santander
- Ocaña
- Risaralda
- Santander
- Tolima
- V. del Cauca

Para consultar el estado de la red vial y programar tu viaje puedes consultar el mapa viajero seguro:

<https://hermes.invias.gov.co/viajerosseguro/>





Red Vial Concesionada

Emergencias Red Vial Concesionada CORTE 19 DE MAYO 2023 (4:30 p.m.)



EMERGENCIAS



CIERRE PERMANENTE

PR 25+0540 al PR 25+0810 por colapso en el corredor Calarcá – La Paila que conecta a los departamentos del Quindío con el Valle del Cauca. Las causas del colapso del puente El Alambrado se encuentran en estudio, a la fecha el evento no se encuentra asociado a la Ola Invernal.



Resolución 4731 del 6 de diciembre de 2022

Departamento: Cauca

Corredor vial: Puente Río Negro - El Palo

Código: 3702

Sitio: PR125+0000

Descripción del evento:

Considerando que las fuertes lluvias que se presentaron en la región causaron la creciente y el desbordamiento del Río Negro, lo que ocasionó el colapso de tres muros en gaviones, la pérdida total de la banca y la desestabilización del terreno que sirve como soporte a la base del puente metálico.

Plan de acción:

- ✓ Se realiza visita técnica con el especialista en estructuras, para una inspección y evaluación del estado actual de puente metálico sobre el río Negro y reunión con las comunidades aledañas para informar medidas provisionales.
- ✓ Se inicia la construcción de un muro en gaviones para contener el terreno donde está apoyado el puente, margen izquierda agua abajo y así prevenir que colapse.

Ruta alterna:



Fecha estimada de apertura:

Primer semestre 2023. Depende del trámite de los CDPs y de la ejecución de las obras.





Resolución 4582 del 30 de noviembre de 2022

Departamento: Cundinamarca

Corredor vial: Dindal – Caparrapí – La Aguada

Código: 50CN01

Sitio: PR0+0000 al PR0+0070

Descripción del evento:

- ✓ Cierre total de la vía para realizar reparación por daño en estructura del puente, cedió la superficie de rodadura metálica de este puente por la ruptura de las vigas IP que sostienen las láminas alfajor.

Plan de acción:

- ✓ Contrato de Obra: 1680-2022.
- ✓ Contratista desarrollando actividades relacionadas con los estudios y diseños.
- ✓ Se resalta que la fecha máxima para entrega de los diseños con sus presupuestos es el 15 de febrero de 2023, para definir actividades de mantenimiento y refuerzo del puente.
- ✓ Se realizó limpieza del puente para inspección técnica.

Fecha de apertura:

- ✓ 31 de mayo de 2023.

Rutas alternas:

- ✓ La ruta alterna de acceso (antiguo trazado Guaduas – Caparrapí), que se toma desde el corredor de la ruta del sol 5008B antes del Puente Rio Negro en el PR34+530 y después de la quebrada San Antonio sobre esta misma ruta.
- ✓ Útica - Los Cámbulos – Caparrapí.
- ✓ Zipaquirá – Pacho - La Palma - La Aguada - Caparrapí.





Resolución 3482 del 19 de septiembre de 2022

Departamento: Norte de Santander

Corredor vial: La Ondina – Convención

Código: 70NS01

Sitio: PR32+0600 al PR32+0650

Descripción del evento:

- ✓ Cierre total de la vía para realizar descargue de talud y minimizar el riesgo de colapso.

Plan de acción:

- ✓ Se realiza muro en tierra armada, el cual se viene adelantando excavación y retiro de material granular.
- ✓ Conformación y compactación de material proveniente de la fuente de material La Ceiba con combinación de fresado.
- ✓ Llenado de costales para la cara visible del muro, se realiza filtro francés con geotextil y tubería perforada de 6, se realiza ensayos de densidad en campo.

Fecha de apertura:

- ✓ 30 de julio de 2023



Para consultar el estado de la red vial y programar tu viaje puedes consultar el mapa viajero seguro:

<https://hermes.invias.gov.co/viajerosseguro/>



Resolución 00881 del 12 de marzo de 2023

Departamento: Santander

Corredor vial: Málaga – Los Curos

Código: 55ST02

Sitio: PR108+0000 al PR113+0000

Descripción del evento:

Cierre total de la vía por pérdida total de la banca por lluvias intensas y prolongadas, vereda Cartagena del municipio de Piedecuesta.

Plan de acción:

- ✓ Visita de diagnóstico preliminar por parte de especialistas hidráulico y geotécnico de la SGR de INVIAS, contratista de obra e interventoría y autoridades locales.
- ✓ Obras sobre el talud superior para establecer una variante paralela a un carril.
- ✓ Estudios y diseños para la recuperación de la calzada y obras de mitigación.
- ✓ Monitoreo de talud.
- ✓ Gestiones con Ejército y UNGRD para préstamo de puente metálico modular semipermanente.
- ✓ Adecuación de vía terciaria Cartagena, actualmente transitan vehículos tipo jeep.

Fecha estimada de apertura:

- ✓ Paso habilitado.



Rutas Alternas y Restricciones:

- ✓ Las relacionadas en la Resolución 00881 de 2023.



Para consultar el estado de la red vial y programar tu viaje puedes consultar el mapa viajero seguro:

<https://hermes.invias.gov.co/viajerosseguro/>



Resolución 04737 del 6 de diciembre de 2022

Departamento: Risaralda

Corredor vial: Santa Cecilia - Asia

Código: 5003

Sitio: PR1+0000 al PR30+0500

Descripción del evento:

- ✓ Proceso de remoción en masa de gran magnitud de talud superior con posible pérdida total de banca.

Fecha de apertura:

- ✓ Se habilita tránsito en el día con cierre total desde las 6pm hasta las 6am entre el PR 1+000 y PR 30+500, entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, por seguridad.

Plan de acción:

- ✓ Capacidad operativa:

Maquinaria, equipos y vehículos disponibles:

Se desplazó maquinaria, equipos (25) y personal (50) del Contrato de Obra No. 1757 de 2020 (INVIAS) y se encuentran disponibles en el sitio de la emergencia.

- Se desplazó personal de INVIAS (4) como funcionarios y personal de los contratos de administradores viales (1) y Microempresarios (10)

-Policía Nacional, DCC, Bomberos, CMGRD, USARCOL22 de Pereira, CDGRD hacen presencia en la zona.

- Seguimiento de la emergencia desde la UNGRD con entidades del orden nacional y apoyo aéreo de la FAC, policía y ejército.

Ruta alterna:





Resolución 00173 del 26 de enero de 2023

Departamento: Cundinamarca

Corredor vial: Zipaquirá – Ubaté

Código: 45A04

Sitio: PR30+0560 al PR33+0000

Descripción del evento:

Cierre total de la vía por caída de material. Evento detonado por la erosión natural generando por las lluvias.

Plan de acción:

- ✓ Monitoreo constante del cerro.
- ✓ Se realizó mantenimiento, mejoramiento y señalización de la vial alterna.
- ✓ Se iniciaron gestiones para el trámite de permiso de ingreso al predio y consulta a la CAR, a fin de iniciar el retiro del cerro por parte del contrato de obra No. 989-2021.

Fecha estimada de apertura:

- ✓ En evaluación por parte del personal técnico.

Ruta alterna: Paso por la segunda calzada construida de la Variante Portachuelo Casablanca Ruta 45ACND desde el PR7+0000 al PR4+0350.





Resolución 01383 del 24 de abril de 2023

Departamento: Antioquia

Corredor vial: Peaje Cocorná – Cruce Ruta 45
(Caño Alegre)

Código: 6005

Sitio: PR 35+0000 al PR 61+0600

Descripción del evento:

Cierre total de la vía (Res. 00860-2023) por desprendimiento y caída de material rocoso por aparente inestabilidad de talud.

Plan de acción:

- ✓ El Consorcio Megavías Antioquia 2021 realizará la instalación de vallas, señales y controladores necesarios para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y de los trabajadores de la obra, durante la realización de los trabajos.
- ✓ El Consorcio Megavías Antioquia 2021, adelantará todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en el trayecto objeto del permiso autorizado.

Fecha estimada de apertura:

Cierre de la vía con las siguientes condiciones:

TIPO DE MEDIDA	DÍAS	HORARIOS
Cierre parcial	De lunes a domingo	07:00 horas a 15:00 horas
		18:00 horas y las 07:00 horas del día siguiente, con paso controlado mientras el estado del tiempo y las condiciones de seguridad del talud lo permitan
Cierre Total	De lunes a domingo	15:00 horas a 18:00 horas.

- ✓ En caso de presentarse actividad en el talud o si hay condiciones climáticas adversas, se procederá a realizar el cierre preventivo de la vía.

Rutas alternas:

- ✓ Medellín - Cisneros - Puerto Berrio - Puerto Boyacá - Caño Alegre.
- ✓ Medellín – Manizales- Bogotá.



Resolución 01217 del 13 de abril de 2023

Departamento: Santander

Corredor vial: La Palmera – Presidente

Código: 5504

Sitio: PR 42+0980 al PR 43+0000

Descripción del evento:

Cierre total de la vía por avalancha que arrastra el puente totalmente.


Plan de acción:

- ✓ El consorcio Isla Santander instalará vallas, señales y controladores para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y de los trabajadores de la obra, durante la realización de los trabajos.
- ✓ Se habilita un paso provisional.

Fecha estimada de apertura:

- ✓ Habilitado paso provisional para vehículos pequeños de 6:00 AM a 6:00 PM.
- ✓ Cierre total en el horario de 6:00 PM a 6:00 AM.

Rutas alternas:

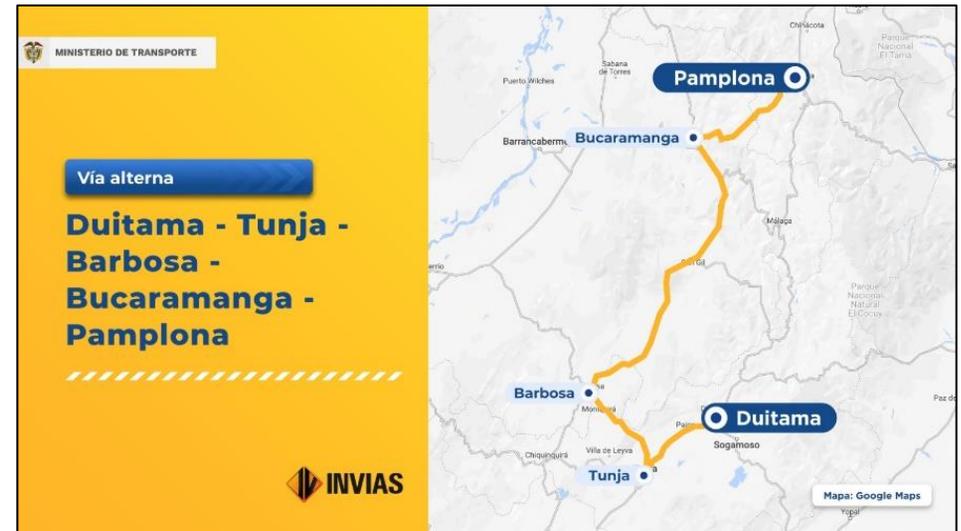



Resolución 01275 del 18 de abril de 2023

Departamentos: Quindío y Valle del Cauca

Corredor vial: La Paila - Club Campestre

Código: 4002

Sitio: PR 25+0540 al PR 25+0810

Descripción del evento:

Cierre total entre el PR 25+0540 al PR 25+0810 por colapso del puente sobre la Quebrada la Vieja en el corredor Calarcá – La Paila que conecta a los departamentos del Quindío con el Valle del Cauca.

Plan de acción:

Se ha realizado inspección al puente por parte del concesionario Autopistas del Café en conjunto con la interventoría, la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para encontrar las posibles causas que llevaron al colapso de la estructura.

Fecha estimada de apertura:

Se espera dar paso para vehículos livianos en un tiempo de 4 meses mediante la ubicación de un puente metálico provisional.



Para consultar el estado de la red vial y programar tu viaje puedes consultar el mapa viajero seguro:

<https://hermes.invias.gov.co/viajerosseguro/>
